

Raporti i vitit 2018

Prill, 01 - 30.04.2018

1. Drejtoria e Investimeve Kapitale dhe Menaxhimit të Kontratave

Drejtoria e Investimeve Kapitale dhe Menaxhim të Kontratave, gjatë muajit prill 2018 ka kryer këto aktivitete: kërkesat për hartimin e detyrave projektuese dhe identifikimin e nevojave, shqyrtimi i kërkesave të banorëve të bashkësive lokale dhe inkorporimi i tyre në planet e Komunës, njoftimi me kohë i kompanive publike dhe subjekteve relevante me qëllim të koordinimit të punëve, incizimi i gjendjes ekzistuese të infrastrukturës në qytetin e Prishtinës, si dhe kompletimi i dokumentacionit teknik për procedimin e tyre në organet kompetente, mbikëqyrja e realizimit të projekteve konform marrëveshjes etj.

1.1. Shqyrtimi i kërkesave

Gjatë muajit prill 2018, drejtoria ka proceduar 186 kërkesa të ndryshme të bashkësive lokale dhe banorëve: për ndërtimin e rrugëve, trotuareve dhe kanalizimeve, kërkesa për rregullimin e rrugëve dhe kanalizimeve, kërkesa nga kompanitë publike-leje për gropim dhe intervenime për sanimin e defekteve të ndryshme, kërkesa nga kompanitë për formime të komisioneve për kontrollimin e punëve, kërkesa të natyrave të ndryshme rreth definimit të zgjidhjes në terren etj. Nga numri i përgjithshëm prej 186 kërkesave të pranuar, 63 janë zgjidhur.

1.2. Dërgimi i kërkesave për hartimin e detyrave projektuese dhe identifikimi i nevojave

Duke marrë për bazë Ligjin mbi planifikimin hapësinorë, Ligjin mbi ndërtimin e objekteve investive, si dhe Ligjin për projektim, e në veçanti planet rregulluese, janë dërguar kërkesat për hartimin e detyrave projektuese për këto rrugë në zonat urbane dhe rurale.



1.3. Raportimi i menaxherëve te projekteve infrastrukturore

Drejtoria	Drejtoria e Investimeve Kapitale dhe Menaxhimit të Kontratave
Spektori	Menaxhimi i kontratave (Ndërtimi i ulët)
Drejtori	Gëzim Mehmeti
Raportoi	Dukagjin Buqaj, u.d. i shefit të Sektorit
Kontrollloi – Përpunoi	Muhamed Emra - zyrtar i lartë për ndërtim urban
Periudha raportuese	Prill 2018, 01- 30.04.2018
Menaxhëret e projekteve	Ibrahim Gervalla Muhamed Emra Afërdita Hasimi Zyhrie Pllana Krenar Xhaferi Fevzi Jetullahu Irfete Zejneli Fatmir Uka Halil Fejziu Imer Mavriqi Suzana Pllana Refik Sadiku Qazim Bajrami
Organi mbikqyrës	Azem Buzuku Aferdita Sopi Behxhet Gashi Ramadan Nebiu Hazir Krasniqi Amire Krasniqi

PRISHTINA		RAPORTI MBIKËQYRËS				SHIFRA 01	
Projekti :	Ndërtimi i disa rrugëve me kubëza betoni në Hajvali	Vlera e projektit: 359.351,97 €					
Investuesi :	Komuna e Prishtinës	Plani dinamik 90 ditë					
Operatori :	NTP "REXHA COM"	Nr.616 17 060 521 dt. 08,09,2017					
Menaxheri i projektit :	Muhamed Emra, idn.	Projekti i vitit 2017					
Organi mbikëqyrës:	Suzana Pllana, idh, Hazir Krasniqi, tek.gjeod.						
Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara							
Vëllimi fizik	Punët e realizuara	<ul style="list-style-type: none"> Vendosja e kubzave të betonit në rrugën "Beteja e Kikës" Vendosja e kubzave të betonit në rrugën "Mahir Kamberi" Vendosja e kubzave të betonit në rrugën "Kuka" Vendosja e skajoreve 20/24 cm në rrugën "Gjon Loku" Vendosja e kubzave në rrugën "Hysen Lepnica" Ndërtimi i murit mbrojtës në rrugën "Hysen Lepnica" 					
	Punët në realizim	<ul style="list-style-type: none"> Vendosja e skajoreve 20/24 cm në rrugën "Gostivari" Shenjzimi i rrugës "Minatori" 					
Vëllimi financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni (I)	Situacioni (II)	Situacioni (III)	Situacioni (IV)	Situacioni (V)	Situacioni (VI)
		50.000.0	50.000.0	50.000.0	50.000.0		
Vonesat Shkalla e cilësisë		--			Mesatar		
Rekomandime, masat për t'u ndërmarrë		<p>Punimet janë duke u zhvilluar sipas planit dinamik, mirëpo do të kemi vonesa të ekzekutimit të punimeve për shkak se së pari do të presim realizmin e kontratës "Ndërtimi i kolektorit në Hajvali, lagjja "Vitali" dhe "Ndërtimi i rrjeteve të kanalizimeve fekale në lagjen "Ulpiane e Re" në Hajvali nga operatori tjetër, pastaj të vazhdojmë ekzekutimin e rrugëve të parapara me kontratë.</p> <p>Kemi ngecje të punimeve nga banorët e fshatit Hajvali, për shkakë se një pjesë e rrugicave nëpër lagje nuk janë përfshirë në këtë projekt dhe domosdoshmërisht këmbngulin që të ndërtohen edhe rrugicat e tyre.</p>					
		Punimet janë duke u zhvilluar në bazë të planit dinamik					























RAPORTI MBIKËQYRËS		SHIFRA 02					
Projekti :	Ndertimi I Bulevardit mbi Kurriz	Vlera e projektit: 977,725.51 €.					
Investuesi :	Komuna e Prishtinës	Plani dinamik : 180 ditë					
Operatori :	“Rexha” SHPK dhe NTP “Fidani – L” SHPK Prishtinë	616 15 025 511 12.06.2015					
Menaxheri i projektit :	Muhamed Emra, idn	Projekti i vitit 2015					
Organi mbikëqyrës :	Fevzi Jetullahu, Amire Krasniqi, Behxhet Gashi						
Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara							
Vëllimi fizik	Punët e realizuara	Tash për tash operatori nuk është duke i zhvilluar punimet.					
	Punët në realizim						
Vëllimi financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Sit.I	Sit.II	Sit.III	Sit.IV	Sit.V	Sit.VI
		50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
		Sit.VII	Sit.VIII	Sit.IX	Sit.X	Sit.XI	Sit.XII
		50,000.00 €	50,000.00 €	50,000.00 €	50,000.00 €	50,000.00 €	50,000.00 €
	Aneks kontrata	Sit.XIII	Sit.XIV	Sit.XV	Sit.XVI	Sit.XVII	Sit.XVIII
		50,000.00 €	50,000.00 €	50,000.00 €	50,000.00 €	50,000.00 €	
	Furnizimi me material	50,000.00 €	50,000.00 €				
	Rekomandime, masat për t'u ndërmarrë	Më 18.04.2018, përmes njoftimit – shkresës, kemi kërkuar propozimin e ndërprerjes së kontrates ” Ndërtimi i bulevardit në lagjen “Dardania” nga Zyra e prokurimit, si autoritet kontraktues, duke e pasur parasysh që operatori nuk shpreh gatishmërinë për rifillimin e punimeve si arsye të punëve shtesë të paparaparë që ende nuk janë proceduar për pagesë.					
	Vlerësimi i progresit në projekt	Punimet për momentin nuk janë duke u realizuar. Jemi në pritje nga komisioni, për vlerësimin e punëve të paparapare me projekt.					

RAPORTI MBIKËQYRËS		SHIFRA 03					
Projekti :	Ndërtimi i rrugës në fshatin Barilevë	Vlera e projektit: 324.457,38 €					
Investuesi :	Komuna e Prishtinës	Plani dinamik 90 Ditë					
Operatori :	NNP "SOPI"	Nr.616 17 060 521 dt.08,09,2017					
Menaxheri i projektit :	Muhamed Emra, idn	Projekti i vitit: 2017					
Organi mbikqyrës :	Fevzi Jetullahu, idh., Azem Buzuku, tek. i ndërt.						
Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara							
Vëllimi fizik	Punët e realizuara	Gërmimi dhe zgjerimi i trupit të rrugës; Mbushja e trupit të rrugës me tampon 0-63 mm; Vendosja e skajoreve me dimensione 20/24cm; Kallupimi i lëshesës – zgjerimi i lëshesës betonarme pranë urës ekzistuese në kanalën "Iber - Lepenc";					
	Punët në realizim	Betonimi i krahëve të urës betonarme – zgjerimit të urës Përgatitja e soletës betonarme					
Vëllimi financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni (I)	Situacioni (II)	Situacioni (III)	Situacioni (IV)	Situacioni (V)	Situacioni (VI)
		50.000.0	50.000.0	50.000.0			
Vonesat Shkalla e cilësisë	--			Mesatare			
Rekomandime, masat për t'u ndërmarrë	Kemi ngecje të punimeve nga banorët e fshatit Barilevë, Lagjja e Vërbovcëve, për shkakë që projekti është realizuar në vitet 2010, kemi kërkesa nga banorët e fshatit për vazhdimin e rrjeteve fekale, ku janë bërë ndërtime të reja të objekteve individuale dhe duhet të kyqen në rrjetin e saponërtuar.						
Vlerësimi i progresit në projekt	Punimet janë duke u zhvilluar në bazë të planit dinamik						







PRISHTINA		RAPORTI MBIKËQYRËS					SHIFRA 04
Projekti :	Ndërtimi i disa rrugëve dhe i kanalizimit fekal dhe atmosferik në krahun e djathtë dhe të majtë të rrugës “Bajram Bahtiri” në Prishtinë	Vlera e projektit: 286.655,32 €					
Investuesi :	Komuna e Prishtinës	Plani dinamik 150 ditë.					
Operatori :	SHPK “Gerlica Company”	Nr.616 17 087 521 dt.02,10,2017					
Menaxheri i projektit :	Muhamed Emra, idn	Projekti i vitit : 2017					
Organi mbikëqyrës:	Zyhrije Pllana, ida., Azem Buzuku, tek. i ndërt.						
Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara							
Vëllimi fizik	Punët e realizuara	- Vendosija e skajoreve betonarme ne krahun e rruges nr.20					
	Punët në realizim	- Vendosija e kubezave te betonit					
Vëllimi financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni (I)	Situacioni (II)	Situacioni (III)	Situacioni (IV)	Situacioni (V)	Situacioni (VI)
		50.000.0	50.000.0				
Vonesat Shkalla e cilësisë		--			Mesatare		
Rekomandime, masat për t'u ndërmarrë							
Vlerësimi i progresit në projekt		Punimet jane duke u zhvilluar në bazë të planit dinamik					

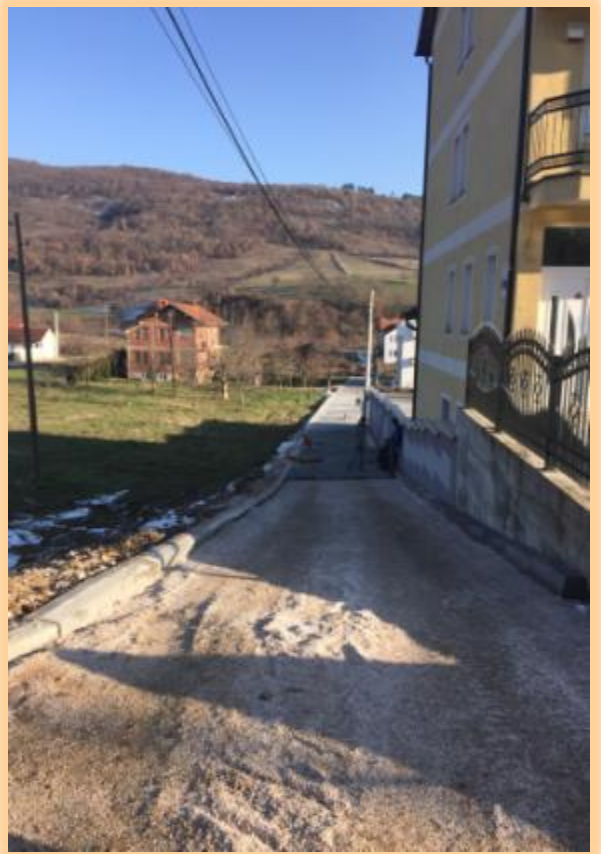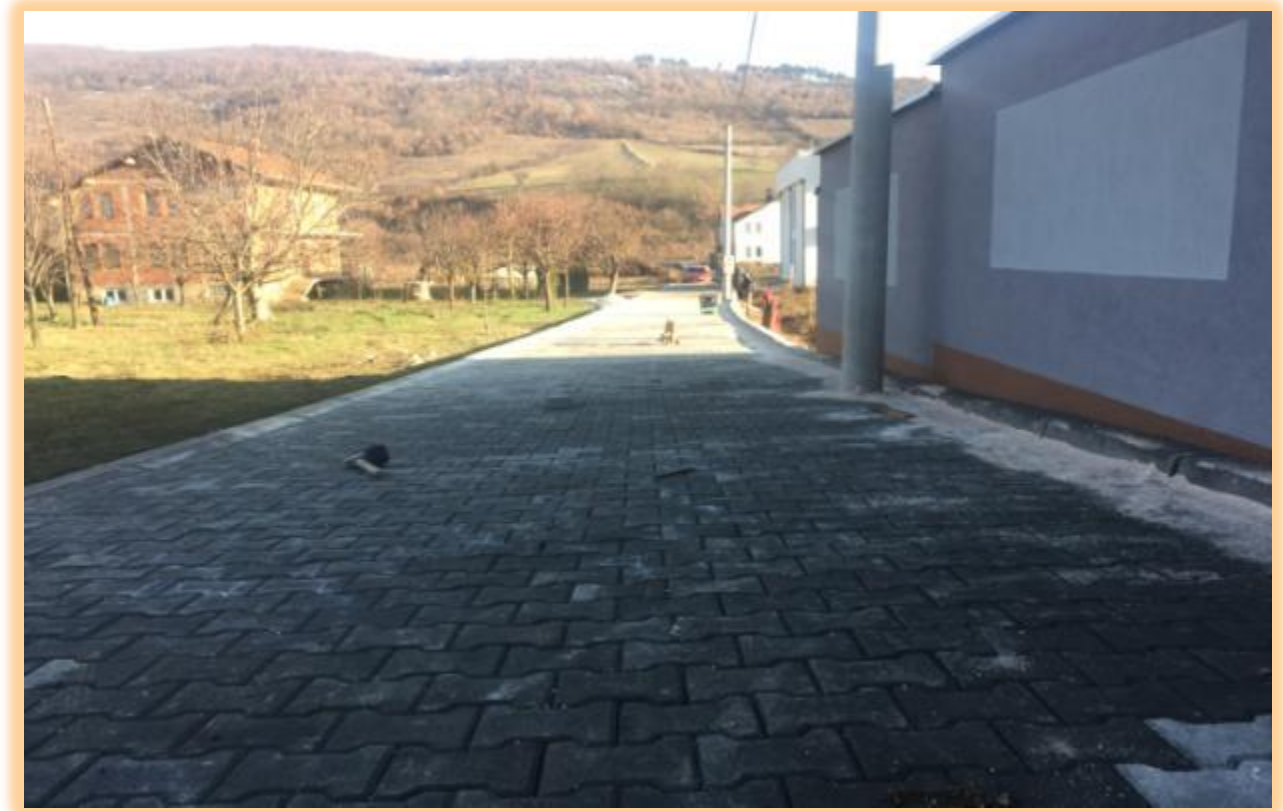

 RAPORTI MBIKËQYRËS		SHIFRA 05					
Projekti :	<i>“ Rindërtimi, sanimi dhe zgjerimi i disa rrugëve sekondare në territorin e Komunës së Prishtinës ”</i>					Vlera e projektit: 247,853.52 €	
Investuesi :	Komuna e Prishtinës					Plani dinamik 12 muaj	
Operatori :	NTP ”Bashkimi” dhe NPSH “Bageri”					Nr.616 17 132 521 dt.11,01,2018	
Menaxheri i projektit :	Muhamed Emra, idn					Projekti i vitit : 2018	
Organi mbikqyrës :	Halil Fejziu, idn., Afërdita Sopi, tek. gjeod.						
Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara							
Vëllimi fizik	Punët e realizuara	Më 19.03.2018, përmes e-mail adreses është obliguar operatori që të fillojë ekzekutimin e punimeve sipas paramesës, gjegjesisht kontratës.					
	Punët në realizim						
Vëllimi financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni (I)	Situacioni (II)	Situacioni (III)	Situacioni (IV)	Situacioni (V)	Situacioni (VI)
Vonesat Shkalla e cilësisë		--			Mesatar		
Rekomandime, masat për t’u ndërmarrë		Më 24.04.2018, përmes njoftimit – shkresës, është obliguar operatori, për herë të fundit, që të fillojë me ekzekutimin e punimeve, në të kundërtën, do të iniciojmë procedurat e shkëputjes së kontratës në Zyrën e prokurimit, si autoritet kontraktues.					
Vlerësimi i progresit në projekt							


 RAPORTI MBIKËQYRËS		SHIFRA 06					
Projekti :	<i>Sanimi dhe asfaltimi i rrugës “Fehmi Lladrovci”</i>	Vlera e projektit: 59,480.30 €					
Investuesi :	Komuna e Prishtinës	Plani dinamik 30 ditë					
Operatori :	”Papenburg” & “Adriani Company” SHPK	Nr.616 17 141 521 dt.16,01,2018					
Menaxheri i projektit :	Muhamed Emra idn ;	Projekti i vitit : 2018					
Organi mbikëqyrës :	Hazir Krasniqi, tek.gjeod., Azem Buzuku, tek. i ndërt.						
Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara							
Vëllimi fizik	Punët e realizuara	<ul style="list-style-type: none"> - Vendosja e shenjave të përkohshme; - Incizimi i gjendjes ekzistuese; - Demolimi i kapakëve dhe ujëmbledhësve; - Gërmimi i dheut të kategorisë II-IV; - Prerja e asfaltit në trashësin deri 15 cm; - Furnizimi, transporti dhe ngjeshja e tamponit 0-63 mmm d=25cm; - Furnizimi dhe punimi i bituzhavorit BZH 022 mm d=6 cm; <p>Furnizimi, transporti dhe shtresimi i asfaltbetonit Bit 60 AB-11 d=4 cm</p>					
	Punët në realizim	Punimet kanë përfunduar sipas kontratës, gjegjësisht paramasës, pas plotësimit të dokumentacionit teknik, brenda javës do të bëhet mbyllja, gjegjësishtë përfundimi i kontratës.					
Vëllimi financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni (I)	Situacioni (II)	Situacioni (III)	Situacioni (IV)	Situacioni (V)	Situacioni (VI)
Vonesat Shkalla e cilësisë	Nuk kemi pasure vonesa			Mesatar			
Rekomandime, masat për t'u ndërmarrë	Për t'iu shmangur problemeve eventuale me banorë në qarkullim të htingjeve të rrugës “Fehmi Lladrovci”, punimet janë ekzekutuar gjatë orëve të mbrëmjes.						
Vlerësimi i progresit në projekt	Punimet janë zhvilluar në bazë të planit dinamik të paraparë, 30 ditë pune.						

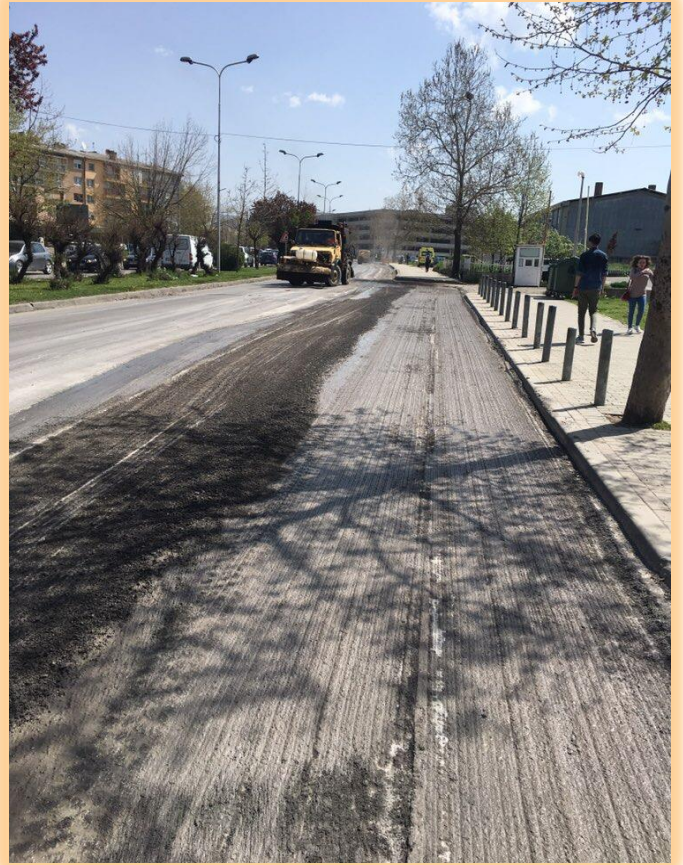







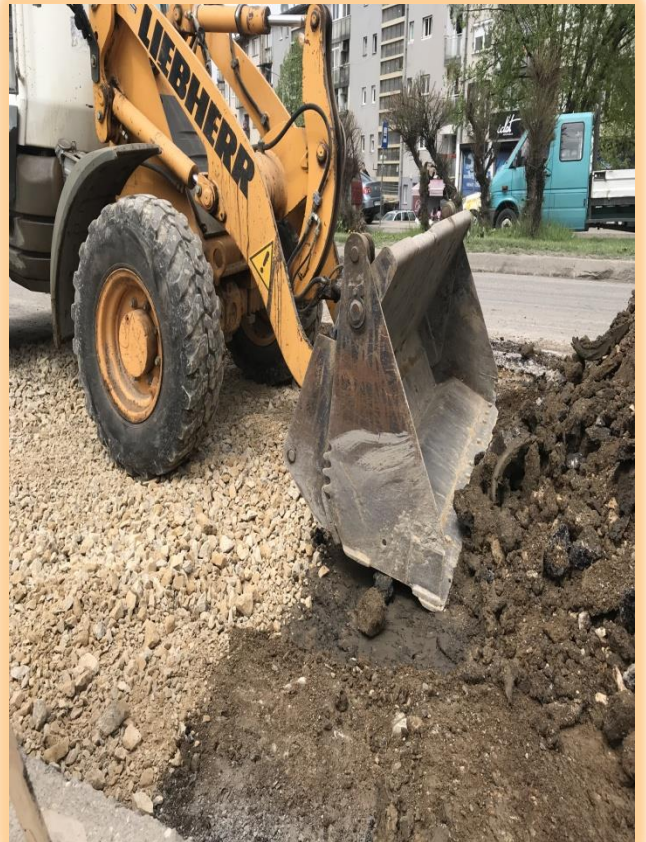












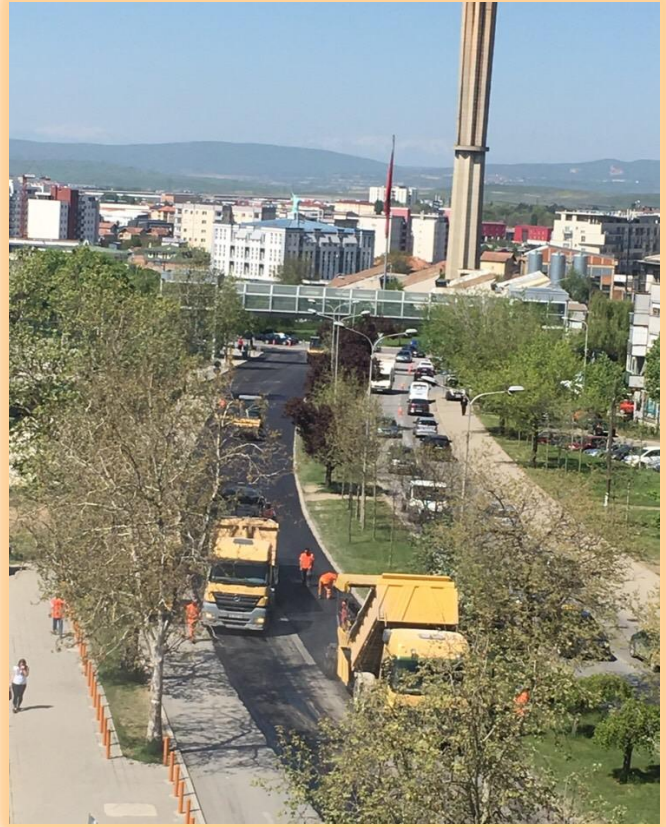

RAPORTI MBIKËQYRËS		SHIFRA 07					
Projekti :	Ndërtimi i rrugës paralele me kanalën e sistemit “Ibër – Lepenc” në fshatin Bërnice e Poshtme	Vlera e projektit: 347,927.05 €					
Investuesi :	Komuna e Prishtinës	Plani dinamik : dy vjet					
Operatori :	KNPSH “Papenpurg” dhe “Adriani Company” SHPK	Nr.identifikues: 616 16 161 521					
Menaxheri i projektit :	Ibrahim Gërvalla, idn ;	Projekti i vitit 2017					
Organi mbikëqyrës :	Zyhrije Pllana, Afërdita Sopi						
Punimet e parapara dhe të realizuara me kontratë							
Vëllimi fizik	Punët e parapara	<ul style="list-style-type: none"> - Ndërtimi-asfaltimi i rrugës në gjatësi prej 1200 m - Ndërtimi i kanalizimit atmosferik në gjatësi prej 1000 m - Punimi i urave dhe lëshesave pllakore (gjithsej 4) - Punimet elektrike 					
	Punimet në realizim-vërejtjet	- Punimet kanë filluar në punimin e lëshesës dhe zhvendosjen e shtyllave elektrike.					
Vëllimi Financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Gjithsejt situacione te paguara ne 2017	Situacioni janar	Situacioni shkurt	Situacioni mars	Situacioni prill	Situacioni maj
		250.000.00€					



RAPORTI MBIKËQYRËS		SHIFRA 08					
Projekti :	Ndërtimi i kolektorit betonarme për largimin e ujit atmosferik dhe kanalizimi fekal në rrugën mbi lumin Mat në lagjen “Kalabria”	Vlera e projektit: 1, 696,063.32€					
Investuesi :	Komuna e Prishtinës	Plani dinamik : 180 ditë					
Operatori :	GO “Jehona” SHPK, NN “Beni Construction” dhe NNP “Arhiko.ing”	Nr.identifikues: 616 16 111 511					
Menaxheri i projektit :	Ibrahim Gërvalla, idn ;	Projekti i vitit 2016					
Organi mbikëqyrës :	Fevzi Jetullahu, Afërdita Sopi						
Punimet e parapara dhe të realizuara me kontratë							
Vëllimi fizik	Punët e parapara	-Ndërtimi i kolektorit betonarme në gjatësi prej 850 m -Ndërtimi i kanalizimit fekal në gjatësi prej 2x850 m					
	Punimet në realizim-vërejtjet	-Punimet nuk kanë filluar për shakë të problemeve pronsore.					
Vëllimi financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacionet e paguara ne 2017	Situacion i shkurt	Situacion i mars	Situacion i	Situacion i	Situacion i
		209.256.70 €					



RAPORTI MBIKËQYRËS		SHIFRA 09					
Projekti :	Ndërtimi i stadiumit të futbollit në Hajvali, faza II	Vlera e projektit: 414,828.79€					
Investuesi :	Komuna e Prishtinës	Plani dinamik : 120 ditë					
Operatori :	„Vizion Capital Partners” SHPK dhe „Conex Group” SHPK	nr.identifikues: 616 16 088 521					
Menaxheri i projektit :	Ibrahim Gërvalla, idn ;	Projekti i vitit 2016					
Organi mbikëqyrës :	Zyhrije Pllana, Fevzi jetullahu, Behgjet Gashi						
Punimet e parapara dhe të realizuara me kontratë							
Vëllimi fizik	Punët e realizuara	-punimet e vrazhda-themelet,përdhesa,kati I parë					
	Punët në realizim e sipër	-Punimet janë duke vazhduar në përgatitjet për vendosjen e konstrukacionit të mbulesës së tribunave.					
Vëllimi financiar	Situacionet (Pagesat e proceduar a)	Situacionet e paguara	Situacioni (shkurt)	Situacioni (prill)	Situacioni	Situacioni	Situacioni
		200,000.00€					



RAPORTI MBIKËQYRËS		SHIFRA 10					
Projekti :	Ndërtimi i rrugës Prishtinë-Sinidoll-Bërnice e Epërme-Bardhosh	Vlera e projektit: 260,584.00€					
Investuesi :	Komuna e Prishtinës	Plani dinamik : 90 ditë					
Operatori :	NNP,,Bashkimi''	nr.identifikues: 616 16 120 521					
Menaxheri i projektit :	Zyhrije Pllana	Projekti i vitit 2017					
Organi mbikqyrës :	Ibrahim Gërvalla, Behgjet Gashi						
Punimet e parapara dhe të realizuara me kontratë							
Vëllimi fizik	Punët e parapara	<ul style="list-style-type: none"> - Trajtimi dhe asfaltimi i rrugës; - Punimi i kanalizimit atmosferik; - Punimi i trotuarit 					
	Punët në realizim e sipër	- Punimet janë duke vazhduar në punimin e trotuareve					
Vëllimi financiar	Situacionet (Pagesat e proceduar a)	Situacionet e paguara ne 2017	Situacioni shkurt	Situacioni prill	Situacioni mars	Situacioni 5	Situacioni
		308,000.00 €					



RAPORTI MBIKËQYRËS		SHIFRA 11					
Projekti :	Ndërtimi i rrugës “Richard Holbrook” (krahu 1 e 2)	Vlera e projektit: 470,047.05€					
Investuesi :	Komuna e Prishtinës	Plani dinamik : 120 ditë					
Operatori :	SHPK “TOIFOR”	Nr.identifikues: 616 17 047 511					
Menaxheri i projektit :	Zyhrije Pllana	Projekti i vitit 2017					
Organi mbikqyrës :	Ibrahim Gërvalla, Fevzi Jetullahu, Amire Krasniqi						
Punimet e parapara dhe të realizuara me kontratë							
Vëllimi fizik	Punët e parapara	- Trajtimi dhe asfaltimi i rrugës; - Punimi i kanalizimit fekal, atmosferik dhe kabllor - Ndriçimi					
	Punët në realizim e sipër	-Punimet janë duke vazhduar në instalimet nëntoksore dhe zgjerim të trasesë					
Vëllimi financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacionet e paguara me 2017	Situacioni 2	Situacioni	Situacioni	Situacioni	Situacioni
		50,000.00 €					





RAPORTI MBIKËQYRËS		SHIFRA 13					
Projekti :	Ndërtimi i disa rrugëve me kubza betoni në Prugovc	Vlera e projektit: 329,112.15€					
Investuesi :	Komuna e Prishtinës	Plani dinamik : 90 ditë					
Operatori :	SHPK "Gerlica Company"	Nr.identifikues: 616 17 103 521					
Menaxheri i projektit :	Ibrahim Gërvalla	Projekti i vitit 2017					
Organi mbikqyrës :	Behgjet Gashi, Zyhrije Pllana						
Punimet e parapara dhe të realizuara me kontratë							
Vëllimi fizik	Punët e parapara	- Trajtimi i rrugicave me kubza betony; - Punimi i kanalizimit fekal					
	Punët në realizim e sipër	-Punimet janë duke vazhduar në përgatitjen e rrugëve për trajtim me kubza.					
Vëllimi financiar	Situacionet (Pagesat e proceduar a)	Situacioni e paguara me 2017	Situacioni prill	Situacioni prill	Situacioni	Situacioni	Situacioni
		150,000.00 €					



RAPORTI MBIKËQYRËS		SHIFRA 14					
Projekti :	Ndërtimi i rrugës paralele me rrugën "B"	Vlera e projektit: 279,939.59€					
Investuesi :	Komuna e Prishtinës	Plani dinamik : 120 ditë					
Operatori :	NN "Beni Construction"	Nr. identifikues: 616 15 216 521					
Menaxheri i projektit :	Ibrahim Gërvalla, idn	Projekti i vitit 2015					
Organi mbikqyrës :	Fevzi jetullahu, Behgjet Gashi						
Punimet e parapara dhe të realizuara me kontratë							
Vëllimi fizik	Punët e realizuara	-Vendosja e pikave të trasës së rrugës, gërmimi i dheut, stabilizimi me material guror					
	Punët në realizim e sipër	- Punimet kanë filluar në pjesën e trasës që janë zgjedhur kontestet pronsore.					
Vëllimi financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacionet e paguara me 2017	Situacioni (II)	Situacioni (III)	Situacioni (IV)	Situacioni (V)	Situacioni (VI)
		50,000.00 €					



RAPORTI MBIKËQYRËS		SHIFRA 15					
Projekti :	Ndërtimi i rrugëve në Prapashticë, lagjja “Fanaj” dhe lagjja “Balaj”	Vlera e projektit: 332,797.88€					
Investuesi :	Komuna e Prishtinës	Plani dinamik : 120 ditë					
Operatori :	NN “Gashi Ing”	Nr.identifikues: 616 15 216 521					
Menaxheri i projektit :	Zyhrije Pllana, idn	Projekti i vitit 2015					
Organi mbikëqyrës	Ymer Mavriqi, Azem Buzuku						
Punimet e parapara dhe të realizuara me kontratë							
Vëllimi fizik	Punët e realizuara	-Vendosja e pikave të trasës së rrugës, gërmimi i dheut, stabilizimi me material guror.					
	Punët në realizim e sipër	-Punimet janë duke vazhduar në zgjerimin e trasesë					
Vëllimi financiar	Situacionet (Pagesat e proceduar a)	Situacionet e paguara me 2017	Situacioni (II)	Situacioni (III)	Situacioni (IV)	Situacioni (V)	Situacioni (VI)
		100,000.00 €					

RAPORTI MBIKËQYRËS		SHIFRA 16					
Projekti :	Ndërtimi i rrugëve në Makoc, lagjja “Balaj” dhe Grshiticë e Epërme, lagjet “Musaj”, “Rexhaj” dhe “Obzovik”.	Vlera e projektit: 207,000.00€					
Investuesi :	Komuna e Prishtinës	Plani dinamik : 150 ditë					
Operatori :	SHPK “Gerlica Company”	Nr.identifikues: 616 17 093 521					
Menaxheri i projektit :	Ibrahim Gërvalla	Projekti i vitit 2017					
Organi mbikëqyrës	Behgjet Gashi, Azem Buzuku						
Punimet e parapara dhe të realizuara me kontratë							
Vëllimi fizik	Punët e parapara	- Trajtimi i rrugicave me kubza betony.					
	Punët në realizim e sipër	- Punimet janë duke vazhduar në lagjet “Berishaj” dhe “Obzovik”.					
Vëllimi financiar	Situacionet (Pagesat e proceduar a)	Situacioni e paguara me 2017	Situacioni prill	Situacioni prill	Situacioni	Situacioni	Situacioni
			50,000.00 €				



RAPORTI MBIKËQYRËS		SHIFRA 17				
Projekti :	Sanimi i gropave dhe deformimeve të shtresave të asfaltit në rrugët dhe trotualet e komunës së Prishtinës për vitin 2017	Vlera e projektit: 327,550.00€				
Investuesi :	Komuna e Prishtinës	Plani dinamik : 12 muaj				
Operatori :	SHPK "Toifor"	nr.identifikues: 616 17 117 521				
Menaxheri i projektit :	Ibrahim Gërvalla, idn	Projekti i vitit 2016				
Organi mbikëqyrës:	Azem Buzuku, Bexhet Gashi					
Punimet e parapara dhe të realizuara me kontratë						
Vëllimi fizik	Punët e realizuara	-Sanimi i gropave me asfalt; -Sanimi i rrugëve me kubza; -Furnizimi dhe vendosja e kapakëve të pusetave dhe grilave.				
	Punët në realizim e sipër	-Sanimi i gropave me asfalt; -Sanimi i rrugëve me kubza. -Furnizimi dhe vendosja e kapakëve të pusetave dhe grilave.				
Vëllimi financiar	Situacionet (Pagesat e proceduar a)	Situacionet e paguara me 2017	Situacioni shkurt	Situacioni mars	Situacioni prill	Situacioni
		66.000.00 €	21.000.00 €	22.000.00 €	30.000.00 €	



RAPORTI MBIKËQYRËS		SHIFRA 18 prill-2018					
Projekti :	Ndërtimi i kolektorit betonarme dhe kanalizimit fekal në rrugën mbi lumin Prishtina	Vlera e projektit:	2 192 854,60 €				
Investuesi :	Komuna e Prishtinës	Plani dinamik :	200 ditë				
Operatori :	Grupi I OE, „Noti Beton” sh.p.k & Ilea-Gr.&H&Consulting”, me lider, „Noti Beton” sh.p.k	Nr.616 15 163 511 dt.09.08.2016					
Menaxheri i projektit :	Fatmir Uka idn	Projekti i vitit :	2016/2017				
Organi mbikëqyrës	Imer Mavriqi, idn, Fevzi Jetullahu, idn., Hazir Krasniqi, tek. i gjeodezisë						
Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara							
Vëllimi fizik	Punët e realizuara	<ul style="list-style-type: none"> ● Gërmimi i dheut për kolektorin dhe KF; ● Mbushja me material guror 0/60 dhe 0/31.5; ● Kallupim, armim, betonim i pllakave të poshtme, mureve dhe pllakës së sipërme të kolektorit; ● Kanalizim fekal, pjesërisht. 					
	Punët në realizim	<ul style="list-style-type: none"> ● Punimet ende nuk kanë filluar për këtë vit kalendarik për shkaqe pronësore-juridike. 					
Vëllimi financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni (1-14)	Situacioni	Situacioni	Situacioni	Situacioni	Situacioni
		1179186.23					
Vonesat Shkalla e cilësisë	Aktualisht sipas planit dinamik			Mirë			
Rekomandime masat për tu ndërmarë	<ul style="list-style-type: none"> ☞ Është njoftuar DIKMK, Drejtoria e Prokurimit, Drejtoria e Pronës, Drejtoria e Inspeksionit dhe Drejtoria e Shërbimeve Publike për probleme pronësoro-juridike (shpronësimet) që po paraqiten gjatë ekzekutimit (aktualisht pengesa është paraqitur te pronari i parcelë nr.1594-0, ku edhe ekziston një objekt ndërtimi. Për këtë çështje te Drejtoria e Pronës, e Inspeksionit dhe e Shërbimeve Publike, nga DIKMK është përcjellë kërkesa për zgjidhje të këtij problemi. 						
Vlerësimi i progresit në projekt	<ul style="list-style-type: none"> ☞ Parashihen vonesa në projekt për shkak të problemeve pronësore-juridike, vërshimeve nga ujërat atmosferike, gypit të sistemit “Ibër - Lepenc” si dhe kushteve tjera të paraqitura nga kanalizimet fekale të shkarkuara në këtë lum. 						


RAPORTI MBIKËQYRËS		SHIFRA 19					
Projekti :	Rregullimi i oborrit të objekteve me banim social në Hajvali	Vlera e projektit: 196 579.09 €					
Investuesi :	Komuna e Prishtinës	Plani dinamik : 90 ditë					
Operatori :	OE "Delta-Ing " SHPK, Prishtinë	Nr.616 17 2026 521.					
Menaxheri i projektit : Organi mbikëqyrës:	*Halil Fejziu, idn Syzana Pllana, Behxhet Gashi.	Projekti i vitit : 2017					
Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara							
Vëllimi fizik	Punët e realizuara	- Matjet dhe piketimi i strukturës; - Pastrimi dhe përgatitja e terrenit; - Punimi i rrugëve ndihmëse; - Kubzimi i disa rrugëve ndihmëse dhe përreth objekteve.					
	Punët në realizim	- Vazhdimi i kubzimit për parkingje.					
Vëllimi financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni (I)	Situacioni (II)	Situacioni (III)	Situacioni (IV)	Situacioni (V)	Situacioni (VI)
		50 000.0€	50 000.0€	50 000.0€	0.0€	0.0€	0.0€
Vonesat Shkalla e cilësisë		10 Ditë			Mesatar		
Rekomandime, masat për t'u ndërmarrë		- Vazhdimi i punimit të pllakave sipas kontratës-projektit.					
Vlerësimi i progresit në projekt		- Projekti është duke u realizuar sipas planit dinamik					





RAPORTI MBIKËQYRËS		SHIFRA 20					
Projekti :	Ndërtimi i rrugës në fshatin Hajkobilë, lagjja "Taliri"	Vlera e projektit: 70 153.05 €					
Investuesi :	Komuna e Prishtinës	Plani dinamik : 60 ditë					
Operatori :	OE NTP "Bashkimi" Koliq - Prishtinë	Nr. 616 17 053 521.					
Menaxheri i projektit : Organi mbikqyrës:	*Halil Fejziu, idn. Afërdita Sopi Azem Buzuku.	Projekti i vitit : 2017					
Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara							
Vëllimi fizik	Punët e realizuara	<ul style="list-style-type: none"> - Shënimi i trasesë, mobilizimi i ndërmarjes; - Gërmimi i trupit të disa rrugëve në tërë gjatësin e trasesë; - Mbushja e trupit të rrugës me material mbushës. 					
	Punët në realizim	<ul style="list-style-type: none"> - Gërmimi i trupit të disa rrugëve në tërë gjatësin e trasesë; - Mbushja e trupit të rrugës me material mbushës. 					
Vëllimi financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni (I)	Situacioni (II)	Situacioni (III)	Situacioni (IV)	Situacioni (V)	Situacioni (VI)
		20 000.0€	0.0€	50 000.0€	0.0€	0.0€	0.0€
Vonesat Shkalla e cilësisë		10 Ditë			Mesatar		
Rekomandime, masat për t'u ndërmarrë		<ul style="list-style-type: none"> - Gërmimi i trupit të disa rrugëve në tërë gjatësin e trasesë; - Mbushja e trupit të rrugës me material mbushës; -Ka filluar identifikimi i parcelave për zbatimin e marrëveshjes sipas kërkesës së drejtorit. 					
Vlerësimi i progresit në projekt		<ul style="list-style-type: none"> - Projekti është duke u realizuar sipas planit dinamik; - Ka filluar identifikimi i parcelave për zbatimin e marrëveshjes sipas kërkesës së drejtorit. 					



 RAPORTI MBIKËQYRËS		SHIFRA 21 Për muajin Mars/2018					
Projekti :	Sanimi i dyshemesë urbane të sheshit “Adem Jashari”	Vlera e projektit: 311 853.00 €					
Investuesi :	Komuna e Prishtinës	Plani dinamik : 90 ditë					
Operatori :	Konzorciumi “Rexha” SHPK “Eko Group” SHPK Lider “Eko Group” SHPK	Nr 616 17 110 521 dt.16.10.2017					
Menaxheri i projektit :	Fatmir Uka, idn	Projekti i vitit 2017/2018					
Organi mbikëqyrës :	Amira Krasniqi, Behxhet Gashi						
Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara							
Vëllimi fizik	Punët e realizuara	● Fillimi i punimeve					
	Punët në realizim	Demolimi i pllakës, punët e gërmimit, punët e mbushjes me zhavorr, fillimi i betonimit të dyshemes, punët e elektrikës.					
Vëllimi financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni (I)	Situacioni (II)	Situacioni (III)	Situacioni (IV)	Situacioni (V)	Situacioni (VI)
		0.0€	0.0€	0.0€	0.0€	0.0€	0.0€
		Situacioni (VII)	Situacioni (VIII)	Situacioni (IX)	Situacioni (X)	Situacioni (XI)	Situacioni (XII)
Vonesat Shkalla e cilësisë	Pëlqimi për zhvillimin e punimeve nga Qendra Rajonale për Trashigimi Kulturore në Prishtinë dhe pëlqimi nga Drejtorja e Urbanizmit.				Mesatar		
Rekomandime masat për tu ndërmarë							
Vlerësimi i progresit në projekt	☞ Punimet janë duke u zhvilluar në bazë të planit dinamik						





PRISHTINA		RAPORTI MBIKËQYRËS					SHIFRA 22
Projekti :	Rregullimi i rrugëve "Reshat Maliqi", "27 Nentori" dhe te trafoja, si dhe rregullimi i infrastruktures në rrugët "Aziz Kelmendi", "Malush Kosova" dhe "Elena Gjika "					Vlera e projektit: 341,901.86 €	
Investuesi :	Komuna e Prishtinës					Plani dinamik : 150 ditë	
Operatori :	"Kema Company" SHPK, adresa QMI - Lipjan					Nr. 616 17 095 521 dt.24/10/2017	
Menaxheri i projektit :	Irfete Zejneli					Projekti i vitit 2017	
Organi mbikëqyrës :	Krenar Xhaferi dhe Azem Buzuku						
Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara							
Vëllimi fizik	Punët e realizuara	● Në rrugën afër subjektit "Beni Dona" në Ulpianë , punimi i kanalizimit fekal, punimi i kanalizimit atmosferik.					
	Punët në realizim	● Punimi i ujëmbledhëseve ; ● Dislokimi i shtyllave; ● Punimi i tamponit 0-63mm.					
Vëllimi financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni (I) 00.00€	Situacioni (II) 00.00€	Situacioni (III) 00.00€	Situacioni (IV) 00.00€	Situacioni (V) 00.00€	
Vonesat Shkalla e cilësisë	Probleme pronësore, në shumicën e rrugëve kemi prona private. Por për këtë gjë u kemi shkruar bashkësive lokale që t'i njoftojnë gjithë pronarët e këtyre parcelave, nëse janë të pëlqimit me nënshkruar marrëveshje me Drejtorinë e Pronës për rregullimin e këtyre rrugëve.						
Rekomandime masat për tu ndërmarrë	☞ Është rekomanduar operatori ekonomik që cilësia e punimeve të jetë komform kontratës dhe paramasës.						
Vlerësimi i progresit në projekt	☞ Punimet janë duke u zhvilluar në bazë të kontratës dhe rekomandimeve të ekipit mbikëqyrës.						




RAPORTI MBIKËQYRËS		SHIFRA 23					
Projekti :	<i>Ndërtimi i disa rrugëve me kubza betoni në lagjet “Veterniku”, “Kalabria” dhe Hajvali</i>	Vlera e projektit:	325 648.00 €				
Investuesi :	Komuna e Prishtinës	Plani dinamik :	90 ditë				
Operatori :	<i>OE: NNTPP “Gashi Ing” nga Suhareka.</i>	Nr.616 17 075 521.					
Menaxheri i projektit : Organi mbikëqyrës:	*Halil Fezriu, idn. Afërdita Sopi. & Azem Buzuku.	Projekti i vitit :	2017				
Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara							
Vëllimi fizik	Punët e realizuara	<ul style="list-style-type: none"> - Shënimi i trasesë, mobilizimi i ndërmarjes; - Gërmimi i trupit të disa rrugëve në tërë gjatësin e trasës; - Mbushja e trupit të rrugës me material mbushës; - Rrugët në veternik dhe Syri i kalter janë perfunduar Abdyl Hamit Adili dhe Logreta. 					
	Punët në realizim	<ul style="list-style-type: none"> - Vazhdimi i tamponizimit të trupit të rrugës me material sipas kontratës; -Vendosja e skajoreve; -Punimi i kanalizimeve. 					
Vëllimi financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni (I)	Situacioni (II)	Situacioni (III)	Situacioni (IV)	Situacioni (V)	Situacioni (VI)
		50 000.0€	50 000.0€	50 000.0€	50 000.0€	0.0€	0.0€
Vonesat Shkalla e cilësisë		10 ditë			Mesatar		
Rekomandime, masat për t’u ndërmarrë		<ul style="list-style-type: none"> - Vazhdimi i tamponizimit të trupit të rrugëve me material, sipas kontratës; -Fillimi i kubzimit të të gjitha rrugëve; - Ka filluar identifikimi i parcelave për zbatimin e marveshjes sipas kërkesës së drejtorit. 					
Vlerësimi i progresit në projekt		<ul style="list-style-type: none"> - Projekti është duke u realizuar sipas planit dinamik. - Ka filluar identifikimi i parcelave për zbatimin e marveshjes sipas kërkesës së drejtorit. 					





PRISHTINA		RAPORTI MBIKËQYRËS					SHIFRA 24
Projekti :	Ndërtimi i rrugës dhe trotuareve në fshatin Drenoc					Vlera e projektit: 367,972.12 €	
Investuesi :	Komuna e Prishtinës					Plani dinamik : 150 ditë	
Grupi i Operatorëve:	"Erdi-Group" SHPK dhe "EL-BAU" SHPK					Nr. 616 17 138 511 dt.22/02/2018	
Menaxheri i projektit :	Irfete Zejneli					Projekti i vitit 2018	
Organi mbikëqyrës :	Krenar Xhaferi dhe Bujar Rama						
Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara							
Vëllimi fizik	Punët e realizuara	<ul style="list-style-type: none"> ● Incizimi gjeodezik i rrugës, aksi te Xhafollët; ● Punimi i gërmimit të rrugës, aksi te Xhafollët; ● Incizimi gjeodezik i trotuareve, aksi A dhe aksi B; ● Punimi i gërmimit të trotuareve, aksi A dhe aksi B. 					
	Punët në realizim	<ul style="list-style-type: none"> ● Punimi me material mbushës, aksi te Xhafollët; ● Shtrirja e gjeotekstilit, aksi te Xhafollët; ● Shtrirja e gjeotekstilit në trotuare, aksi A dhe aksi B; ● Punimi me material mbushës në trotuare, aksi A dhe aksi B. 					
Vëllimi financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni (I)	Situacioni (II)	Situacioni (III)	Situacioni (IV)	Situacioni (V)	Situacioni (VI)
		00.00€	00.00€	00.00€	00.00€	00.00€	00.00€
		Situacioni (I)	Situacioni (II)	Situacioni (III)	Situacioni (IV)	Situacioni (V)	Situacioni (VI)
Vonesat Shkalla e cilësisë	<ul style="list-style-type: none"> ☞ Vonesa sigurisht se do të ketë, për shkak të problemeve pronësore. Ne e kemi njoftuar me shkrim kryetarin e Bashkësisë Lokale, që të marrë pëlqim nga banorët në parcelat e të cilëve kalon projekti; ☞ Kemi bërë shkresë zyrës projektuese për zgjidhjen e problemit për ujërat atmosferike në pjesën e varrezave; 						
Rekomandime masat për tu ndërmarrë	<ul style="list-style-type: none"> ☞ Është rekomanduar operatori ekonomik, që cilësia e punimeve të jetë konform kontratës dhe paramasës. 						
Vlerësimi i progresit në projekt	☞						



 RAPORTI MBIKËQYRËS		SHIFRA 25					
Projekti :	<i>Ndërtimi i kolektorit në Hajvali, lagja "Vitali"</i>	Vlera e projektit: 463.262.41€					
Investuesi :	Komuna e Prishtinës	Plani dinamik : Nuk kemi te caktuar					
Operatori :	KNTSH "Teuta-M" SHPK "Jerliu Grup" Gjilan	<i>Nr.616 17 90 521</i> <i>dt.30/11/2017</i>					
Menaxheri i projektit :	Refik Sadiku nga DIKMK	Projekti i vitit : 2018					
Organi mbikqyrës :	Hazir Krasniqi, Krenar Xhaferi, DIKMK						
Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara							
Vëllimi fizik	Punët e realizuara	Është bërë gëmimi i dheut deri në 50m', vendosja e armaturës në Gjatësi prej 12' ; pritet vazhdimi i armirimit për shkak të objekteve përreth të kolektorit. Punekryesit është obliguar për dorëzimin e planit të punës dhe mënyrën e realizimit të projektit.					
	Punët në realizim	Gërmimi i dheut, armirimi i bazës dhe i mureve të kolektorit, gjithashtu betonimi i tyre.					
Vëllimi financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni I	Situacioni II	Situacioni III	Situacioni IV	Situacioni V	Situacioni VI
		-					
Vonesat Shkalla e cilësisë	-						
Rekomandime, masat për t'u ndërmarrë	<i>Të zgjidhen problemet pronësoro-juridike</i>						
Vlerësimi i progresit në projekt							





PRISHTINA



RAPORTI MBIKËQYRËS

SHIFRA

26

Projekti :	"Revitalizimi i shkallëve dhe ndërtimi i mbikalimit ne lagjen Arbëria"					Vlera e projektit: 463.262.41€	
Investuesi :	Komuna e Prishtinës					Plani dinamik : 120 ditë	
Operatori :	"NBT-ING SHPK, Brigada 123 p.n. Shirokë-Suharekë"					616-17-4891-5-1-1 dt.05/02/2018	
Menaxheri i projektit :	Refik Sadiku nga DIKMK					Projekti i vitit : 2018	
Organi mbikëqyrës :	Bujar Rama ,Krenar Xhaferi,Amira Krasniqi,Ymer Mavriqi DIKMK						
Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara							
Vëllimi fizik	Punët e realizuara	 <p>-Punet pergatitore jemi ende ne realizim -Punet demoluese te shkalleve jane te perfunduara,largimi I pllakave dhe largimi I shtreses nivelizuese</p>					
	Punët në realizim	Gërmimi I dheut punimet ne kanalizimin atmosferik ,identifikimi I instalimeve nentoksore					
Vëllimi financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni I	Situacioni II	Situacioni III	Situacioni IV	Situacioni V	Situacioni VI
		-					
Vonesat Shkalla e cilësisë	Nuk mund e vlersohet						
Rekomandime masat për t'u ndërmarë	<p><i>Duhet të rritet fuqia punetore dhe mekanizimi i nevojshëm për të përfunduar projektin sipas dinamike se paraparë</i></p> <p><i>Problemet pronëso-ro-juridike, në gjatësi prej 17m, në kete gjatësi janë ndërprerë Punimet, por kemi pozicione ku mund të vazhdohen punimet.</i></p>						
Vlerësimi i progresit në projekt							



RAPORTI MBIKËQYRËS		SHIFRA 26					
Projekti :	Ndërtimi i disa rrugëve në lagjen “Sofalia”, nr i prokurimit: 616 17 3304 521, e dt. 26.09.2017.						Vlera e Kontratës: 279,4 71.68€
Investuesi :	Komuna e Prishtinës						Plani dinamik : 150 ditë
Operatori :	Kema Company SHPK, adresa: QMI-Lipjan						Inspektimi: disa herë gjatë muajit prill
Menagjer	Imer Mavriqi, idn.						Projekti i vitit 2017/2018
Mbikëqyrja	Syzana Pllana ing.hidro.						
	Afërdita Sopi, tek.e gjeod.						
Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara							
Vëllimi fizik	Punët e realizuara	Punimet kanë filluar në tetor 2017 dhe deri në dhjetor-fund të sezonit, është realizuar situacioni me vlerë: 100.000€					
	Punët në realizim	-Punimet kanë filluar me një intensitet shumë të vogël-simbolik, në punimin e kanalizimit fekal në rrugën “Halim Miskiq”. Për rrugët që janë me kontratë duhet të rregullohet çështja e pronës, ku duhet të nënshkruhet marrëveshja në mes të pronarëve dhe Drejtorisë së Pronës.					
Vëllimi financiar	Situacionet (Pagesat e procedura)	Situacioni (I)	Situacioni (II)	Situacioni (III)	Situacioni (IV)	Situacioni (V)	Situacioni (VI)
		100.000€				€	
Vonesat Shkalla e cilësisë	Punimet janë duke u zhvilluar sipas dinamikës						
Rekomandim, masat për t'u ndërmarrë	Punimet do të vazhdojnë pasi të rregullohen çështjet pronësore.						

RAPORTI MBIKËQYRËS		SHIFRA 27					
Projekti :	Ndërtimi i infrastrukturës në disa rrugë të fshatrave Sinidoll, Bardhosh, Bërnice dhe lagjja “Kodra e Trimave” në Prishtinë.	Vlera e projektit: 283 470.50 €					
Investuesi :	Komuna e Prishtinës	Plani dinamik : 90 ditë					
Operatori :	OE: NNTPP “Gashi Ing” nga Suhareka.	Nr. 616 17 106 521.					
Menaxheri i projektit : Organi mbikëqyrës:	*Halil Fejziu- idn. Afërdita Sopi, Azem Buzuku.	Projekti i vitit : 2017					
Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara							
Vëllimi fizik	Punët e realizuara	<ul style="list-style-type: none"> - Shënimi i trasesë, mobilizimi i ndërmarjes; - Gërmimi i trupit të disa rrugëve në tërë gjatësin e trasesë, - Mbushja e trupit të rrugës me material mbushës. 					
	Punët në realizim						
Vëllimi financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni (I)	Situacioni (II)	Situacioni (III)	Situacioni (IV)	Situacioni (V)	Situacioni (VI)
		50 000.0€	0.0€	0.0€	0.0€	0.0€	0.0€
Vonesat Shkalla e cilësisë	10 Ditë			Mesatar			
Rekomandime, masat për t'u ndërmarre	<ul style="list-style-type: none"> - Shënimi i trasesë, mobilizimi i ndërmarjes; - Gërmimi i trupit të disa rrugëve në tërë gjatësin e trasesë; - Mbushja e trupit të rrugës me material mbushës; - Ka filluar identifikimi i parcelave për zbatimin e marrëveshjes, sipas kërkesës së drejtorit. 						
Vlerësimi i progresit në projekt	<ul style="list-style-type: none"> - Projekti është duke u realizuar sipas planit dinamik. - Ka filluar identifikimi i parcelave për zbatimin e marrëveshjes, sipas kërkesës së drejtorit. 						



RAPORTI MBIKËQYRËS		SHIFRA 28					
Projekti :	Ndërtimi i urave në pjesën përfundimtare të Unazës qendrore	Vlera e projektit: 1 969 163.08 €					
Investuesi :	Komuna e Prishtinës	Plani dinamik : 180 ditë					
Operatori :	OE "REXHA" SHPK - Prishtinë	Nr.616 15 236 511.					
Menaxheri i projektit : Organi mbikqyrës:	*Halil Fejziu, idn. Afërdita Sopi, Imer Mavriqi Behxhet Gashi.	Projekti i vitit : 2016					
Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara							
Vëllimi fizik	Punët e realizuara	-Ura e parë 74 m', është betonuar deri te shtylla e fundit.					
	Punët në realizim	- Punimet nuk mund të vazhdojnë për shkak të mosdislokimit të hekurudhave dhe mosdislokimit të Doganës, për të cilën çështje është lajmëruar edhe drejtori dhe kryetari i Komunës. Pritet lirimi i hapësirës te Dogana dhe vazhdimi i punimeve.					
Vëllimi financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni (I-VIII)	Situacioni (IX)	Situacioni (X)	Situacioni (XI)	Situacioni (XII)	Situacioni ()
		390 000.0€	0.0€	0.0€	0.0€	0.0€	0.0€
Vonesat Shkalla e cilësisë	10 ditë			Mesatar			
Rekomandime, masat për t'u ndërmarrë	- Punimet nuk mund të vazhdojnë për shkak mosdislokimit të hekurudhave dhe mosdislokimit të Doganës,, për të cilën çështje është lajmëruar edhe drejtori dhe kryetari i Komunës.						
Vlerësimi i progresit në projekt	-Punimet nuk mund të vazhdojnë për shkak mo dislokimit të hekurudhave dhe mosdislokimit të Doganës, për të cilën çështje është lajmëruar edhe drejtori dhe kryetari i Komunës. Pritet lirimi i hapësirës te Dogana dhe vazhdimi i punimeve.						




RAPORTI MBIKËQYRËS		SHIFRA 29					
Projekti :	Ndërtimi i rrugës Barilevë-Besi	Vlera e projektit: 965,582.96 €					
Investuesi :	Komuna e Prishtinës	Plani dinamik :180 ditë					
Operatori :	“Rexha” SHPK, "Benita company" SHPK dhe “Arhiko Ing”, me lider "Rexha” SHPK	Nr.616 15 169 511 dt.01/10/2015					
Menaxheri i projektit :	Qazim Bajrami, nga DIL.	Projekti i vitit : 2015					
Organi mbikqyrës :	Krenar Xhaferi, Amire Krasniqi dhe Behxhet Gashi nga DIL.						
Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara							
Vëllimi fizik	Punët e realizuara	Është përfunduar piketimi i trasesë dhe përgatitja e punishtes, kanalizimi fekal, atmosferik, kabllor, montimi i skajorëve, tamponizimi me 0-31mm, asfaltimi i shtresës së pare. Është përfunduar asfaltimi i shtresës së dytë në rrugën kryesore, sinjalizimi, janë përfunduar 95% të trotuareve. Janë montuar shtyllat e ndriçimit publik dhe trupat ndriçues.					
	Punët në realizim	Kanë filluar punimet në kycjen e ndriçimit publik në trafostacionet e parapara me projekt.					
Vëllimi financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni (I-XV)	Situacion i (XVI)	Situacioni (XVII)	Situacioni (XVIII)	Situacion i (XVIII)	Situacioni (XX)
		732,000.00	50,000.00	50,000.00			
Vonesat Shkalla e cilësisë		E kënaqshme					
Rekomandime, masat për t'u ndërmarrë		<i>Varësisht prej kushteve atmosferike, të bëhen përpjekje për përfundimin e të gjitha punimeve.</i>					
Vlerësimi i progresit në projekt		Punimet janë në fazën përfundimtare.					








 RAPORTI MBIKËQYRËS		SHIFRA 30					
Projekti :	Ndërtimi i rrugëve në lagjet “Myrtaj”, “Bekaj”, “Bahtirovit” dhe “Nezirovit” në fshatin Busi.	Vlera e projektit: 347,880.30 €					
Investuesi :	Komuna e Prishtinës	Plani dinamik : 90 ditë					
Operatori :	KNPSH “PA PENGURG” & “ADRIANI COMPANY” SHPK	616 17 4861 511 dt.22/02/2018					
Menaxheri i projektit :	Qazim Bajrami nga DIKMK	Projekti i vitit : 2017					
Organi mbikqyrës :	Dukagjin Buçaj, Hazir Krasniqi nga DIKMK						
Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara							
Vëllimi fizik	Punët e realizuara						
	Punët në realizim						
Vëllimi financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacion i	Situacion i	Situacion i	Situacion i	Situacion i	Situacioni VI
		I	II	III	IV	V	VI
Vonesat Shkalla e cilësisë							
Rekomandime, masat për t'u ndërmarrë		<p><i>Pas analizimit të projektit, kam vërejtur se rruga e projektuar kalon nëpër pronë private. Kam njoftuar B. Lokale që të kontaktojnë pronarët e parcelave dhe të deklarojnë me shkrim nëse janë të gatshëm që pa kompenzim të lirojnë pronat, në mënyrë që të përfundohen punimet sipas projektit.</i></p> <p><i>Duke marrë për bazë këto probleme, nuk mund të parashikojmë dt. e fillimit të punimeve pa u zgjidhur problemet pronësore.</i></p>					
Vlerësimi i progresit në projekt							

RAPORTI MBIKËQYRËS		SHIFRA 31					
Projekti :	<i>Ndërtimi i rrugëve në brendësi të fshatit Slivovë</i>	Vlera e projektit: 99,385.36 €					
Investuesi :	Komuna e Prishtinës	Plani Dinamik : 60 Ditë					
Operatori :	<i>NTP "BASHKIMI" Koliq-Prishtinë</i>	616 17 146 521 dt.12/02/2018					
Menaxheri i projektit :	Qazim Bajrami nga DIKMK	Projekti i vitit : 2018					
Organi mbikëqyrës:	Bujar Rama, Ramadan Nebihi nga DIKMK						
Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara							
Vëllimi fizik	Punët e realizuara						
	Punët në realizim						
Vëllimi financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacion i	Situacion i	Situacion i	Situacion i	Situacion i	Situacioni VI
		I	II	III	IV	V	
Vonesat Shkalla e cilësisë							
Rekomandime masat për t'u ndërmarrë		<p><i>Pas analizimit të projektit, kam vërejtur se rruga e projektuar kalon nëpër pronë private. Kam njoftuar B. Lokale që të kontaktojnë pronarët e parcelave dhe të deklarojnë me shkrim nëse janë të gatshëm që pa kompensim të lirojnë pronat, në mënyrë që të përfundohen punimet sipas projektit, po ashtu edhe kushtet atmosferike në këtë moment ndikojnë për fillimin e punimeve.</i></p> <p><i>Për këtë arsye nuk mund të parashikojmë dt. e fillimit të punimeve pa u zgjidhur problemet pronësore.</i></p>					
Vlerësimi i progresit në projekt							

 RAPORTI MBIKËQYRËS		SHIFRA 32					
	Renovimi i Stadiumit të qytetit të Prishtinës	Vlera e projektit: 3,843,715.42 €					
Investuesi :	MKRS dhe Komuna e Prishtinës	Plani Dinamik : 14 muaj					
Operatori :	Konzorciumi “Al-Trade” SHPK & NP “Izolimi” Prishtinë	Nr.207-15-119-5-1-1 dt.20/06/2016					
Menaxheri i projektit :	Florim Grajçevci nga MKRS						
Organi mbikëqyrës	Qazim Bajrami nga DIKMK						
Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara							
Vëllimi fizik	Punët e realizuara	Demolimi i mureve, parmacëve, instalimeve të ndryshme, gërmimi i dheut në fushën e lojës, pastrimi i shkallëve të tribunave, përgatitja e armaturës për betonim të themeleve, murosja e mureve ndarëse të tribunave përëndimore, përforcimi i tribunave me shtylla dhe traja të çelikut, mbjellja e barit, asfaltimi i stazës së atletikës.					
	Punët në realizim	Rrjeti i ujësjellësit, kanalizimit, ngrohjes, izolimi i shkallëve të tribunave, fasada strukturale, montimi i karrigeve.					
Vëllimi Financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni (I)	Situacioni (II)	Situacioni (III)	Situacioni (IV)	Situacioni (V)	Situacioni (VI)
		200,000.00	200,000.00	200,000.00	160,928.86 01/11/2017	200,000€ 05/12/2017	
Vonesat, Shkalla e cilësisë							
Rekomandime, masat për t'u ndërmarrë		Nevojitet hapësira prej 150 m ² për vendosjen e trafos, gjeneratorit dhe qilerëve, poashtu kemi kërkuar nga Drejtoria e Pronës mundësinë e lirimit të një pjese të parcelës që është pronë komunale, e cila nevojitet për plotësimin e kërkesës për numrin e parkingjeve.					
Vlerësimi i progresit në projekt		Nuk është duke u punuar me kapacitet të plotë për shkak të kushteve atmosferike. Është nënshkruar kontrata e punëve të papaparapara nga ana e MKRS-ës dhe kompanisë “Al-Trade” SHPK. Sipas marrëveshjes, Komuna i ka kryer të gjitha obligimet financiare. Nga kontrata bazë kanë mbetur për realizim edhe:349,760.49€.					











PRISHTINA		RAPORTI MBIKËQYRËS					SHIFRA 33
Projekti :	"Ndërtimi i kanalizimit Besi - Barilevë - Lebanë - "Kodra e Trimave"					Vlera e projektit: 196,675.20 €	
Investuesi :	Komuna e Prishtinës					Plani dinamik : 120 Ditë	
Operatori :	"Kema Company" SHPK, NSHP "Dimi Bau"					Nr 616 17 74 521 dt.18/08/2017	
Menaxheri i projektit :	Fevzi Jetullahu, idh					Projekti i vitit 2017	
Organi mbikëqyrës :	Fevzi Jetullahu, idh, Syzana Pllana, idh, Afërdita Sopi, gjeo.						
Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara							
Vëllimi fizik	Punët e realizuara	● Incizimi gjeodezik					
	Punët në realizim	<ul style="list-style-type: none"> ● Pasrimi i terrenit; ● Gropimi ; ● Instalimi i gypave; ● Mbulimi i kanalit; ● Punimi i pusetave. 					
Vëllimi financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni (I)	Situacioni (II)	Situacioni (III)	Situacioni (IV)	Situacioni (V)	Situacioni (VI)
		0.0€	0.0€	0.0€	0.0€	0.0€	0.0€
		Situacioni (I)	Situacioni (II)	Situacioni (III)	Situacioni (IV)	Situacioni (V)	Situacioni (VI)
Vonesat Shkalla e cilësisë							
Rekomandime, masat për tu ndërmarrë	<ul style="list-style-type: none"> ☞ Është obliguar operatori nga organi mbikëqyrës, që të rrite kapacitetin dinamik të punimeve, pasi që kemi pasur pengesa nga banorët e lagjes gjatë ekzekutimit të punimeve, gjegjësisht rreth pronave private. 						
Vlerësimi i progresit në projekt	<ul style="list-style-type: none"> ☞ Punimet janë duke u zhvilluar në bazë të planit dinamik. 						



PRISHTINA		RAPORTI MBIKËQYRËS					SHIFRA 34
Projekti :	Ndërtimi i rrugës Rimanishtë - Siqevë					Vlera e projektit: 167,748.21 €	
Investuesi :	Komuna e Prishtinës					Plani dinamik : 90 ditë	
Operatori :	” Nëntë Vëllezërit ” SHPK					Nr 616 17 134 521 dt.16/01/2018	
Menaxheri i projektit :	Dukagjin Buçaj					Projekti i vitit 2018	
Organi mbikëqyrës :	Afërdita Sopi dhe Ramadan Nebihi						
Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara							
Vëllimi fizik	Punët e realizuara	Zyrtarisht kanë filluar punimet më 19.03.2018					
	Punët në realizim	Nuk kemi filluar ende për shkak të reshjeve atmosferike					
Vëllimi financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni (I)	Situacioni (II)	Situacioni (III)	Situacioni (IV)	Situacioni (V)	Situacioni (VI)
		50,000.0€	0.0€	0.0€	0.0€	0.0€	0.0€
		Situacioni (VII)	Situacioni (VIII)	Situacioni (IX)	Situacioni (X)	Situacioni (XI)	Situacioni (XII)
Vonesat Shkalla e cilësisë	Nuk ka vonesa						
Rekomandime, masat për t'u ndërmarrë	☞ Të vazhdohet sipas planit dinamik						
Vlerësimi i progresit në projekt	Progresi i punëve është i kënaqshëm.						




PRISHTINA		RAPORTI MBIKËQYRËS					SHIFRA 35
Projekti :	Ndërtimi i rrugëve dhe kanalizimi fekal te rruga "Ulqini"	Vlera e projektit: 82,625.13 €					
Investuesi :	Komuna e Prishtinës	Plani dinamik : 120 Ditë					
Operatori :	NNTP" Gashi ING"	Nr 616 17 144 521 dt.26/01/2018					
Menaxheri i projektit :	Afërdita Hasimi	Projekti i vitit 2018					
Organi mbikëqyrës :	Syzana Pllana, Ramadan Nebihi						
Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara							
Vëllimi fizik	Punët e realizuara	Zyrtarisht kane filluar punimet më 19.03.2018					
	Punët në realizim	Nuk kemi filluar ende për arsye të problemeve me prona					
Vëllimi financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni (I)	Situacioni (II)	Situacioni (III)	Situacioni (IV)	Situacioni (V)	Situacioni (VI)
		0.0€	0.0€	0.0€	0.0€	0.0€	0.0€
		Situacioni (VII)	Situacioni (VIII)	Situacioni (IX)	Situacioni (X)	Situacioni (XI)	Situacioni (XII)
Vonesat Shkalla e cilësisë		--			Mesatar		
Rekomandime masat për tu ndërmarë	☞						
Vlerësimi i progresit në projekt	☞						


PRISHTINA		RAPORTI MBIKËQYRËS					SHIFRA 36
Projekti :	Ndërtimi i disa rrugëve në fshatin Trudë	Vlera e projektit: 375,501.30 €					
Investuesi :	Komuna e Prishtinës	Plani dinamik : 90 ditë					
Operatori :	OE" Pro & Co Group" SHPK	Nr 616 17 142 521 dt.27/02/2018					
Menaxheri i projektit :	Afërdita Hasimi	Projekti i vitit 2018					
Organi mbikëqyrës :	Krenar Xhaferi, Ramadan Nebihi						
Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara							
Vëllimi fizik	Punët e realizuara	Zyrtarisht kanë filluar punimet më 19.03.2018					
	Punët në realizim	Nuk kemi filluar ende për shkak të problemeve me prona					
Vëllimi financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni (I)	Situacioni (II)	Situacioni (III)	Situacioni (IV)	Situacioni (V)	Situacioni (VI)
		0.0€	0.0€	0.0€	0.0€	0.0€	0.0€
		Situacioni (VII)	Situacioni (VIII)	Situacioni (IX)	Situacioni (X)	Situacioni (XI)	Situacioni (XII)
Vonesat		--			Mesatar		
Shkalla e cilësisë							
Rekomandime, masat për t'u ndërmarrë							
Vlerësimi i progresit në projekt							

 RAPORTI MBIKËQYRËS		SHIFRA 37					
Projekti :	Sanimi i kanalizimeve fekale primare dhe sekondare në territorin e komunës së Prishtinës	Vlera e projektit: 38,015 €					
Investuesi :	Komuna e Prishtinës	Plani dinamik : 360 Ditë					
Operatori :	“ERUOFAMIS” SHA	Nr 616 17 137 521 dt.28/12/2017					
Menaxheri i projektit :	Syzana Pllana	Projekti i vitit 2018					
Organi mbikëqyrës :	Aferdita Sopi, Azem Buzuku						
Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara							
Vëllimi fizik	Punët e realizuara	Sanimi i kanalizimeve në disa lagje të Prishtinës, rrugaët: “Vëllezërit Fazliu”, “Gryka e Llapushnikut”, “Hysen Terpeza”, “Bill Klinton”, “Stambolli”, “Gjergj Balshaj”, “Termokos”, “Ilaz Agushi”, në Bardhosh te hekurudha.					
	Punët në realizim						
Vëllimi financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni (I)	Situacioni (II)	Situacioni (III)	Situacioni (IV)	Situacioni (V)	Situacioni (VI)
		14,080.00€	7,639.60€	0.0€	0.0€	0.0€	0.0€
		Situacioni (VII)	Situacioni (VIII)	Situacioni (IX)	Situacioni (X)	Situacioni (XI)	Situacioni (XII)
Vonesat Shkalla e cilësisë		--			Mesatar		
Rekomandime, masat për t’u ndërmarrë		☞ Është obliguar operatori nga organi mbikëqyrës, që të rritë kapacitetin dinamik të punimeve, si dhe të bëjë sigurimin e punishteve.					
Vlerësimi i progresit në projekt		☞ Punimet janë duke u zhvilluar në bazë të planit dinamik					



 RAPORTI MBIKËQYRËS		SHIFRA 38					
Projekti :	Ndërtimi i kanalizimit fekal dhe atmosferik në rrugët “Fehmi Agani” dhe “Hajdar Dushi”, si dhe ujësjellësi	Vlera e projektit: 348.679,20 €					
Investuesi :	Komuna e Prishtinës	Plani dinamik : 60 ditë					
Operatori :	"NOTI BETON" SHPK	Nr i prokurimit: 6161794521 dt.12/12/2017					
Menaxheri i projektit :	Syzana Pllana	Projekti i vitit 2018					
Organi mbikëqyrës :	Aferdita Sopi, Behxhet Gashi						
Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara							
Vëllimi fizik	Punët e realizuara	Kontrollimi dhe evidentimi i instalimeve nenstokesore; Trasimi gjeodezik; Demolimi dhe pastrimi i terrenit; Gërmimi i kanalit me makineri; Gërmimi i kanalit me dorë; Planifikimi i fundit të kanalit; Furnizimi, transporti dhe vendosja e zhavorrit të imët (0-16) mm, (0-32), (0-63) mm; Mbulimi dhe planifikimi i kanalit me material guror (0-100)mm; Furnizimi, transporti dhe vendosja e gypave ø 630, 800mm; Furnizimi, transporti dhe vendosja e betonit; Furnizimi, transporti dhe vendosja e tubave për puseta, konuseve, shkalleve, kapakëve.					
	Punët në realizim	Gërmimi i kanalit me makineri; Gërmimi i kanalit me dorë; Planifikimi i fundit të kanalit; Furnizimi, transporti dhe vendosja e zhavorrit të imët (0-16) mm, (0-32), (0-63) mm; Mbulimi dhe planifikimi i kanalit me material gurorë(0-100)mm; Furnizimi, transporti dhe vendosja e gypave ø 630, 800mm; Furnizimi, transporti dhe vendosja e gypave të ujësjellësit ø 110 PEHD RC.					
Vëllimi financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni (I)	Situacioni (II)	Situacioni (III)	Situacioni (IV)	Situacioni (V)	Situacioni (VI)
		50,000.00€	50,000.00€	0.0€	0.0€	0.0€	0.0€
		Situacioni (VII)	Situacioni (VIII)	Situacioni (IX)	Situacioni (X)	Situacioni (XI)	Situacioni (XII)
Vonesat Shkalla e cilësisë	--		Mesatar				
Rekomandime, masat për t'u ndërmarrë	<input checked="" type="checkbox"/> Është obliguar operatori nga organi mbikëqyrës, që të rritë kapacitetin dinamik të punimeve, si dhe të bëjë sigurimin e vendpunishtes, të bejë sigurimin e kanalit dhe t'i përmbahet projektit.						
Vlerësimi i progresit në projekt	<input checked="" type="checkbox"/> Punimet janë duke u zhvilluar në bazë të planit dinamik						



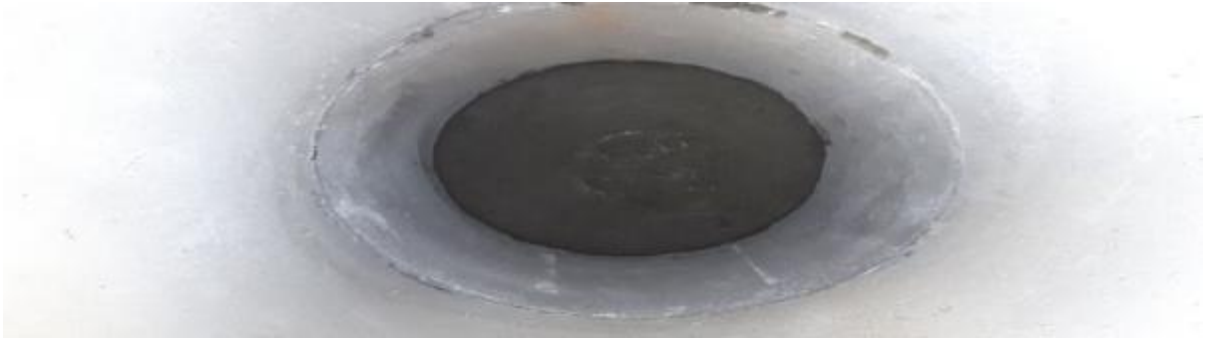



PRISHTINA		RAPORTI MBIKËQYRËS				SHIFRA 39	
Projekti :	Ndërtimi i kanalizimeve fekale dhe atmosferike në territorin e komunës së Prishtinës					Vlera e projektit: 355,555.55 €	
Investuesi :	Komuna e Prishtinës					Plani dinamik : 90 ditë	
Operatori :	"NOTI BETON" SHPK					Nr i prokurimit: 61617100521 dt.30/11/2017	
Menaxheri i projektit :	Syzana Pllana					Projekti i vitit 2018	
Organi mbikëqyrës :	Aferdita Sopi, Behxhet Gashi						
Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara							
Vëllimi fizik	Punët e realizuara	Kontrollimi dhe evidentimi i instalimeve nëntokësore; Trasimi gjeodezik; Demolimi dhe pastrimi i terrenit; Gërmimi i kanalit me makineri; Gërmimi i kanalit me dorë; Planifikimi i fundit të kanalit; Mbushja dhe mbulimi i kanalit me material rrethor jokoherent; Furnizimi, transporti dhe vendosja e gypave ø 250mm; Furnizimi, transporti dhe vendosja e betonit; Furnizimi, transporti dhe vendosja e tubave për puseta, konuseve, shkalleve, kapakëve.					
	Punët në realizim	Gërmimi i kanalit me makineri; Gërmimi i kanalit me dorë; Planifikimi i fundit të kanalit; Mbushja dhe mbulimi i kanalit me material rrethor jokoherent; Furnizimi, transporti dhe vendosja e gypave ø 250mm.					
Vëllimi financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni (I)	Situacioni (II)	Situacioni (III)	Situacioni (IV)	Situacioni (V)	Situacioni (VI)
		0.0€	0.0€	0.0€	0.0€	0.0€	0.0€
		Situacioni (VII)	Situacioni (VIII)	Situacioni (IX)	Situacioni (X)	Situacioni (XI)	Situacioni (XII)
Vonesat Shkalla e cilësisë		--			Mesatar		
Rekomandime, masat për t'u ndërmarrë		☞ Është urdhëruar operatori nga organi mbikëqyrës, që të rritë kapacitetin dinamik të punimeve, si dhe të bëjë sigurimin e vendpunishtes, të bëjë sigurimin e kanalit, si dhe t'i përmbahet projektit.					
Vlerësimi i progresit në		☞ Punimet janë duke u zhvilluar në bazë të planit dinamik					

*Foto gjatë ekzekutimit të punimeve



PRISHTINA		RAPORTI MBIKËQYRËS				SHIFRA 40	
Projekti :	Ndërtimi i kanalizimit fekal tek Rezonanca, ndërtimi i kanalizimit fekal, kanalizimit atmosferik, si dhe ujësjellësit në rrugën "Bedri Pejani" dhe "Andrea Gropa", ndërtimi i kanalizimit fekal dhe kanalizimit atmosferik në rrugën "Meto Bajraktari" dhe "Qajupi".				Vlera e projektit: 191,687.46 €		
Investuesi :	Komuna e Prishtinës				Plani dinamik : 90 ditë		
Operatori :	NNTPP "GASHI ING" SHPK				Nr i prokurimit: 616-17-4307-5-2-1 dt.09/11/2017		
Menaxheri i projektit :	Syzana Pllana				Projekti i vitit 2018		
Organi mbikëqyrës :	Aferdita Sopi, Behxhet Gashi						
Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara							
Vëllimi fizik	Punët e realizuara	Kontrollimi dhe evidentimi i instalimeve nëntokësore; Trasimi gjeodezik; Demolimi dhe pastrimi i terrenit; Gërmimi i kanalit me makineri; Gërmimi i kanalit me dorë; Planifikimi i fundit të kanalit; Mbushja dhe mbulimi i kanalit me material rrethor jokoherent rrethorore d 0-100mm; Furnizimi, transporti dhe vendosja e gypave ø 400 mm; Furnizimi, transporti dhe vendosja e betonit; Furnizimi, transporti dhe vendosja e tubave për puseta, konuseve, shkallëve, kapakëve.					
	Punët në realizim	Gërmimi i kanalit me makineri; Gërmimi i kanalit me dorë; Planifikimi i fundit të kanalit; Mbushja dhe mbulimi i kanalit me material rrethor jo koherent; Furnizimi, transporti dhe vendosja e gypave ø 250mm.					
Vëllimi financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni (I)	Situacioni (II)	Situacioni (III)	Situacioni (IV)	Situacioni (V)	Situacioni (VI)
		0.0€	0.0€	0.0€	0.0€	0.0€	0.0€
		Situacioni (VII)	Situacioni (VIII)	Situacioni (IX)	Situacioni (X)	Situacioni (XI)	Situacioni (XII)
Vonesat	--			Mesatar			
Shkalla e cilësisë							
Rekomandime, masat për t'u ndërmarë	<input checked="" type="checkbox"/> Është urdhëruar operatori nga organi mbikëqyrës, që të rritë kapacitetin dinamik të punimeve, si dhe të bëjë sigurimin e vendpunishtes, të bëjë sigurimin e kanalit, si dhe t'i përmbahet projektit.						
Vlerësimi i progresit në projekt	<input checked="" type="checkbox"/> Punimet janë duke u zhvilluar në bazë të planit dinamik.						



1.4. Projektet infrastrukturore të vitit 2015-2017 të bartura në vitin 2018

Nr	Emri i projektit	Punëkryesi	Vlera e kontraktuar
1.	Ndërtimi i bulevardit mbi Kurriz	"REXHA"	977,725.51€
2.	Ndërtimi i rrugës paralele me rrugën "B"	Beni-Construction	279,939.59€
3	Renovimi i stadiumit të Qytetit të Prishtinës	Konzorciumi "Al-Trade" SHPK & NP "Izolimi"	3,843,715.42€
4.	Ndërtimi i urave në pjesën perendimore të Unazës qendrore Prishtinë	Rexha&Arhiko& Benita" - Prishtinë	1,969,163.08€
5.	Ndërtimi i stadiumit të futbollit në Hajvali, faza II	Vision Capital&Conex Group - Fushë Kosovë	414,828.79€
6.	Sanimi i gropave dhe deformimeve të shtresave të asfaltit në rrugët dhe trotualet në komunën e Prishtinës për vitin 2017	TOIFOR – Prishtinë	327.550.00€
7	Ndërtimi i disa rrugicave me kubza betoni në "Shkabaj" dhe "Kalabria	SHPK,,PRO & CO GROUP"	199,837.39€
8	Ndërtimi i rrugës "Richard Holbrook" (krahu 1 e 2)	SHPK,,TOIFOR"	470,047.05€
9	Implementimi i projektit "Bllok pas blloku" në Bregun e Diellit	OE" N.P.N Vision Projekt" Gjilani	166,274,11€
10	Ndërtimi i kolektorit betonarme dhe kanalizimi fekal në rrugën mbi lumin Prishtina	Grupi i OE,,Noti Beton"sh.p.k&,,Ileaa-Gr""&H&B Consulting" me lider,,Noti Beton"	2,192,854,6€
11	Ndërtimi i rrugëve dhe kanalizimeve fekale dhe atmosferike në krahun e djathtë dhe të majtë të rrugës "Bajram Bahtiri"	SHPK "Gerlica Company"	286.655.32 €
12	Ndërtimi i disa rrugëve me kubza betoni në Hajvali	Rexha-Com	359.351.97 €
13	Ndërtimi i disa rrugëve në fshatin Barilevë	NNP "SOPI"	324.457,38 €
14	Ndërtimi i kanalizimit "Besi - Barilevë- Lebanë – "Kodra e Trimave"	"Kema company" SH.P.K & Nnsh "Dimi Bau"	196.675.20€
15	Ndërtimi i disa rrugëve me kubza betoni në Prugovc	SHPK "Gerlica Company"	329,112.15€
16	Ndërtimi i disa rrugëve me kubza betoni në Veternik, Kalabri dhe Hajvali	NNTPP "Gashi Ing"	325, 648.00 €
17	Rregullimi i oborrit të objekteve me banim social në Hajvali	"Delta-Ing "	196, 579.09 €
18	Ndërtimi i rrugës Prishtinë-Sinidoll-Bërnice e Epërme-Bardhosh	NNP,,Bashkimi"	260,584.00€
19	Ndërtimi i kolektorit betonarme për largimin e ujit atmosferik dhe kanalizimi fekal në rrugën mbi lumin Mat në lagjen "Kalabria"	G.O. ,,Jehona"shpk , N.N.,Beni Construction" dhe N.N.P.,Arhiko.ing"	1, 696,063.32€
20	Ndërtimi i rrugës paralele me kanalin "Ibër Lepenc" në fshatin Bërnice e Poshtme	K.N.P.SH,,Papenpurg&Adriani Company"Sh.p.k	347,927.05 €
22	Ndërtimi i rrugës Barilevë-Besi	shpk", "Benita company"sh.p.k dhe "Arh Arhiko Ing&"Rexha	965,582.96 €
23	Ndërtimi i rrugëve në Sofali	Kema Kompany	279,471.68€
24	Ndërtimi i rrugëve në Prapashticë, lagjet "Fanaj" dhe "Balaj"	NNTPP "Gashi Ing"	332,797,88€
25	Ndërtimi i rrugëve në Makovc, lagjja "Balaj" dhe Grashticë e Epërme, lagja "Musa", "Rexhaj" dhe "Obzovik"	SHPK "Gerlica Company"	207,000.0€
26	Ndërtimi i infrastrukturës në disa rrugë të fshatit Sinidoll, Bardhosh, Bernice dhe "Kodra e Trimave"	NNTPP "Gashi Ing"	283,470.50€
27	Ndërtimi i rrugëve në fshatin Hajkobillë, lagjja "Taliri"	NTP"Bashkimi"	70,153,05€
28	Ndërtimi i kanalizimeve fekale te Rezonanca, ndërtimi i kanalizimit fekal, kanalizimi atmosferik, si dhe ujësjellesi në rrugën "Bedri Pejani" dhe "Andrea Gropa", ndërtimi i kanalizimit fekal dhe kanalizimit atmosferik në rrugën Meto	NNTPP. "Gashi Ing"	191,687,46€
29	Rregullimi i rrugëve "Reshat Maliqi", "27 Nentori" dhe te Trafoja, si dhe rregullimi i infrastrukturës në rrugët "Aziz Kelmendi", "Malush Kosova" dhe	Shpk."Kema Company	341,901,86€
30	Ndërtimi i kanalizimeve fekale dhe atmosferike në territorin e komunës së Prishtinës	Noti-Beton	355,555,55€
31	Ndërtimi i kanalizimit fekal dhe atmosferik në rrugët "Fehmi Agani" dhe "Hajdar Dushi", si dhe ndërtimi i ujësjellësit në rrugën "Fehmi Agani"	Noti-Beton	348,679,2€

1.5.Projektet infrastrukturore të vitit 2018

Nr	Emri i projektit	Punëkryesi	Vlera e kontraktuar
1.	Rindërtimi, sanimi dhe zgjerimi i disa rrugëve sekondare në territorin e komunës së Prishtinës	NTP "BASHKIMI DHE NPSH "BAGERI"	247,853.52 €
2.	Sanimi dhe asfaltimi i rrugës "Fehmi Lladrovci"	Beni-Construction	59,480.30 €
3	Hartimi i projekteve të infrastrukturës rrugore,	3 D Projekt	0.192 €,sipas specifikacionit.
4.	Sanimi i kanalizimeve fekale primar dhe sekondar në territorin e komunës së Prishtinës	Famis	38,015 €
5.	Ndërtimi i kolektorit në Hajvali, lagja "Vitali"	KNTSH Teuta-M shpk	463.262.41€
6.	Ndërtimi i rrugëve dhe kanalizimit fekal te rruga "Ulqini"	Gashi ing	82,625.13 €
7.	Ndërtimi i rrugëve në brendësi të fshatit Slivovë	Bashkimi	99,385.36 €
8	Rivitalizimi i shkallëve në lagjen "Arbëria"	NBT-ING shpk	463.262.41€
9	Ndërtimi i rrugëve në lagjet "Myrtaj", "Bekaj", "Bahtirovit" dhe "Nezirovit" në fshatin Busi	Papenburgji	
10	Ndërtimi i rrugës dhe trotuareve në fshatin Drenovc, LOT 2	Erdi Group shpk	
11	Ndërtimi i disa rrugëve në fshatin Trudë	Pro & Co group	375,501.30 €
12	Ndërtimi i rrugës Rimanishtë - Siqevë	" Nëntë Vëllezërit " Shpk	167,748.21 €



Komuna e Prishtinës
RAPORTI MUJOR

Drejtoria	Drejtoria e Investimeve Kapitale dhe Menaxhimit të Kontratave
Sektori	Menaxhimi i kontratave për ndërtim të lartë
Periudha raportuese	Prill 2018
Emri dhe mbiemri i raportuesit	Ferit Fazliu, shëf i Sektorit

• **PËRMBLEDHJE**

Ky sektor në bazë të detyrave programore, kryesisht është marrë me përpunimin e lëndëve me problematikë të ndërtimit, hartimin e detyrave projektuese, mbikëqyrjen e projekteve, mbikëqyrjen e objekteve, hapjen dhe vlerësimin e tenderëve, marrja pjese në komisionet e caktuara nga Kryetari i Komunës dhe drejtori i Drejtorisë për lëmin e ndërtimit dhe veprimtari të tjera që kanë të bëjnë me këtë sektor.

✓ **AKTIVITETET E PLANIFIKUARA PËR VITIN 2018**

Për vitin 2018 janë planifikuar këto aktivitete të Sektorit për menaxhimin e ndërtimit të lartë, e që janë edhe pjesë e aktiviteteve të Drejtorisë:

- Kryerja e lëndëve në bazë të kërkesave të palëve në afat;
- Marrja pjesë në hapjen dhe vlerësimin e tenderëve;
- Mbikëqyrja e kontratave të ndërtimit të lartë të projekteve që investon Komuna ose investuesve tjerë për nevoja të Komunës;
- Përgatitja e raportit mujor;
- Këshillimi i drejtorit dhe sektorëve tjerë për çështjet e ndërtimit,
- Aktivitete të paplanifikuara, me kërkesë të organeve të Komunës.

- **AKTIVITETET E REALIZUARA**

Gjatë këtij muaji janë ekzekutuar këto aktivitete:

- Zgjedhja e lëndëve sipas kërkesave të palëve
 - Të pranuar gjatë këtij muaji 23 lëndë.
 - Të zgjedhura 22 lëndë.
- Vlerësim të kontratave 0
- Hapje të tenderëve 0
- Përgatitja e dokumentacionit për tenderim të kontratave kornizë për vitin 2018, 3 kontrata kornizë dhe një kontratë të rregullt.
- Propozim nevojat për investime afatmesme në ndërtimin e lartë.
- Mbikëqyrja e kontratave të investimeve të Komuna e Prishtinës 22.
- Nga këto:
 - 6 kontrata janë kontrata kornizë, 3 - 2 vjeçare dhe një vjeçare,
 - 3 projekte janë të ndërprera, që të tri projektet nuk kanë filluar fare, për shkak të çështjeve pronësore,
 - 13 projekte, nga këto 12 të filluara në vitin 2017 dhe 1 në vitin 2018.

Gjithsej vlera e kontratave është: 6,468,495.58 €

MJETE FINANCIARE TË PAGUARA DHE MBETJA PËR PAGESË

Të paguara:	2,908,475.36 €
Mbetje për pagesë:	3,560,020.22 €

90% e projekteve janë në përfundim të kontratës.

Në vazhdim japim detalet e kontratave që janë në mbikëqyrje të këtij sektori:

- Kontratat kornize; shumica nga to janë në përmbyllje të projektit, disa janë në shfrytëzim të 30% mbi vlerën e kontraktuar;
- Kontratat e bartura nga viti paraprak; edhe këto kontrata priten të përfundojnë gjatë muajit maj ose në gjysmën e parë të qershorit;
- Kontratat e këtij viti; është një kontratë e lidhur në këtë vit dhe e njëjta pritet të përfundoj në fund të majit.

- Kontratat e përfunduara.

KONTRATAT KORNIZË

1. "Rregullimi i oborreve dhe terreneve sportive"	
Janë realizuar punime në : SHFMU" Nexhmi Mustafa " Besi SHFMU "Iliria"	
Vlera e projektit:	511,933.50€ për tri vite
Nr i kontratës dhe data.	616 16 096 511 dt. 04.08.2016
Operatori ekonomik:	"NBT-ING" dhe NPN "Alfa-Ing" shpk, Suhareka
Te paguara	506,503.13 €
FOTOT E EKZEKUTIMIT TË PUNIMEVE	
"Nexhmi Mustafa" Besi	
	
	
SHFMU "Iliria"	






2. "Rikonstruimi dhe mirëmbajtja e nyjave sanitare "kontrate kornize 3 vjeçare"

Është intervenuar në këto objekte :

- SHM "DR. ALI SOKOLI"
- SHM "PRENK SOKLI"
- IP "Dielli"
- SHFMU "HILMI RAKOVICA"
- SHFMU " DARDANIA"
- SHM " XHEVDET DODA"

Vlera e projektit:	349,989.00€ për tri vjet (+ 30%)
Nr i kontratës dhe data.	616 16 023 521 dt. 19.04.2016
Operatori ekonomik	NNP "EURO CONSTRUCTION" shpk
Të paguara deri më tani	417,235.98 €
Fotot e ekzekutimit të punimeve	
Shkolla e muzikës "Prenk Jakova"	

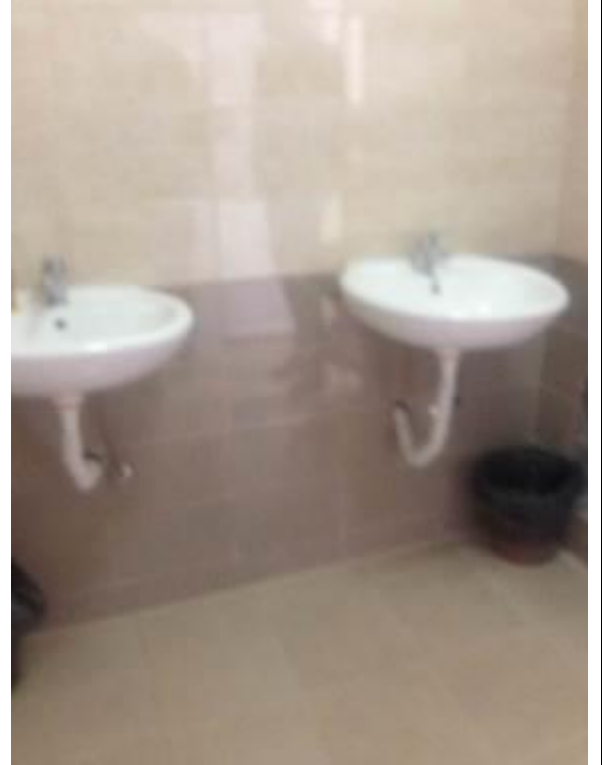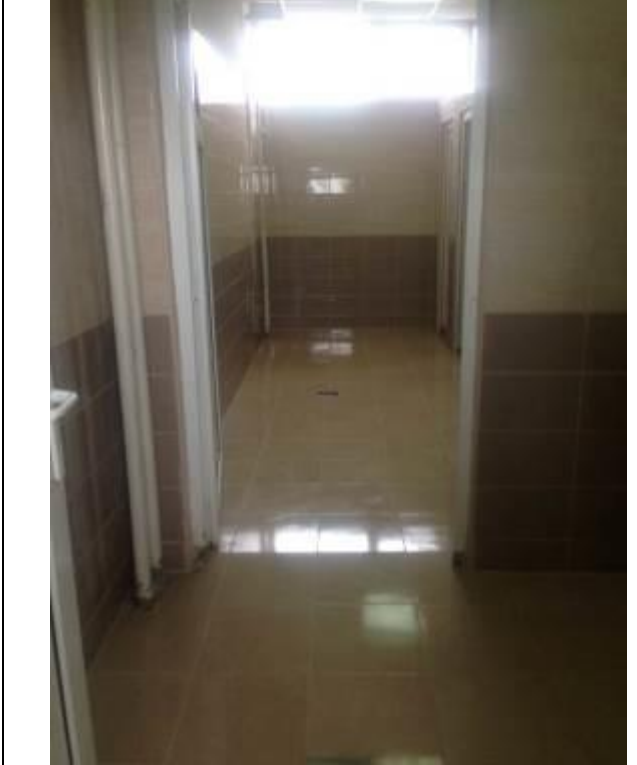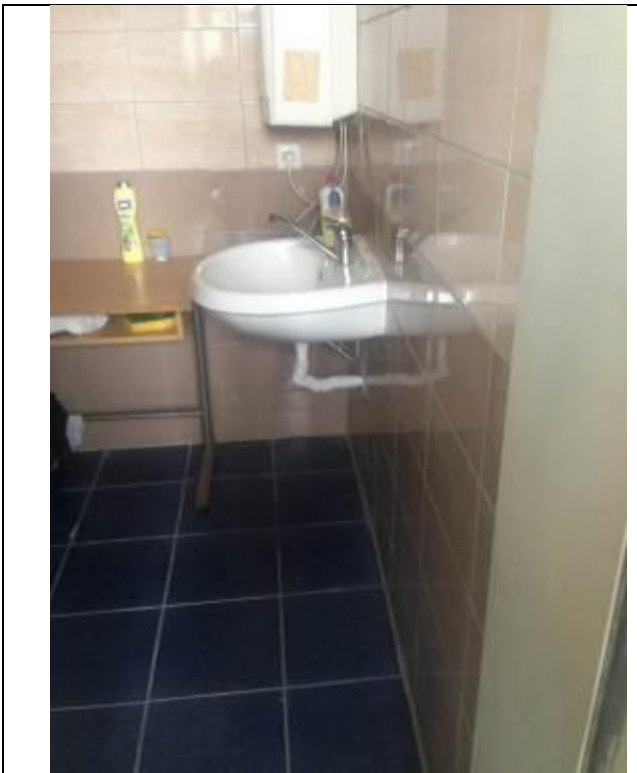





"Ismail Qemali" Prishtina









3. "Rikonstruktimi dhe mirëmbajtja e kulmeve të disa shkollave"	
Punimet e realizuara deri më tani me këtë kontratë: Nuk ka pasur aktivitet gjatë këtij muaji	
Vlera e projektit:	233,454.00 €, të paguara deri më tani 142,875.43 €, mbetja për 2018 90,578.57 €
Nr. i kontratës dhe data.	616-16-052-521, dt. 06.07.2016



4. *“Mirëmbajtja e elektrikës në shkollë”, kontratë kornizë 3-vjeçare*

Gjatë muajit nëntor, me kontratën “Mirëmbajtja e elektrikës në shkollë”, është intervenuar në këto institucione:

1. Shkolla fillore “Filip Shiroka”- Slivovë dhe Llajshevc

<ol style="list-style-type: none"> 2. Kuzhina Qendrore 3. IP "Gëzimi ynë" 4. IP "Fatosat" 5. Shkolla fillore "Pavarësia" 6. Gjinnazi "Xhevdet Doda" 7. 	
Nr. i kontratës dhe data:	nr. 616 16 099 211 dt. 02.09.2016.
Vlera e projektit:	63,228.30€ për tri vjet (21,076.10 € për një vit)
Operatori ekonomik:	"Light and More" & "Monting"
Të paguara deri më tani:	39,546.65 €
Fotot e ekzekutimit të punimeve	
<p>SHFMU "Filip Shiroka"</p> 	
	<p>Kuzhina qendrore</p> 

5. "Renovime, përmirësime të infrastrukturës së objekteve shëndetësore"	
Vlera e projektit:	264,043.60 €
Nr i kontratës dhe data.	616 16 177 521, dt. 21.04.2017
Të paguara deri më tani:	290,032.25 € 10% mbi kontratë
Operatori ekonomik:	NTP "Ulpiana" dhe "Mati" Shpk

Fotot e ekzekutimit të punimeve

QMF 3









Emergenca QKUK







Ambulanca Dabishevc



6. "Mirëmbajtja e ngrohjeve qendrore në shkollat dhe institucionet tjera komunale"	
Vlera e projektit:	100.000,0€
Nr i kontratës dhe data	616 17 128 221, dt.15.11.2017
Operatori ekonomik	"Raketa" SHPK
Të paguara deri më tani	88,536.76 €
Plani dinamik	Një vit
Foto nga tereni:	
	
Bibloteka "Hivzi Sulejmani" Prishtinë	IP "Dielli" Prishtinë
Komuna e re	
	
	SSHML "Gjin Gazuli" Prishtinë

SHFMU "Nazim Gafurri" Prishtinë	SHFMU "Rilindja" Prishtinë
	


KONTRATAT QË VAZHDOJNË NGA VITET PARAPRAKE

1. "Ndërtimi i objektit të IP "Kodra e Trimave"	
Vlera e projektit:	498,468.27 euro, deri më tani janë paguar 394,683.00€
Nr. i kontratës dhe data.	616 15 123 521, dt 16 09 2015
Mbetja për vitin 2018	
Të pagura deri më tani	394,683.00 €
<p style="text-align: center;">Projekti ka probleme me mospërputhje në mes të projektit dhe paramasës, si dhe mungesa e disa pozicioneve</p>	
Gjatë këtij muaji nuk janë zhvilluar aktivitete	
	
	





2. "Rikonstruktimi i çerdhes në lagjen "Tophane""	
Vlera e projektit:	60,683.05€
Nr. i kontratës dhe data.	61616136521, dt. 19.10.2016
Operatori ekonomik:	"Tribuna " SHPK
Të paguara deri më tani:	30,000.00€ (10.000,00 është faturuar, por ende nuk është paguar)
Fotot e ekzekutimit të punimeve	
Gjatë këtij muaji nuk janë zhvilluar aktivitete	
<p>Nuk kemi zhvillime të punimeve, jemi në procedurë të ndërprerjes së kontratës. Pas shume ftesave dhe kërkesave qe OE "Tribuna" të vazhdojë me punime, nuk është marrë asnjë nismë e punimeve. Disa nga punimet e zhvilluara nuk janë punuar në mënyrë cilësore dhe disa punime tjera duhet të sanohen.</p>	

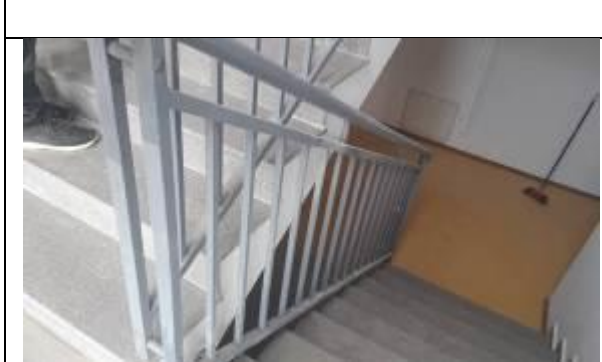3. "Ndërtimi i shkollës fillore në lagjen „Arbëria" faza II"	
Vlera e projektit:	737832.96 €
Të paguara deri më tani:	650.000,00 €
Operatori ekonomik:	"Rexha" shpk
Barten për vitin 2018	87,832.96 €
	Punimet janë në përfundim
Fotot e ekzekutimit të punimeve	






4. "Ndërtimi i sallës së edukatës fizike dhe rekonstruimi i objektit të SHF "Eqrem Çabej" (aktualisht shkolla "7 Shtatori")	
Vlera e projektit:	220,032.61 €
Nr i kontratës dhe data.	616 14 076 521, dt. 29.10.2014
Të paguara 2017	156836.99€, kanë mbetur për vitin 2018 63.195.62 €
Fotot e ekzekutimit të punimeve	
Ndërtimi i sallës së edukatës fizike në Barilevë. Vazhdimi i Kontratës nr. 616 14 076 521, e dt. 29.10.2014 "Ndërtimi i sallës së edukatës fizike dhe rekonstrimi i objektit të SHF „Eqrem Çabej”.	
	



5. <i>Mirëmbajtja e terreneve sportive, Komuna e Prishtinës, Loto 1, dhe këndeve të lodrave dhe Loto 2</i>	
Punimet e realizuara deri më tani me këtë kontratë: Nuk ka pasur aktivitet gjate këtij muaji	
Vlera e projektit:	Lloto 1: 41,128.00 € Lloto 2: 29,893.40 €
Nr i kontratës dhe data.	616-16-180-521
Operatori ekonomik	" V.Z Company" SHPK
Të paguara deri më tani:	Loto 1: 9,229.04 € Loto 2: 9,710.00 €
Fotot nga ekzekutimi i punimeve	
Terreni sportiv, te Qafa	


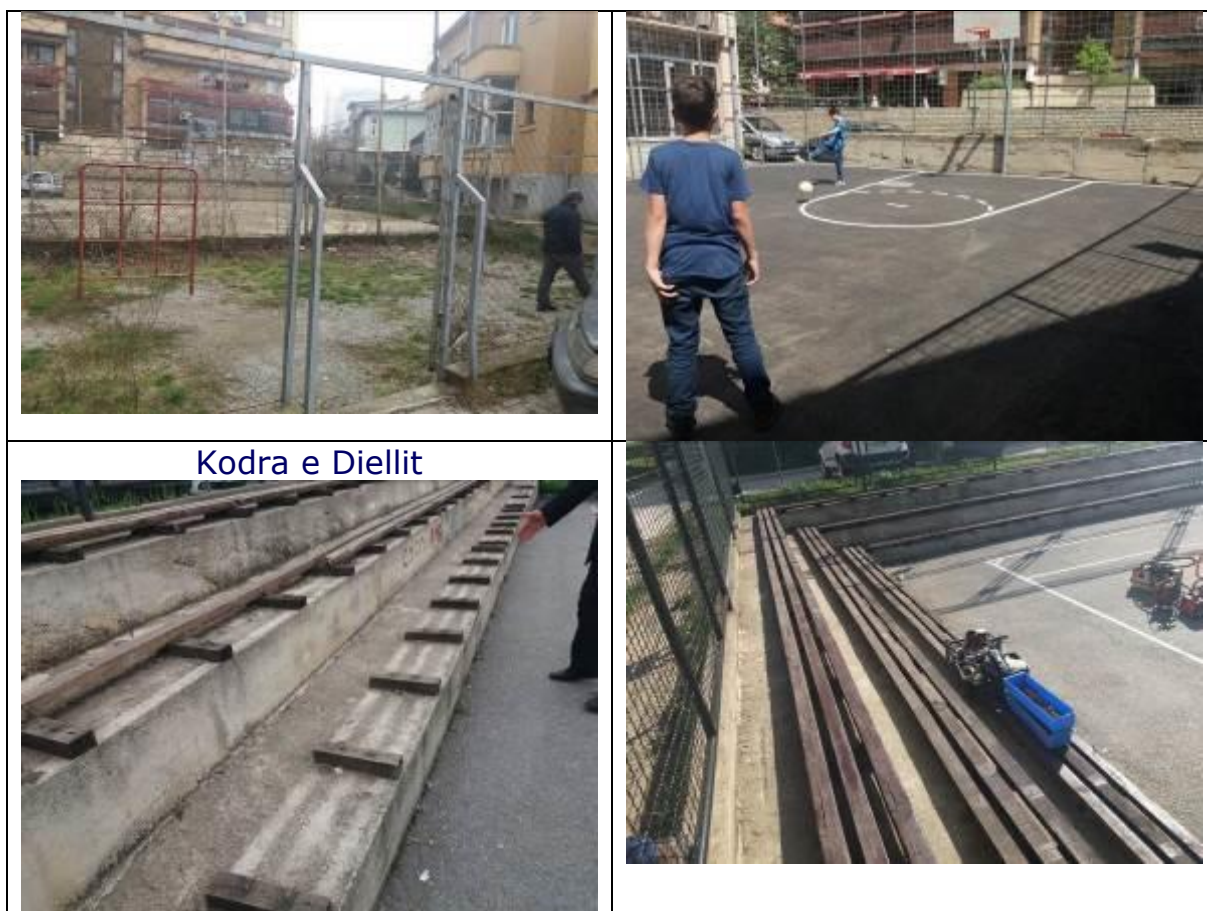


Kodra e Diellit


6. "Riparimi i bashkësive lokale, zona urbane (Dabishec, Keqekollë, Llukar)"	
Vlera e projektit:	57.206,61€ 72.275,36€
Nr i kontratës dhe data.	616-17-3326-5-2-1 dt.03.10.2017
Investuesi	Komuna e Prishtinës
Plani dinamik	90 ditë
Operatori ekonomik	"Acon" SHPK
Të paguara deri më tani:	20.000,00 €
Gjendja e punimeve	Punimet janë në përfundim.
Fotot nga realizimi	

Dabishevc



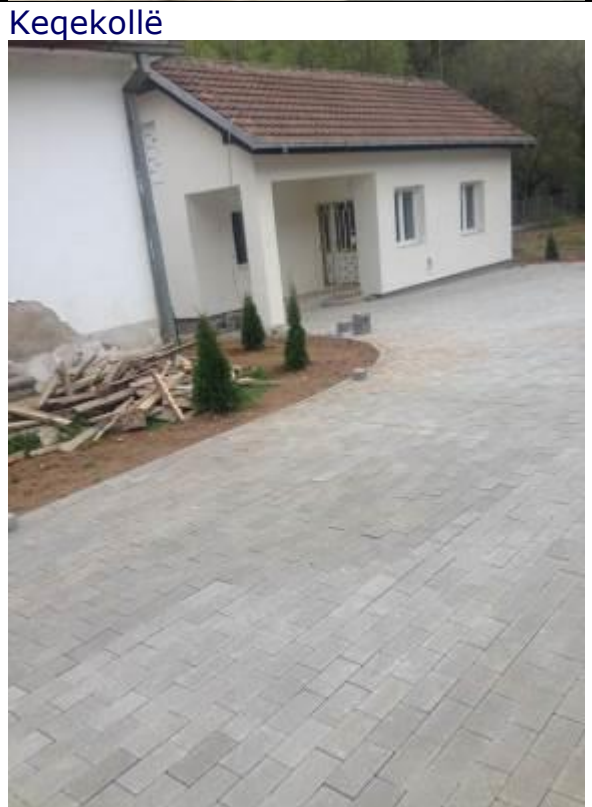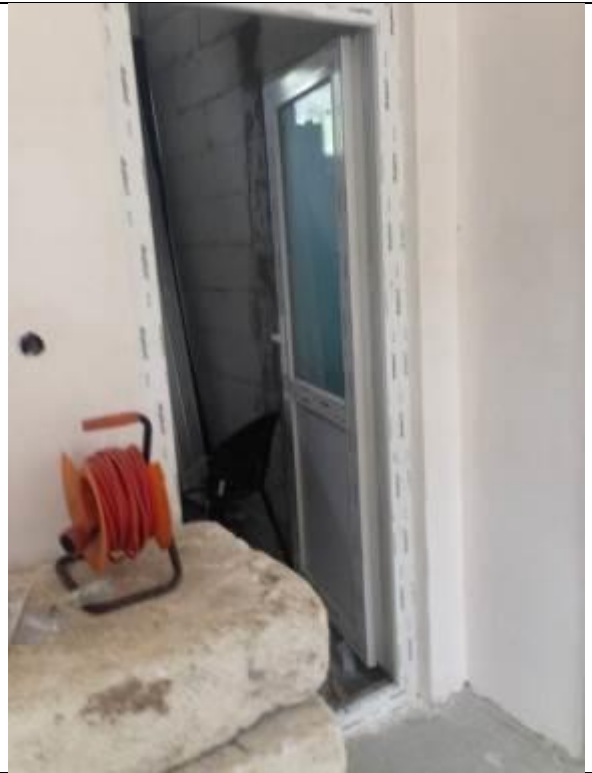

Kegekollë

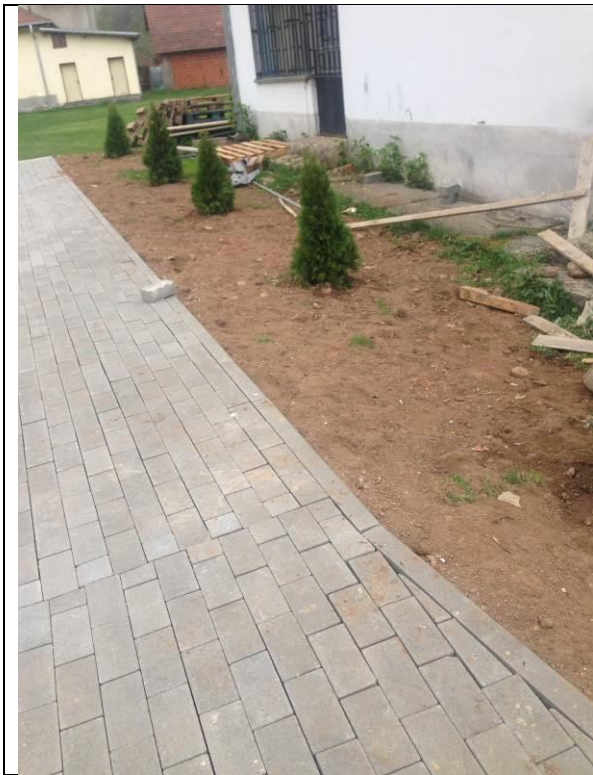


7. Riparimi i bashkësive lokale, zona urbane (Barilevë, Besi)	
Vlera e projektit:	57.206,61€
Nr i kontratës dhe data.	616-17-3326-5-2-1, dt.03.10.2017
Operatori ekonomik	"Acon" SHPK dhe "Arhingo" SHPK
Të paguara deri më tani	20.000,0 euro
Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara	
Gjatë këtij muaji nuk janë zhvilluar aktivitete	
Besi	
	
	

8. "Riparimi i bashkësive lokale, zona urbane (Hajvali, Shkabaj, Prugovc)"	
Vlera e projektit:	96.685.55€
Nr. i kontratës dhe data.	616-17-3326-5-2-1 dt.03.10.2017
Të paguara deri më tani	38997.01 €
Plani dinamik	90dite
Operatori ekonomik	"Acon" SHPK
Punimet kanë përfunduar, ka mbet procedurat e pranimit-dorëzimit të punimeve dhe pagesa e situacionit përfundimtar	
9. "Riparimi i bashkësive lokale zona urbane (BL "Lakërishta", BL "Dardania", BL "Bregu i Diellit"	
Vlera e projektit:	41.819,57€
Nr i kontratës dhe data.	616-17-3326-5-2-1 dt.03.10.2017
Të paguara deri më tani	41,618.56 €
Plani dinamik	90 dite
Operatori ekonomik	"ENGRUP" shpk
Punimet kanë përfunduar, është mbyllur kontrata	

10. "Riparimi i bashkësive lokale, zona urbane (BL Nr.10, BL "Tophane" , BL te Xhamia e Llapit"	
Vlera e projektit:	41.723,72€
Nr. i kontratës dhe data.	616-17-3326-5-2-1 dt.04.10.2017
Vlera e paguar deri më tani	20,000.00 €
Plani dinamik	90dite
Operatori ekonomik	"TRIBUNE" shpk
Foto gjatë ekzekutimit të punimeve	
BL e 10 dhe ajo në "Tophane" janë dorëzuar, aty është duke u punuar, kurse kanë filluar punimet në BL te Xhamia e Llapit. Aty është duke u punuar , punët e demolimit janë përfunduar dhe kanë filluar punët tjera sipas përshkrimit.	



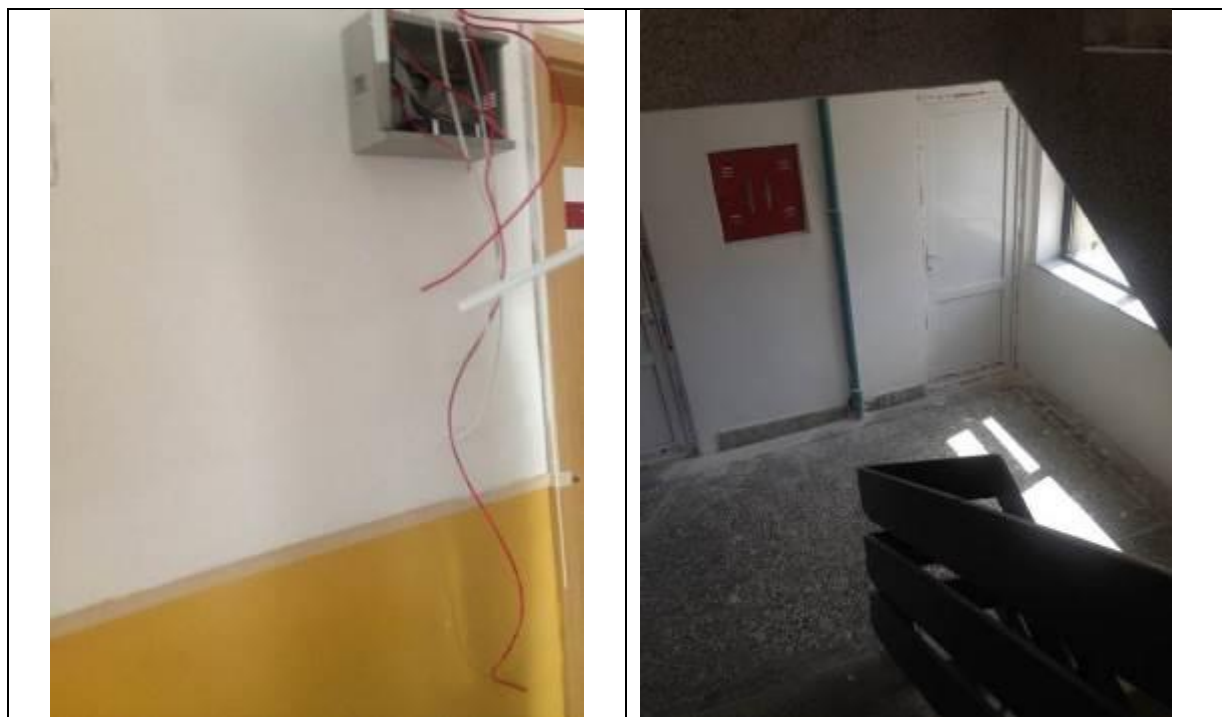

11. <i>“Vendosja e rrjetave në dritare të çerdheve për mbrojtjen nga insektet dhe disa renovime të objekteve të institucioneve parashkollore”</i>	
Vlera e projektit:	34.999.00€
Nr. i kontratës dhe data.	616-17 -056-5-2-1 dt. 27.09.2017
Vlera e paguar deri më tani	20,000.00 €
Plani dinamik	90 dite
Operatori ekonomik	“ BEREQETI – ING”
Foto gjatë ekzekutimit të punimeve	
IP“ Ardhëmeria”	IP “Fatosat”



IP "Buzqeshja"



12. "Instalimi i ngrohjes qendrorene në shkollat "Avni Rrustemi" Suteskë, "Ganimete Terbeshi" Siqevë, "Ditët e Minatorit" Shashkoc, "Nexhmi Mustafa" Rimanishtë

Punimet e realizuara deri më tani me këtë kontratë:
Nuk ka pasur aktivitet gjatë këtij muaji

Vlera e projektit:

42,658.65 €

Nr i kontratës dhe data.	616 17 145 521 dt 21.02.2018
Operatori ekonomik	"Termovizion " SHPK
Të paguara deri më tani:	

13. Riparimi i bashkësive lokale, zona urbane (Bardhosh, Mramor, Koliq)

Vlera e projektit:	92.846,76€
Nr. i kontratës dhe data.	616—17-4525-5-2-1 dt.12.12.2017
Investuesi	Komuna e Prishtinës
Plani dinamik	90 ditë
Operatori ekonomik	Grupi i operatorëve "ACON" SHPK dhe NPN "Alfa-Ing" SHPK
Të paguara deri më tani:	

Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara

Vlerësimi i progresit në projekt	Fillimi i punimeve
----------------------------------	--------------------

Foto gjatë ekzekutimit të punimeve

KOLIQ





BARDHOSH





MRAMOR



PROJEKTET E NDËRPRERA DHE TË PAFILLUARA

1. Ndërtimi i shkollës fillore në lagjen “Mati 1”, vlera e projektit është 1,458,452.95 €, nr. id. 61615061511, dt. 23.07.2015, punimet nuk kanë filluar.
2. Ndërtimi i sallës së edukatës fizike, shkolla “Shtjefën Gjeqovi”, vlera e projektit është : 238,564.24 €, nr. id 616 15 156 521, dt. 22.10.2015, punimet janë ndërprerë për shkak të pronës.
3. Ndërtimi i shkollës në lagjen “Kalabria”, vlera e projektit është 1,458,452.95 €; nr. id. 61615135511, dt. 30.10.2015, punimet nuk kanë fillua për shkak të çështjeve pronësore.

✓ KERKESAT E SEKTORIT

Kërkesa shumë të nevojshme:

- Sigurimi i pajisjeve për sigurinë e stafit në punishte (helmëta, këpucë, syze etj.);
- Plotësim të stafit me inxhinierë të elektrosë;
- Trajnime të stafit për menaxhim të projekteve-kontratave;
- Marrja pjesë në panairët e ndërtimit, me qëllim të njohimit me materialet e reja të ndërtimit;
- Server për tërë drejtorinë, min 10 Tera bajt;
- Sigurimi i pajisjeve mobile për:
 - a. matjen e lagështisë së betonit,
 - b. matjen e lagështisë së drurit,
 - c. fortësisë së betonit,
 - d. kalueshmërinë e nxehtësisë-temperaturës,
 - e. kamerë termike,
 - f. matjen e glykolit,
 - g. matjen e temperaturës së ujit dhe
 - h. 5 metra laserike, me gjatësi matëse deri 50 m.

Drejtori:
Gëzim Mehmeti

Prishtinë, prill 2018
