

Raporti i vitit 2018 Shtator 01.-30.09.2018

1. Drejtoria e Investimeve Kapitale dhe Menaxhimit të Kontratave

Drejtoria e Investimeve Kapitale dhe Menaxhimit të Kontratave gjatë muajit shtator 2018, ka kryer këto aktivitete: kërkesat për hartimin e detyrave projektuese dhe identifikimin e nevojave, shqyrtimi i kërkesave të banorëve të bashkësive lokale dhe inkuorporimi i tyre në planet e Komunës, njoftimi me kohë i kompanive publike dhe subjekteve relevante, me qëllim të koordinimit të punëve, incizimi i gjendjes ekzistuese të infrastrukturës në qytetin e Prishtinës, si dhe kompletimi i dokumentacionit teknik për procedimin e tyre në organet kompetente, mbikëqyrja e realizimit të projekteve konform marrëveshjes etj.

1.1. Shqyrtimi i kërkesave

Gjatë muajit shtator 2018, Drejtoria ka proceduar 174 kërkesa të ndryshme të bashkësive lokale dhe banorëve: për ndërtimin e rrugëve, trotuareve dhe kanalizimeve, kërkesa për rregullimin e rrugëve dhe kanalizimeve, kërkesa nga kompanitë publike - leje për gropim dhe intervenime për sanimin e defekteve të ndryshme, kërkesa nga kompanitë për formime të komisioneve për kontrollimin e punëve, kërkesa të natyrave të ndryshme rreth definimit të zgjidhjes në terren etj. Nga numri i përgjithshëm prej 174 kërkesave të pranuar, 70 janë zgjidhur.


1.2. Dërgimi i kërkesave për hartimin e detyrave projektuese dhe Identifikimin e nevojave

Duke marrë për bazë Ligjin mbi planifikimin hapësinorë, Ligjin mbi ndërtimin e objekteve investive, si dhe ligjin për projektim, e në veçanti planet rregulluese, janë dërguar kërkesat për hartimin e detyrave projektuese për këto rrugë në zonat urbane dhe rurale.




1.3. Raportimi i menaxherëve të projekteve infrastrukturore

Drejtoria	Drejtoria e Investimeve Kapitale dhe Menaxhimit të Kontratave
Sektori	Menaxhimi i kontratave (Ndërtimi i ulët)
Drejtori	Gëzim Mehmeti
Raportoi	Dukagjin Buçaj, idn., u.d.i shefit të Sektorit
Kontrolloi – Përpunoi	Muhamed Emra, idn., zyrtar i lartë për ndërtim urban
Periudha raportuese	01- 30.09.2018, muaji shtator 2018
Menaxhëret e projekteve	Ibrahim Gervalla Muhamed Emra Afërdita Hasimi Zyhrie Pllana Krenar Xhaferi Fevzi Jetullahu Irfete Zejneli Fatmir Uka Halil Fejziu Imer Mavriqi Suzana Pllana Refik Sadiku Qazim Bajrami
Organi mbikëqyrës	Azem Buzuku Aferdita Sopi Behxhet Gashi Ramadan Nebiu Hazir Krasniqi Amire Krasniqi

 RAPORTI MBIKËQYRËS		SHIFRA 01					
Projekti :	Ndërtimi i disa rrugëve me kubze betoni në Hajvali	Vlera e projektit: 359.351,97 €					
Investuesi :	Komuna e Prishtinës	Plani dinamik 90 ditë					
Operatori :	NTP "REXHA COM"	Nr.616 17 060 521 dt.08,09,2017					
Menaxheri i projektit :	Muhamed Emra, idn ;	Projekti i vitit : 2017					
Organi mbikëqyrës:	Suzana Pllana, idh., Hazir Krasniqi, tek.gjeod.						
Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara							
Vëllimi fizik	Punët e realizuara	<ul style="list-style-type: none"> • Vendosja e kubzeve të betonit në rrugën "Gostivari"; • Vendosja e kubzeve të betonit në rrugën "Kuka"; • Vendosja e kubzeve të betonit në rrugën "krahu 1"; • Vendosja e kubzeve të betonit në rrugën "krahu 2"; • Vendosja e kubzeve të betonit në rrugën "Sherif Vitia"; • Vendosja e kubzeve të betonit në rrugën "krahu 1" (te xhamia); • Vendosja e kubzeve të betonit në rrugën "krahu 2" (te xhamia); • Vendosja e kubzeve të betonit në rrugën "krahu 3" (te xhamia). 					
	Punët në realizim	<ul style="list-style-type: none"> • - Punimi i kanalizimit fekal në rrugën "Rudina"; • - Punimi i kanalizimit fekal në rrugën "Jusuf Berisha"; • - Gërmimi i trupit të rrugës "Sokol Fazliu". 					
Vëllimi financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni (I)	Situacioni (II)	Situacioni (III)	Situacioni (IV)	Situacioni (V)	Situacioni (VI)
		50.000.0	50.000.0	50.000.0	50.000.0	50.000.0	50.000.0
Vonesat Shkalla e cilësisë		--			Mesatar		
Rekomandime, masat për t'u ndërmarrë		<p>Punimet janë duke u zhvilluar sipas planit dinamik, mirëpo do të kemi vonesa të ekzekutimit të punimeve, për shkakë se së pari do të presim realizmin e kontratës "Ndërtimi i kolektorit në Hajvali, lagja Vitali" dhe "Ndërtimi i rrjeteve të kanalizimeve fekale në lagjen "Ulpiane e Re" në Hajvali nga operatori tjetër, pastaj të vazhdojmë ekzekutimin e rrugëve të parapara me kontratë.</p> <p>Kemi ngecje të punimeve nga banorët e fshatit Hajvali, për shkakë se një pjesë e rrugicave nëpër lagje nuk janë përfshirë në këtë projekt dhe domosdoshmerisht këmbngulin që të ndërtohen edhe rrugicat e tyre.</p>					
		Punimet janë duke u zhvilluar në bazë të planit dinamik					



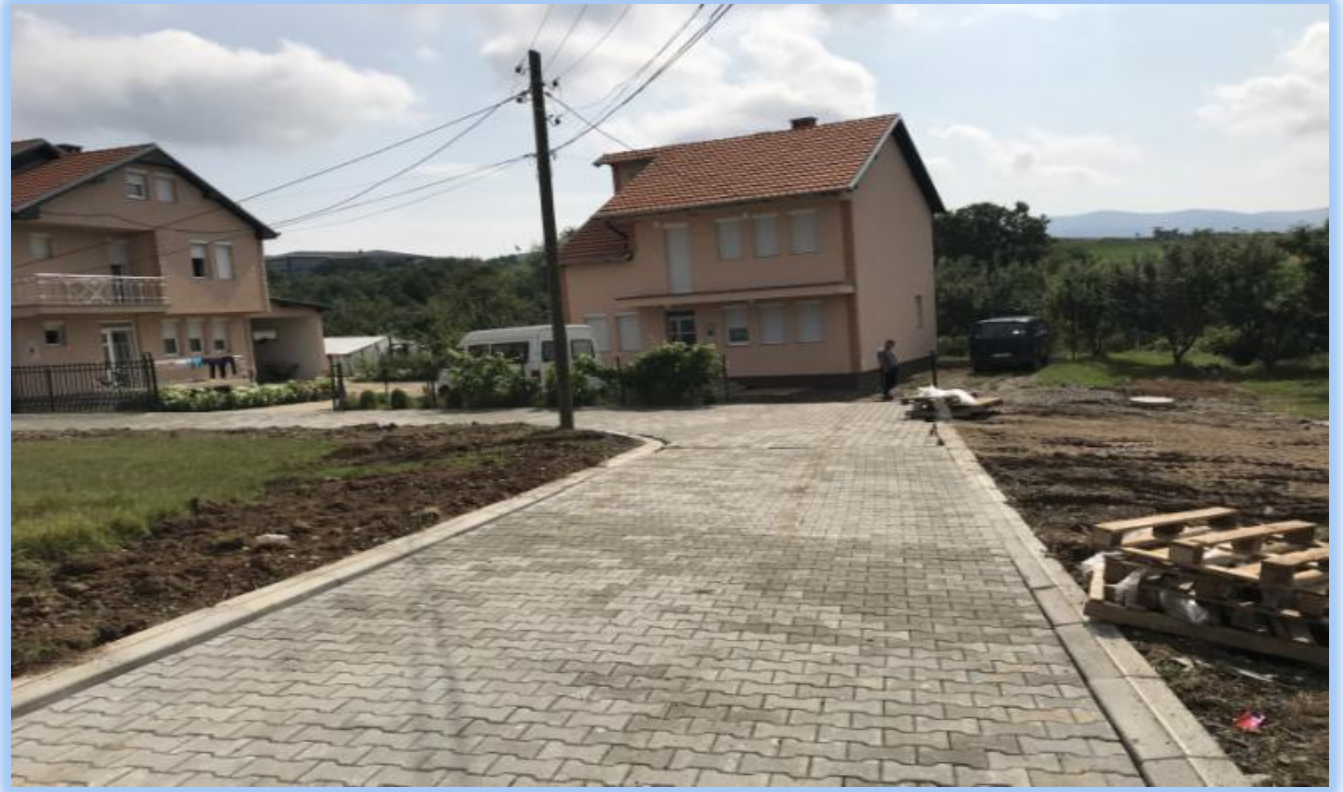

PRISHTINA		RAPORTI MBIKËQYRËS					SHIFRA 02
Projekti :	Ndërtimi i disa rrugëve dhe i kanalizimit fekal dhe atmosferik në krahun e djathtë dhe të majtë të rrugës “Bajram Bahtiri” në Prishtinë					Vlera e projektit: 286.655,32 €	
Investuesi :	Komuna e Prishtinës					Plani dinamik 150 ditë.	
Operatori :	SHPK “Gerlica Company”					Nr.616 17 087 521 dt.02,10,2017	
Menaxheri i projektit :	Muhamed Emra, idn.					Projekti i vitit : 2017	
Organi mbikëqyrës:	Zyhrije Pllana, ida. dhe Azem Buzuku, tek.ndërt.						
Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara							
Vëllimi fizik	Punët e realizuara	- Vendosija e skajoreve betonarme në krahun e rruges nr.6.					
	Punët në realizim	- Vendosija e kubzeve të betonit					
Vëllimi financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni (I)	Situacioni (II)	Situacioni (III)	Situacioni (IV)	Situacioni (V)	Situacioni (VI)
		50.000.0	50.000.0	50.000.0	50.000.0		
Vonesat Shkalla e cilësisë		--			Mesatar		
Rekomandime, masat për t'u ndërmarrë							
Vlerësimi i progresit në projekt		Punimet janë duke u zhvilluar në bazë të planit dinamik.					









PRISHTINA		RAPORTI MBIKËQYRËS					SHIFRA 03
Projekti :	<i>Rindërtimi, sanimi dhe zgjerimi i disa rrugëve sekondare në territorin e komunës së Prishtinës</i>						Vlera e projektit: 247,853.52 €
Investuesi :	Komuna e Prishtinës						Plani dinamik 12 muaj
Operatori :	NTP ” Bashkimi”, NPSH “Bageri”						Nr.616 17 132 521 dt.11,01,2018
Menaxheri i projektit :	Muhamed Emra idn ;						Projekti i vitit : 2018
Organi mbikëqyrës:	Halil Fejziu, idn., Aferdita Sopi, tek. gjeod.						
Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara							
Vëllimi fizik	Punët e realizuara	<ul style="list-style-type: none"> - Gërmimi i trupit të rrugës në fshatin Marec, lagja “Vrajollët”; - Mbushja e trupit të rrugës me material rrethor guror; - Gërmimi i trupit të rrugës në fshatin Marec, lagja “Kllokoqët”; - Mbushja e trupit të rrugës me material rrethor guror. 					
	Punët në realizim						
Vëllimi financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni (I)	Situacioni (II)	Situacioni (III)	Situacioni (IV)	Situacioni (V)	Situacioni (VI)
		11,198.40	20,316.60	50,000.0	18,400.0		
Vonesat Shkalla e cilësisë		-			Mesatar		
Rekomandime, masat për t’u ndërmarrë		<ul style="list-style-type: none"> - Kemi kërkuar nga operatori që të rritë kapacitetin dinamik të punimeve, gjegjësisht hapje në shumë fronte të punishteve në terren. 					
Vlerësimi i progresit në projekt		<ul style="list-style-type: none"> - Kemi kërkuar nga operatori që të rritë kapacitetin dinamik të punimeve, gjegjësisht hapje në shumë fronte të punishteve në terren. 					






















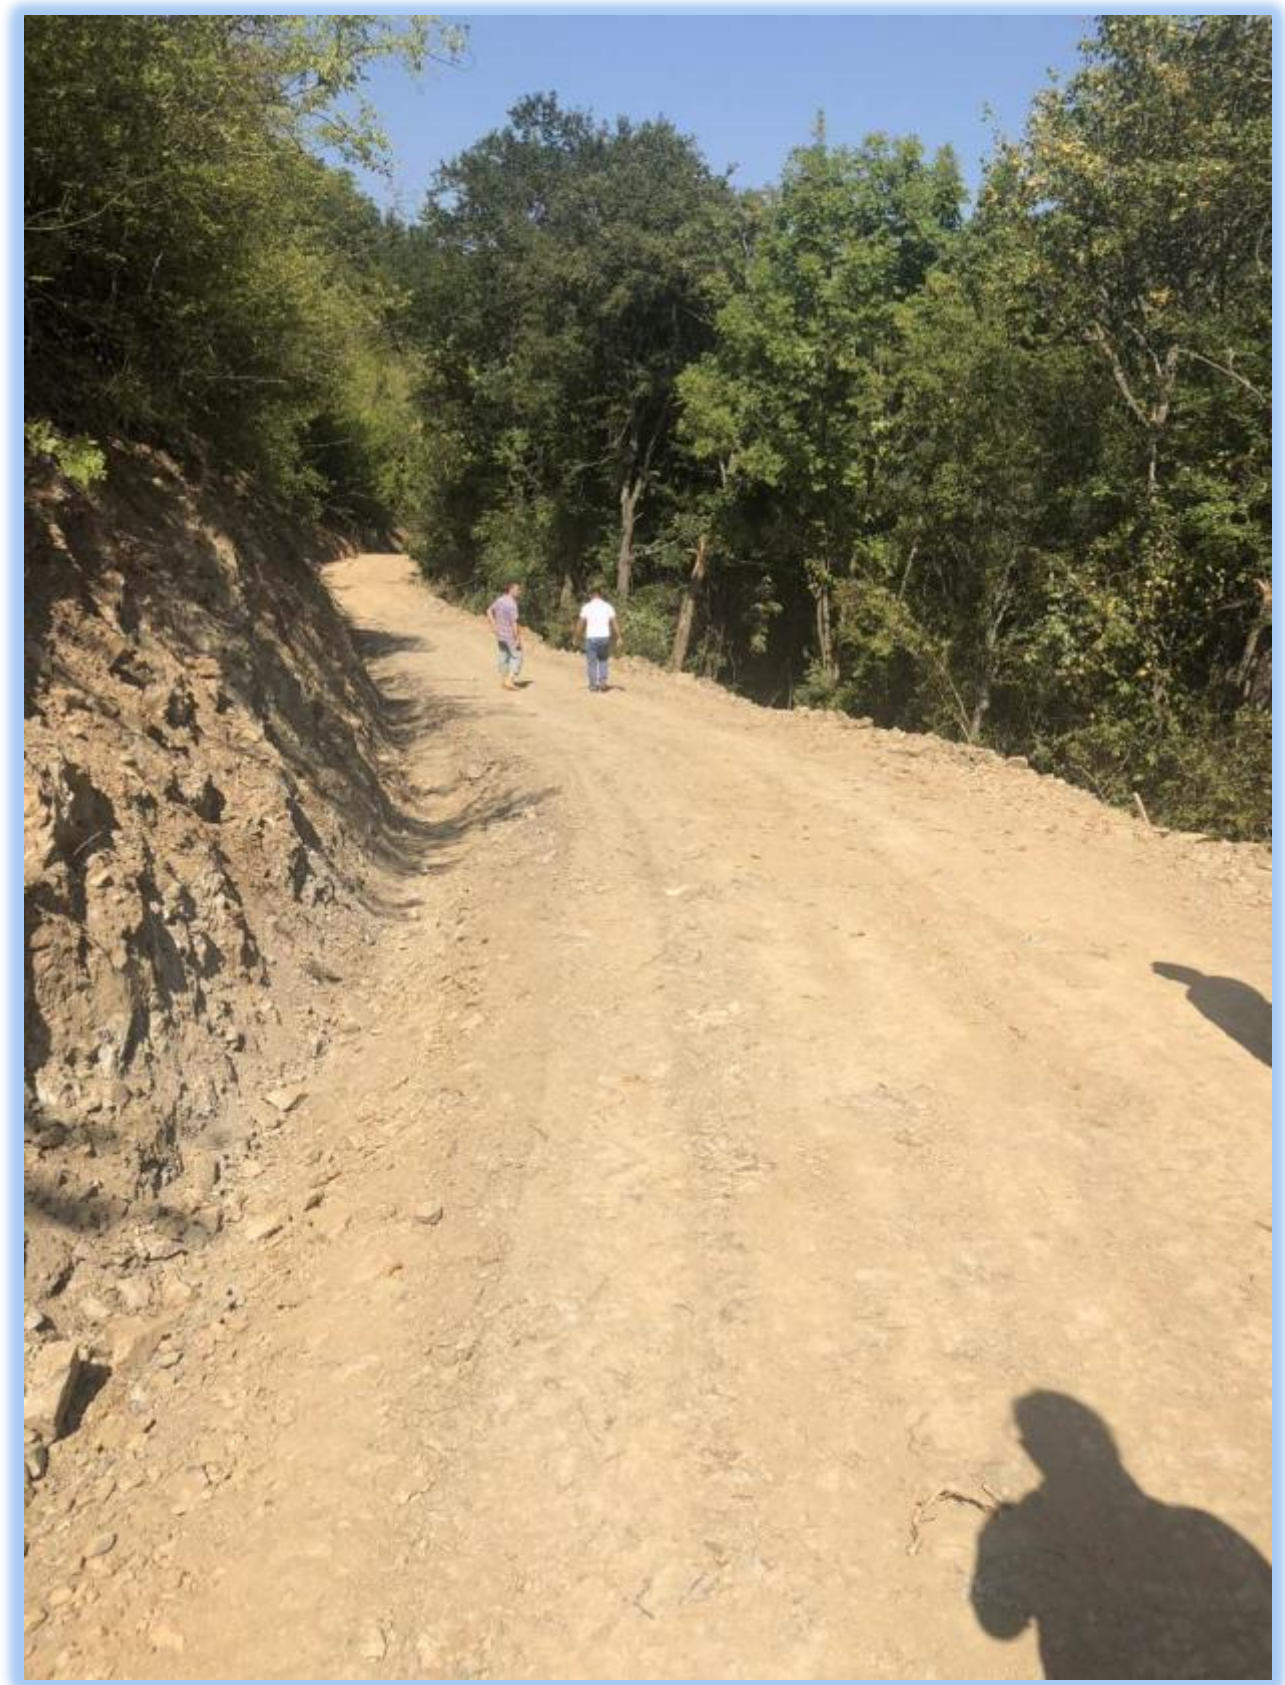










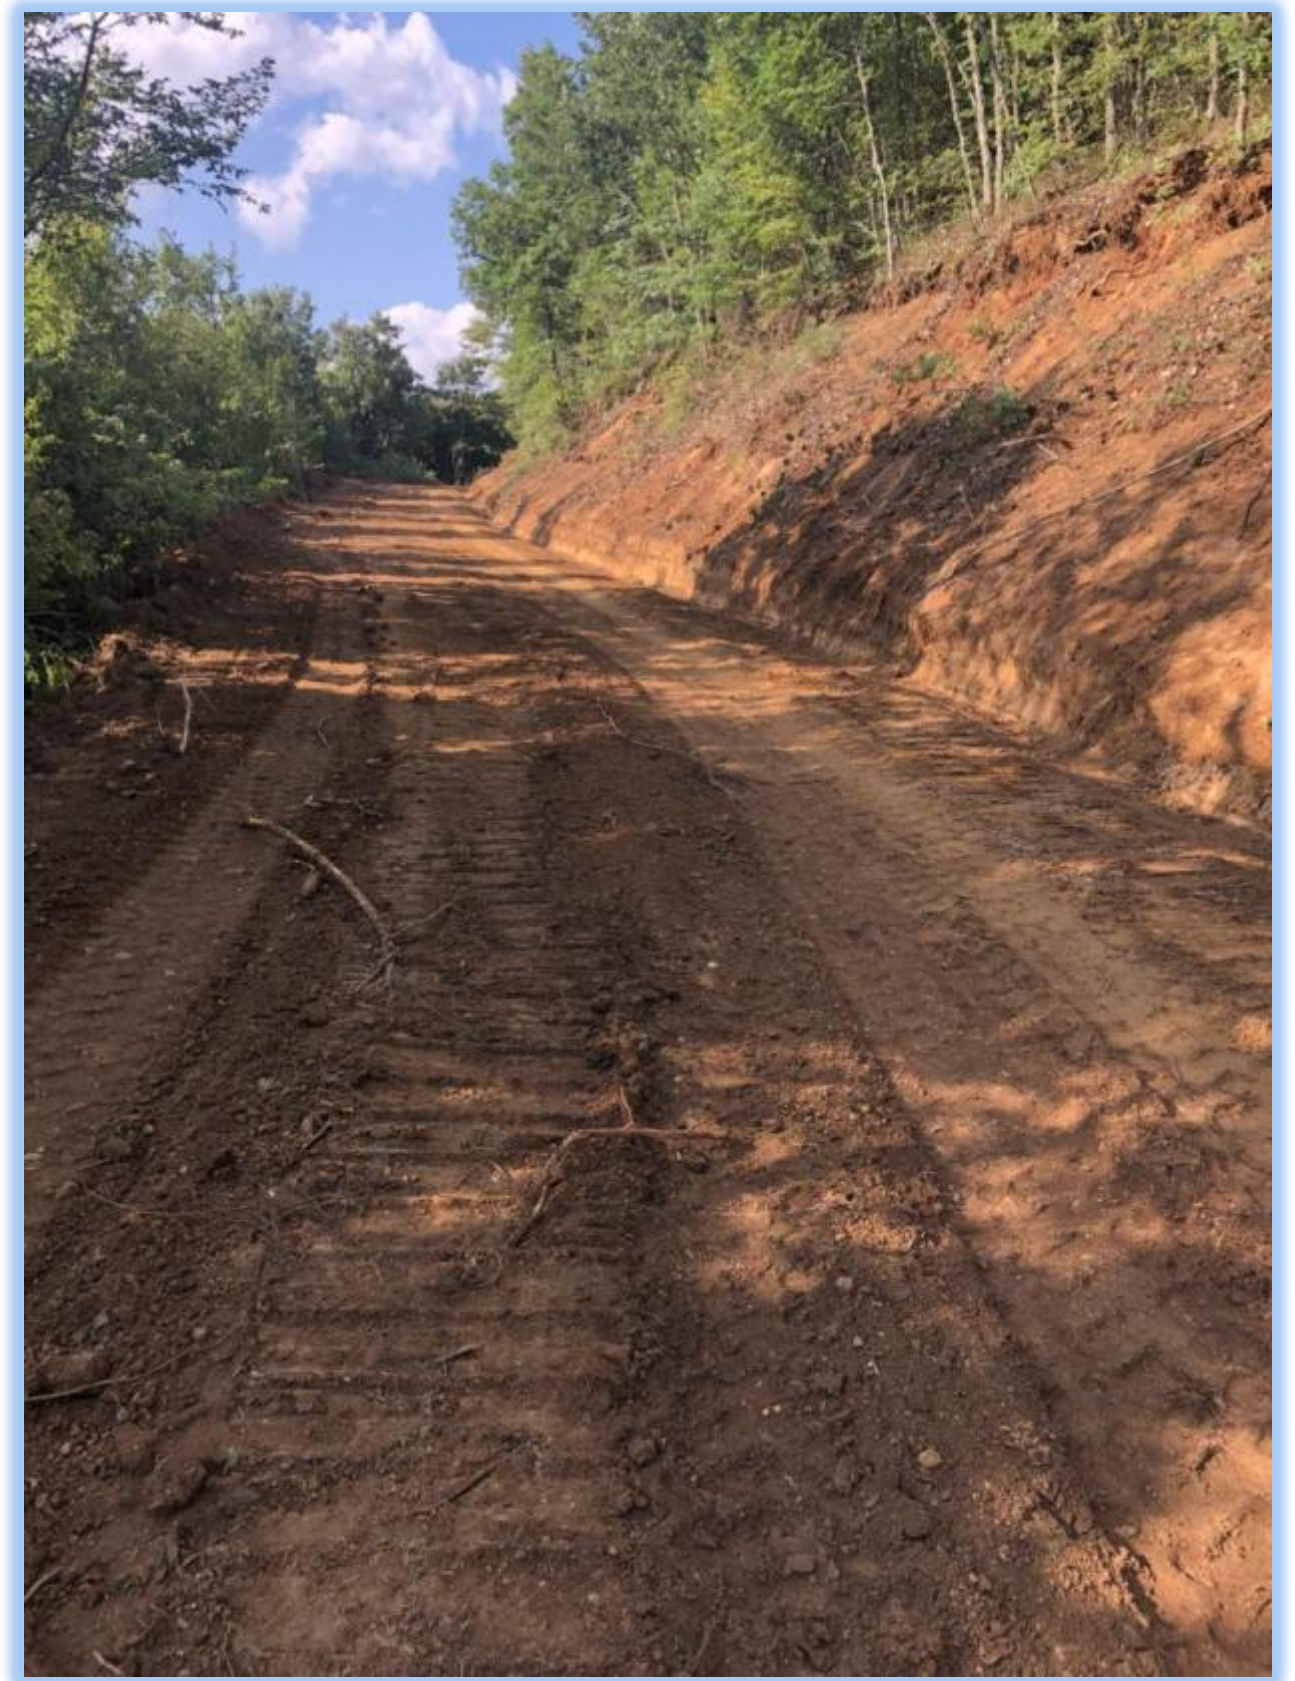












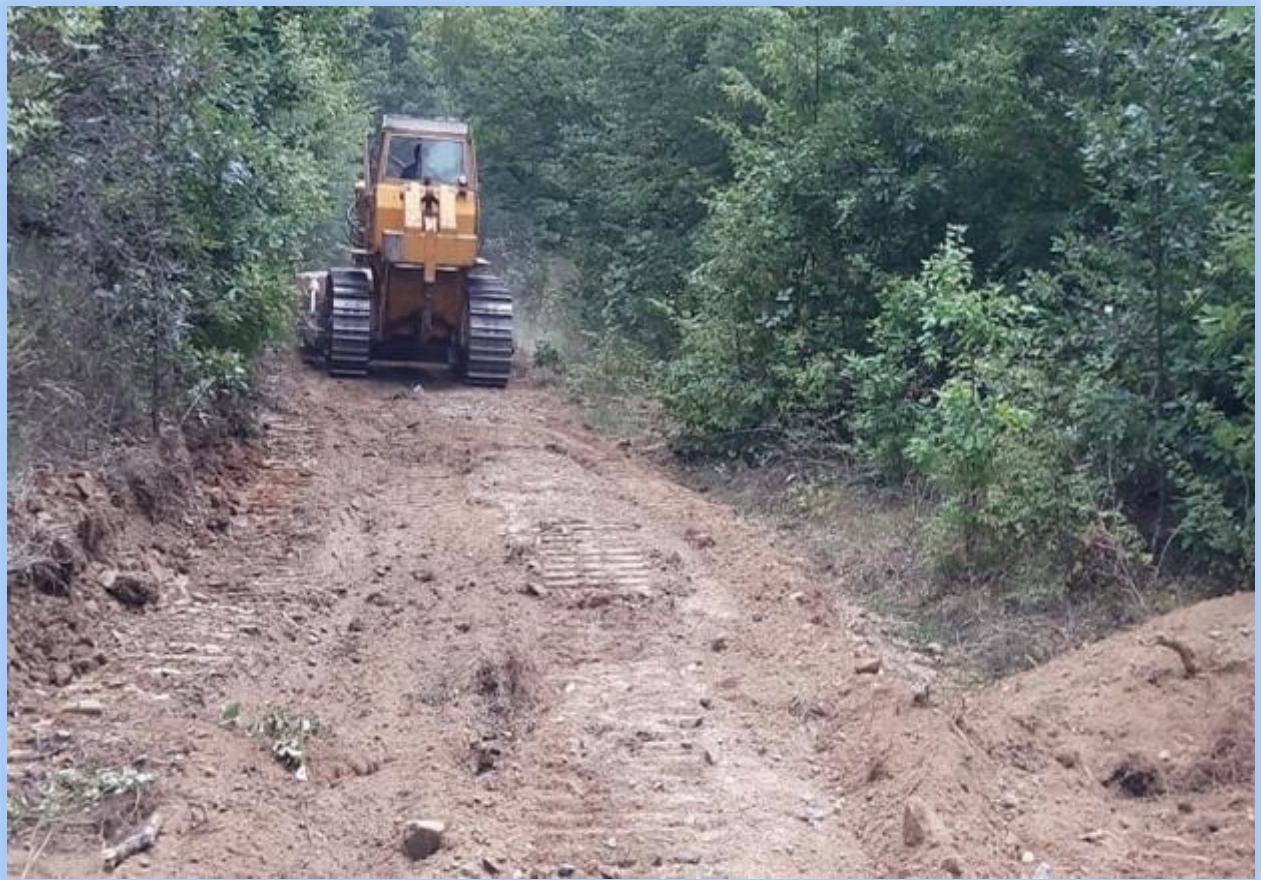



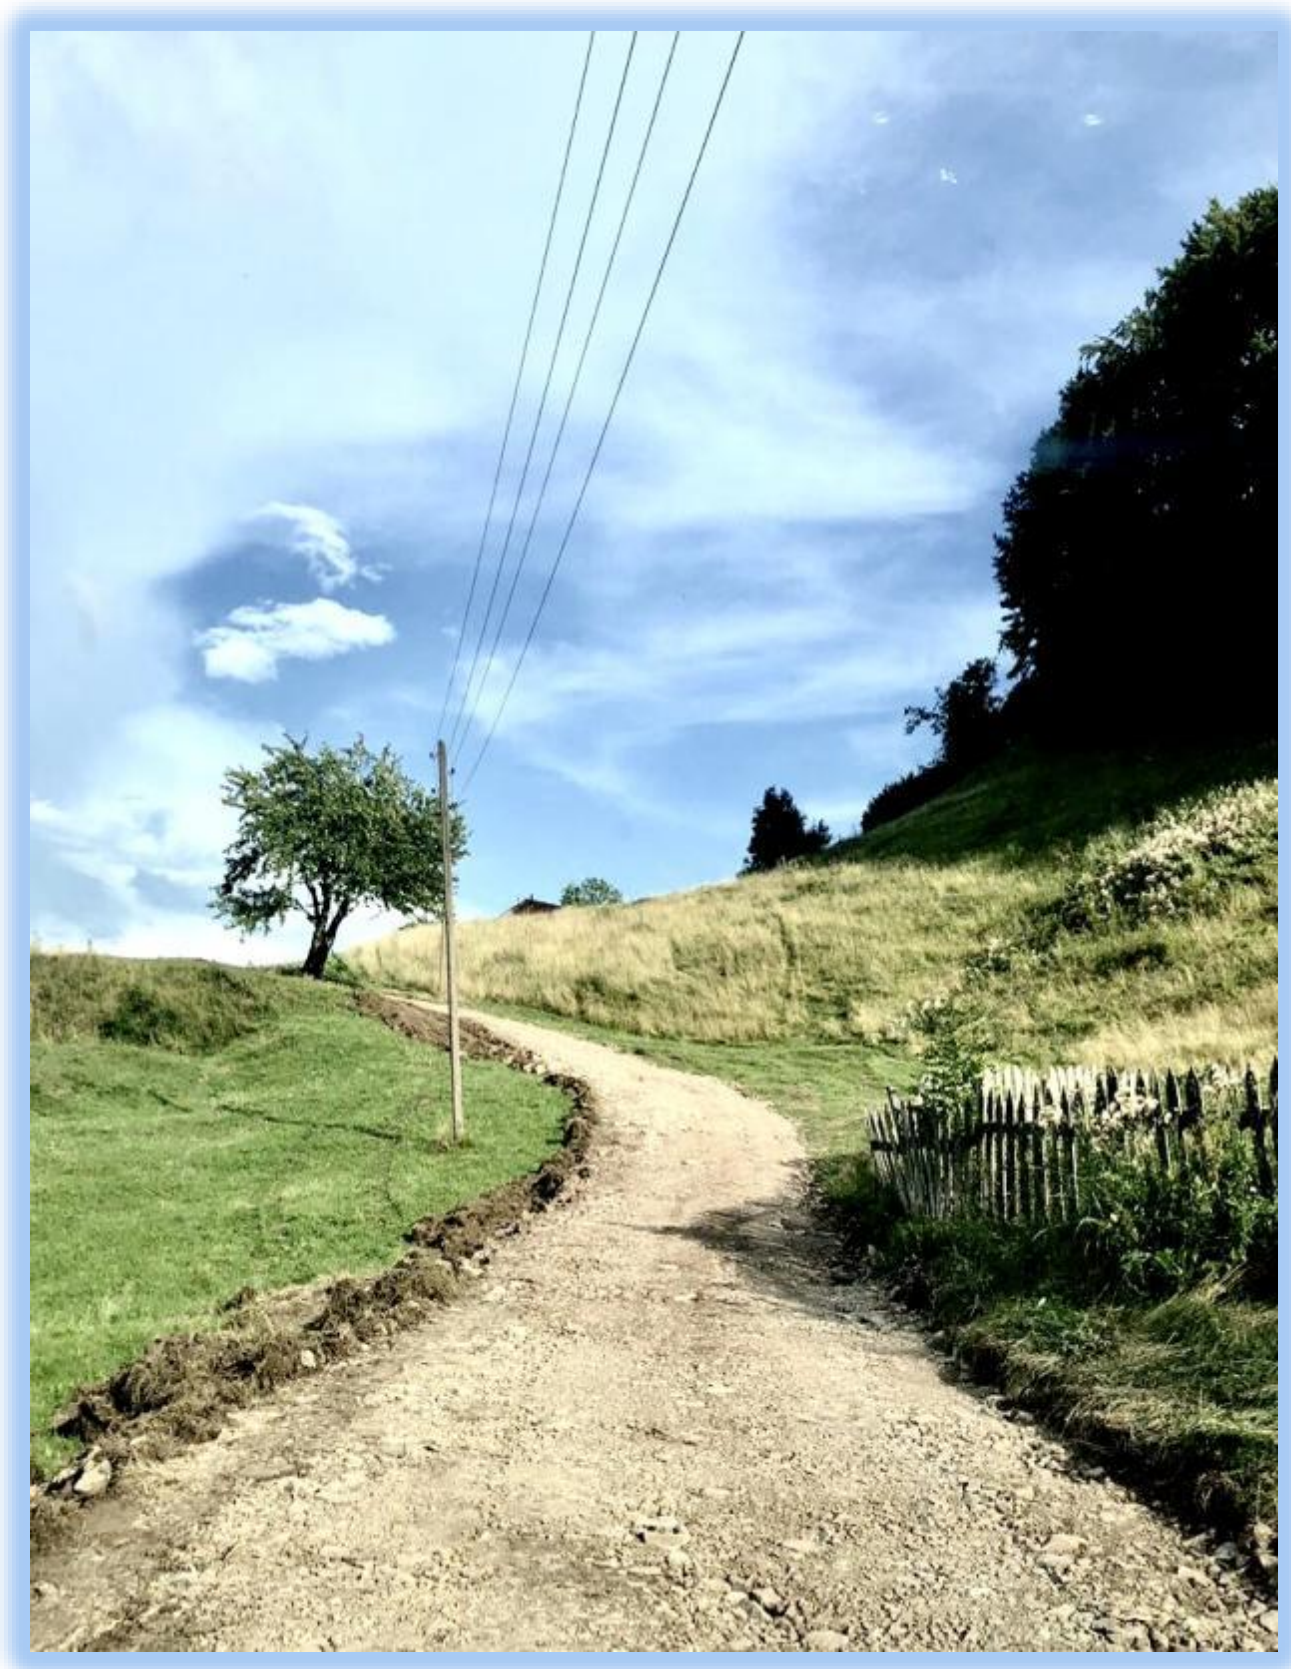



 RAPORTI MBIKËQYRËS		SHIFRA 04					
Projekti :	Ndërtimi i rrugëve dhe kanalizimi fekal te rruga "Ulqini"					Vlera e projektit: 82,625.13 €	
Investuesi :	Komuna e Prishtinës					Plani dinamik : 120 ditë	
Operatori :	NNTP "Gashi ING"					Nr 616 17 144 521 dt. 26.01.2018	
Menaxheri i projektit :	Afërdita Hasimi					Projekti i vitit 2018	
Organi mbikëqyrës :	Syzana Pllana, Ramadan Nebihi						
Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara							
Vëllimi fizik	Punët e realizuara	Zyrtarisht kanë filluar punimet më 19.03.2018.					
	Punët në realizim	Jemi në fazën përfundimtare të kontratës, duke bërë kubëzimin e rrugëve.					
Vëllimi financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni Aneks Kontratë (I)	Situacioni Kontrate (I)	Situacioni (II)	Situacioni (III)	Situacioni (IV)	Situacioni (V)
		8,262.51€	50,000.00€	0.0€	0.0€	0.0€	0.0€
	Situacioni (VI)	Situacioni (VII)	Situacioni (VIII)	Situacioni (IX)	Situacioni (X)	Situacioni (XI)	
Vonesat Shkalla e cilësisë	Brenda planit dinamik			Mesatar			
Rekomandime, masat për t'u ndërmarrë							
Vlerësimi i progresit në projekt							

*Foto gjatë ekzekutimit të punimeve

 RAPORTI MBIKËQYRËS		SHIFRA 05					
Projekti :	Ndërtimi i disa rrugëve në fshatin Trudë	Vlera e projektit: 375,501.30 €					
Investuesi :	Komuna e Prishtinës	Plani dinamik : 90 ditë					
Operatori :	OE ” Pro & Co Group” SHPK	Nr 616 17 142 521 dt. 27.02.2018					
Menaxheri i projektit :	Afërdita Hasimi	Projekti i vitit 2018					
Organi mbikëqyrës :	Krenar Xhaferi, Ramadan Nebihi						
Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara							
Vëllimi fizik	Punët e realizuara	Zyrtarisht kanë filluar punimet më 19.03.2018.					
	Punët në realizim	Jemi duke punuar në disa rrugë me kubze betoni, sipas paramasës, si dhe rrugën “Sanxhaku i Nishit” sipas projektit.					
Vëllimi financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni (I)	Situacioni (II)	Situacioni (III)	Situacioni (IV)	Situacioni (V)	Situacioni (VI)
		150,000.00€	0.0€	0.0€	0.0€	0.0€	0.0€
		Situacioni (VII)	Situacioni (VIII)	Situacioni (IX)	Situacioni (X)	Situacioni (XI)	Situacioni (XII)
Vonesat Shkalla e cilësisë	--			Mesatar			
Rekomandime, masat për t’u ndërmarrë							
Vlerësimi i progresit në projekt							

*Foto gjatë ekzekutimit të punimeve

RAPORTI MBIKËQYRËS		SHIFRA 06					
Projekti :	Ndërtimi i kolektorit betonarme për largimin e ujit atmosferik dhe kanalizimi fekal në rrugën mbi lumin Mat, në lagjen “Kalabria”	Vlera e projektit: 1, 696,063.32€					
Investuesi :	Komuna e Prishtinës	Plani dinamik : 180 ditë					
Operatori :	GO “Jehona” SHPK, NN “Beni Construction” dhe NNP “Arhiko.ing”	nr.identifikues: 616 16 111 511					
Menaxheri i projektit :	Ibrahim Gërvalla idn ;	Projekti i vitit 2016					
Organi mbikëqyrës :	Fevzi Jetullahu; Afërdita Sopi						
Punimet e parapara dhe të realizuara me kontratë							
Vëllimi fizik	Punët e parapara	-Ndërtimi i kolektorit betonarme, në gjatësi prej 850 m; -Ndërtimi i kanalizimit fekal, në gjatësi prej 2x850 m.					
	Punimet në realizim-vërejtjet	-Punimet nuk kanë vazhduar për shkak të problemeve pronësore.					
Vëllimi financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacionet e paguara ne 2017	Situacioni shkurt	Situacioni mars	Situacioni	Situacioni	Situacioni
		209.256.70€					



RAPORTI MBIKËQYRËS		SHIFRA 07					
Projekti :	Ndërtimi i stadiumit të futbollit në Hajvali, faza II	Vlera e projektit: 414,828.79€					
Investuesi :	Kuvendi Komunal Prishtinë	Plani dinamik : 120 ditë					
Operatori :	SHPK "Vizion Capital Partners" dhe SHPK "Conex Group"	nr.identifikues: 616 16 088 521					
Menaxheri i projektit :	Ibrahim Gërvalla, idn.	Projekti i vitit 2016					
Organi mbikëqyrës	Zyhrije Pllana, Fevzi jetullahu, Behgjet Gashi						
Punimet e parapara dhe të realizuara me kontratë							
Vëllimi fizik	Punët e realizuara	-Punimet e vazhduara: përdhësia, kati 1, kati 2.					
	Punët në realizim e sipër	- Punimet janë duke vazhduar në vendosjen e konstrukacionit të mbulesës së tribunave.					
Vëllimi financiar	Situacionet (Pagesat e proceduar)	Situacionet e paguara 1-4 (2017)	Situacioni 5 (qershor)	Situacioni	Situacioni	Situacioni	Situacioni
		200,000.00€	50,000.00€				





RAPORTI MBIKËQYRËS		SHIFRA 08					
Projekti :	Ndërtimi i rrugës Prishtinë-Sinidoll-Bërnice e Epërme-Bardhosh	Vlera e projektit: 343,167.06€					
Investuesi :	Komuna e Prishtinës	Plani dinamik : 90 ditë					
Operatori :	NNP,,Bashkimi"	nr.identifikues: 616 16 120 521					
Menaxheri i projektit :	Zyhrije Pllana	Projekti i vitit 2017					
Organi mbikëqyrës:	Ibrahim Gërvalla, Behgjet Gashi						
Punimet e parapara dhe të realizuara me kontratë							
Vëllimi fizik	Punët e parapara	-Trajtimi dhe asfaltimi i rrugës; -Punimi i kanalizimit atmosferik; -Punimi i trotuarit.					
	Punët në realizim e sipër	-Punimet janë në fazën përfundimtare-vendosja e trotuareve (punimet janë të ndërprera për shkak të problemeve pronësore).					
Vëllimi financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacionet e paguara ne 2017	Situacioni shkurt	Situacioni prill	Situacioni	Situacioni	Situacioni
		308,000.00€					



RAPORTI MBIKËQYRËS		SHIFRA 09					
Projekti :	Ndërtimi i rrugës Riqard Holbruk (krahu 1 e 2)	Vlera e projektit:	470,047.05€				
Investuesi :	Komuna e Prishtinës	Plani Dinamik :	120 ditë				
Operatori :	SHPK "TOIFOR"	nr.identifikues:	616 17 047 511				
Menaxheri i projektit :	Zyhrije Pllana	Projekti i vitit	2017				
Organi mbikëqyrës	Ibrahim Gërvalla, Fevzi Jetullahu dhe Amire Krasniqi						
Punimet e parapara dhe të realizuara me kontratë							
Vëllimi fizik	Punët e parapara	-Trajtimi dhe asfaltimi i rrugës; -Punimi i kanalizimit fekal, atmosferik dhe kabllor; -Ndriçimi					
	Punët në realizim e sipër	-Punimet janë duke vazhduar, zgjerim dhe tamponizim të trasesë, si dhe rregullimin e trotuareve dhe stazave të biçiklistëve					
Vëllimi financiar	Situacionet (Pagesat e proceduar a)	Situacionet e paguara me 2017	Situacioni maj	Situacioni qershor	Situacioni	Situacioni	Situacioni
		50,000.00€	50,000.00€	50,000.00€			







RAPORTI MBIKËQYRËS		SHIFRA 12					
Projekti :	Ndërtimi i rrugës paralele me rrugën “B”	Vlera e projektit: 279,939.59€					
Investuesi :	Komuna e Prishtinës	Plani dinamik: 120 ditë					
Operatori :	NN “Beni Construction”	nr.identifikues: 616 15 216 521					
Menaxheri i projektit :	Ibrahim Gërvalla idn ;	Projekti i vitit 2015					
Organi mbikëqyrës	Fevzi jetullahu, Behgjet Gashi						
Punimet e parapara dhe të realizuara me kontratë							
Vëllimi fizik	Punët e realizuara	-Vendosja e pikave të trasesë së rrugës, gërmimi i dheut, stabilizimi me material guror, kanalizimi fekal, kanalizimi atmosferik.					
	Punët në realizim e sipër	-Punimet janë duke vazhduar në përgatitjen e rrugës për shtresën final, e filluar në pjesën e trasesë, që janë zgjidhur kontestet pronësore.					
Vëllimi financiar	Situacionet (Pagesat e proceduar)	Situacionet e paguara me 2017	Situacioni 2 (qershor)	Situacioni	Situacioni	Situacioni	Situacioni
		50,000.00€	50,000.00€				




RAPORTI MBIKËQYRËS		SHIFRA 13					
Projekti :	Ndërtimi i rrugëve në Makoc, lagja “Balaj” dhe Grshiticë e Epërme, lagjet “Musaj”, “Rexhaj” dhe “Obzovik”					Vlera e projektit: 207,000.00€	
Investuesi :	Komuna e Prishtinës					Plani dinamik : 150 ditë	
Operatori :	SHPK “Gerlica Company”					nr.identifikues: 616 17 093 521	
Menaxheri i projektit :	Ibrahim Gërvalla					Projekti i vitit 2017	
Organi mbikëqyrës	Behgjet Gashi, Azem Buzuku						
Punimet e parapara dhe të realizuara me kontratë							
Vëllimi fizik	Punët e parapara	-Trajtimi i rrugicave me kubze betoni.					
	Punët në realizim e sipër	-Punimet janë duke vazhduar në lagjen “Obzovik” dhe në Grashiticë.					
Vëllimi Financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni 1 (prill)	Situacioni 2 (maj)	Situacioni 3 (qershor)	Situacion i	Situacioni	Situacioni
		50,000.00€	50,000.00€	50,000.00€			




RAPORTI MBIKËQYRËS		SHIFRA 14				
Projekti :	Sanimi i gropave dhe deformimeve të shtresave të asfaltit në rrugët dhe trotuaret e Komunës së Prishtinës për vitin 2017	Vlera e projektit: 327,550.00€				
Investuesi :	Komuna e Prishtinës	Plani dinamik : 12 muaj				
Operatori :	SHPK "Toifor"	nr.identifikues: 616 17 117 521				
Menaxheri i projektit :	Ibrahim Gërvalla, idn.	Projekti i vitit 2017				
Organi mbikëqyrës	Azem Buzuku, Bexhet Gashi.					
Punimet e parapara dhe të realizuara me kontratë						
Vëllimi fizik	Punët e realizuara	-Sanimi i gropave me asfalt, -Sanimi i rrugëve me kubze, -Furnizimi dhe vendosja e kapakëve të pusetave dhe grilave.				
	Punët në realizim e sipër	-Sanimi i gropave me asfalt, -Sanimi i rrugëve me kubze, -Punimi i shtresave të asfaltit.				
Vëllimi financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacionet e paguara me (2017)	Situacionet (shkurt-prill)	Situacioni (maj)	Situacioni (qershor)	Situacioni (korrik)
		66.000.00€	73.000.00 €	60.000.00 €	60.000.00 €	40.000.00 €





 RAPORTI MBIKËQYRËS		SHIFRA 15				
Projekti :	Rregullimi i rrugeve "Reshat Maliqi", "27 Nentori" dhe te Trafoja, si dhe rregullimi i infrastrukturës në rrugët "Aziz Kelmendi", "Malush Kosova" dhe Elena Gjika".					Vlera e projektit: 341,901.86 €
Investuesi :	Komuna e Prishtinës					Plani dinamik : 150 ditë
Operatori :	"Kema Company" SHPK, adresa QMI - Lipjan					Nr. 616 17 095 521 dt. 24.10.2017
Menaxheri i projektit :	Irfete Zejneli					Projekti i vitit 2017
Organi mbikëqyrës :	Krenar Xhaferi dhe Azem Buzuku					
Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara						
Vëllimi fizik	Punët e realizuara	<ul style="list-style-type: none"> ● Në rrugën afër objektit "Beni - Dona" në Ulpianë , punimi i kanalizimit fekal, kanalizimit atmosferik dhe ndërtimi i rrugës; ● Punimi i rrugës "Reshat Maliqi". 				
	Punët në realizim	<ul style="list-style-type: none"> ● Punimi i krahut të rrugës "27 nëntori"; ● Ndërtimi i kanalizimit fekal dhe atmosferik në rrugën "Elena Gjika" 				
Vëllimi financiar Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni (I)	Situacioni (II)	Situacioni (III)	Situacioni (IV)	Situacioni (V)	Situacioni (VI)
	50,000.00€	00.00€	00.00€	00.00€	00.00€	00.00€
Vonesat Shkalla e cilësisë	Probleme pronësore, në shumicën e rrugëve kemi prona private, por për këtë gjë u kemi shkruar bashkësive lokale që të njoftojnë gjithë pronarët e këtyre parcelave nëse janë të pëlqimit me nënshkruar marrëveshjen, për të mos penguar gjatë realizimit të punimeve dhe mos me kërkuar kompensim më pas për këto parcela.					
Rekomandime masat për tu ndërmarrë	<ul style="list-style-type: none"> ☞ Është rekomanduar operatori ekonomik që cilësia e punimeve të jetë komfor kontratës dhe paramasës; ☞ Është rekomanduar operatori ekonomik që të rrisë dinamikën e punimeve. 					
Vlerësimi i progresit në projekt	☞ Punimet janë duke u zhvilluar me një dinamikë mjaft të dobët, përkundër rekomandimeve dhe vërejtjeve të ekipit mbikëqyrës.					

PRISHTINA		RAPORTI MBIKËQYRËS					SHIFRA 16	
Projekti :	Implementimi i projektit “Bllok pas blloku” në lagjen “Bregu i Diellit”					Vlera e projektit: 166,274.11€ Punët shtesë 10,340.00€		
Investuesi :	Komuna e Prishtinës					Plani dinamik : 90 ditë		
Grupi i Operatorëve:	NPN “Vision Projekt ”					Nr. 616 16 072 521 dt.19.08.2016		
Menaxheri i projektit :	Më herët: Dhurata Ramadani Tani: Irfete Zejneli					Projekti i vitit 2016		
Organi mbikëqyrës :	Më herët Enolida Berisha, tani Qazim Bajrami Amire Krasniqi Mehdi Hoxha							
Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara								
Vëllimi fizik	Punët e realizuara	● Rreth 80% e punimeve janë realizuar gjatë menaxhimit të Dhurata Ramadani.						
	Punët në realizim	● Gjatë kohës prej kur jam menaxhere e projektit thujse asgjë nuk është realizuar.						
Vëllimi financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni (I)	Situacioni (II)	Situacioni I punëve shtesë	Situacioni (IV)	Situacioni (V)	Situacioni (VI)	
		50,002.80€	50,000.02€	10,340.00€	00.00€	00.00€	00.00€	
Vonesat Shkalla e cilësisë	Vonesa sigurisht se do të ketë, për shkak të neglizhencës në punë nga operatori ekonomik .							
Rekomandime masat për tu ndërmarrë	<ul style="list-style-type: none"> ☞ Është rekomanduar ndërprerja e kontratës në Zyrën e prokurimit, për shkak të mos zhvillimit të punimeve nga operatori ekonomik, përkundër vërejtjeve të dhëna. 							
Vlerësimi i progresit në projekt	<ul style="list-style-type: none"> ☞ Përkundër vendimit nga Zyra e prokurimit për ndërprerje të kontratës, për shkak të paraqitjes së defekteve në cilësi , deri në evitimin e tyre nuk mund ta përmbyllim kontratën. 							

 RAPORTI MBIKËQYRËS		SHIFRA 17					
Projekti :	Ndërtimi i rrugës dhe trotuareve në fshatin Drenovc	Vlera e projektit: 367,972.12 €					
Investuesi :	Komuna e Prishtinës	Plani dinamik : 150 ditë					
Grupi i Operatorëve:	“Erdi-Group” SHPK dhe “EL-BAU” SHPK	Nr. 616 17 138 511 dt.22.02.2018					
Menaxheri i projektit :	Irfete Zejneli	Projekti i vitit 2018					
Organi mbikëqyrës :	Krenar Xhaferi dhe Bujar Rama						
Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara							
Vëllimi fizik	Punët e realizuara	<ul style="list-style-type: none"> ● Aksi te Xhafollët, kryerja e punimeve në rrugë; ● Aksi te Xhafollët, kryerja e punimeve në trotuar; ● Aksi A dhe aksi B, kryerja e punimeve në trotuar; ● Aksi 1, aksi 2, aksi 3, aksi 4 dhe aksi 5, kryerja e punimeve në rrugë; ● Aksi majtas, zgjerimi i rrugës; ● Aksi majtas, kryerja e punimeve në trotuar. 					
	Punët në realizim	<ul style="list-style-type: none"> ● Ndërtimi i kanalizimit atmosferik dhe zgjerimi i rrugës në aksin kryesor. 					
Vëllimi financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni (I)	Situacioni (II)	Situacioni (III)	Situacioni (IV)	Situacioni (V)	Situacioni (VI)
		50,000.00€	50,000.00€	50,000.00€	00.00€	00.00€	00.00€
Vonesat Shkalla e cilësisë	Vonesa sigurisht se do të ketë, për shkak të mangësive të shumta në projekt.						
Rekomandime, masat për t'u ndërmarrë	<ul style="list-style-type: none"> ☞ Është rekomanduar operatori ekonomik që cilësia e punimeve të jetë konform kontratës dhe paramasës. 						
Vlerësimi i progresit në projekt							

PRISHTINA		RAPORTI MBIKËQYRËS				SHIFRA 18	
Projekti :	Ndërtimi i kanalizimit fekal dhe atmosferik në rrugët "Fehmi Agani" dhe "Hajdar Dushi", si dhe ujësjellësi në rrugën "Fehmi Agani"				Vlera e projektit: 348.679,20 €		
Investuesi :	Komuna e Prishtinës				Plani dinamik : 60 ditë		
Operatori :	"NOTI BETON" SHPK				Nr i prokurimit: 6161794521 dt.12.12.2017		
Menaxheri i projektit :	Syzana Pllana				Projekti i vitit 2018		
Organi mbikëqyrës :	Aferdita Sopi, Behxhet Gashi						
Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara							
Vëllimi fizik	Punët e realizuara	Kontrollimi dhe evidentimi i instalimeve nëntokësore; Trasimi gjeodezik; Demolimi dhe pastrimi i terrenit; Gërmimi i kanalit me makineri; Gërmimi i kanalit me dorë; Planifikimi i fundit të kanalit; Furnizimi, transporti dhe vendosja e zhavorrit të imët (0-16) mm, (0-32), (0-63) mm; Mbulimi dhe planifikimi i kanalit me material guror (0-100)mm; Furnizimi, transporti dhe vendosja e gypave ø 630, 800mm; Furnizimi, transporti dhe vendosja e betonit; Furnizimi, transporti dhe vendosja e tubave për puseta, konuseve, shkalleve, kapakëve; Furnizimi transporti, shtrirja dhe ngjeshja e tamponit: t=15cm, (0-31, 5 mm, Mv>100Mn/m2) dhe shtresës së Bituzhavorit: BZH 22 me trashësi t=8cm; Furnizimi, transporti dhe punimi i asfaltbetonit nga materiali i njëtrajtshëm AB11, me trashësi t=4,0cm; Testimi i rrjetit të kanalizimit fekal dhe atmosferik; Furnizimi, transporti dhe vendosja e skajorëve standard 18/24, C-40/50, M100; Testimi dhe dezinfektimi i gypit të ujësjellësit.					
	Punët në realizim	Furnizimi transporti, shtrirja dhe ngjeshja e tamponit: t=15cm, (0-31, 5 mm, Mv>100Mn/m2) dhe shtresës së Bituzhavorit: BZH 22 me trashësi t=8cm; Furnizimi, transporti dhe punimi i asfaltbetonit nga materiali i njëtrajtshëm AB11 me trashësi t=4,0cm.					
Vëllimi financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni (I)	Situacioni (II)	Situacioni (III)	Situacioni (IV)	Situacioni (V)	Situacioni (VI)
		50,000.00€	50,000.00€	50,000.00€	75,000.00€	50,000.00€	0.0€
Vonesat Shkalla e cilësisë		--			Mesatar		
Rekomandime, masat për t'u ndërmarrë		<ul style="list-style-type: none"> ☛ Është urdhëruar operatori nga organi mbikëqyrës, që të rritë kapacitetin dinamik të punimeve, si dhe të bëjë sigurimin e vendpunishtes, të bëjë sigurimin e kanalit dhe t'i përmbahet projektit; ☛ Me kërkesë të Kryetarit dhe drejtorit të Drejtorisë, dhe me pëlqim të operatorit ekonomik, është zëvendësuar pozicioni i pllakave të betonit me dy shtresa asfalt, duke qëndruar brenda vlerës së kontratës. 					
Vlerësimi i progresit në projekt		☛ Kemi hasur në pengesa të shumta gjatë realizimit të projektit në rrugët "Fehmi Agani" dhe "Hajdar Dushi".					

*Foto gjatë ekzekutimit të punimeve



 RAPORTI MBIKËQYRËS		SHIFRA 19				
Projekti :	Ndërtimi i kanalizimeve fekale dhe atmosferike në territorin e komunës së Prishtinës	Vlera e projektit: 355,555.55 €				
Investuesi :	Komuna e Prishtinës	Plani dinamik : 90 ditë				
Operatori :	"NOTI BETON" SHPK	Nr i prokurimit: 61617100521 dt.30.11.2017				
Menaxheri i projektit :	Syzana Pllana	Projekti i vitit 2018				
Organi mbikëqyrës :	Aferdita Sopi, Behxhet Gashi					
Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara						
Vëllimi fizik	Punët e realizuara	Kontrollimi dhe evidentimi i instalimeve nëntokësore; Trasimi gjeodezik; Demolimi dhe pastrimi i terrenit; Gërmimi i kanalit me makineri; Gërmimi i kanalit me dorë; Planifikimi i fundit të kanalit; Mbushja dhe mbulimi i kanalit me material rrethor jo koherent; Furnizimi, transporti dhe vendosja e gypave ø 250mm; Furnizimi, transporti dhe vendosja e betonit; Furnizimi, transporti dhe vendosja e tubave për puseta, konuseve, shkallëve, kapakëve.				
	Punët në realizim	Gërmimi i kanalit me makineri; Gërmimi i kanalit me dorë; Planifikimi i fundit të kanalit; Mbushja dhe mbulimi i kanalit me material rrethor jo koherent; Furnizimi, transporti dhe vendosja e gypave ø 250,315,800mm.				
Vëllimi financiar Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni (I)	Situacioni (II)	Situacioni (III)	Situacioni (IV)	Situacioni (V)	Situacioni (VI)
	50.,000.00 €	50,000.00€	0.0€	0.0€	0.0€	0.0€
Vonesat Shkalla e cilësisë	--		Mesatar			
Rekomandime, masat për t'u ndërmarrë	<input checked="" type="checkbox"/> Është urdhëruar operatori nga organi mbikëqyrës, që të rritë kapacitetin dinamik të punimeve, si dhe të bëjë sigurimin e vendpunishtes, të bëjë sigurimin e kanalit, si dhe t'i përmbahet projektit.					
Vlerësimi i progresit në projekt	<input checked="" type="checkbox"/> Punimet janë duke u zhvilluar në bazë të planit dinamik					


*Foto gjatë ekzekutimit të punimeve




PRISHTINA		RAPORTI MBIKËQYRËS				SHIFRA 20
Projekti :	Ndërtimi i kanalizimit fekal tek "Rezonanca", ndërtimi i kanalizimit fekal, kanalizimit atmosferik, si dhe ujësjellësit në rrugët "Bedri Pejani" dhe "Andrea Gropa", ndërtimi i kanalizimit fekal dhe kanalizimit atmosferik në rrugët "Meto Bajraktari" dhe "Qajupi".				Vlera e projektit: 191,687.46 €	
Investuesi :	Komuna e Prishtinës				Plani dinamik : 90 ditë	
Operatori :	NNTPP "GASHI ING" SHPK				Nr i prokurimit: 616-17-4307-5-2-1 dt.09.11.2017	
Menaxheri i projektit :	Syzana Pllana				Projekti i vitit 2018	
Organi mbikëqyrës :	Aferdita Sopi, Azem Buzuku					
Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara						
Vëllimi fizik	Punët e realizuara	Kontrollimi dhe evidentimi i instalimeve nëntokësore; Trasimi gjeodezik; Demolimi dhe pastrimi i terrenit; Gërmimi i kanalit me makineri; Gërmimi i kanalit me dorë; Planifikimi i fundit të kanalit; Mbushja dhe mbulimi i kanalit me material rrethor jo koherent rrethor d 0-100mm; Furnizimi, transporti dhe vendosja e gypave ø 400 mm; Furnizimi, transporti dhe vendosja e betonit; Furnizimi, transporti dhe vendosja e tubave për puseta, konuseve, shkallëve, kapakëve; Furnizimi dhe asfaltimi i rrugëve; Kthimi i kalldërmit.				
	Punët në realizim	Gërmimi i kanalit me makineri; Gërmimi i kanalit me dorë; Planifikimi i fundit të kanalit; Mbushja dhe mbulimi i kanalit me material rrethor jo koherent; Furnizimi, transporti dhe vendosja e gypave ø 250-500-400mm.				
Vëllimi financiar Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni (I)	Situacioni (II)	Situacioni (III)	Situacioni (IV)	Situacioni (V)	Situacioni (VI)
	50,000€	50,000€	50,000€	0.0€	0.0€	0.0€
Vonesat Shkalla e cilësisë	--			Mesatar		
Rekomandime, masat për t'u ndërmarë	Për shkak të rrezikshmërisë nga shembja, projekti tek "Rezonanca" është ndërprerë, për t'u vazhduar në rrugët "Meto Bajraktari", "Qajupi", si dhe rr. "Bedri Pejani" dhe "Andrea Gropa". Te tek rruga "Qajupi" e kemi ndërprerë projektin, për shkak se kuota fundore e projektuar është 4.30 m, ndërsa gjendja faktike në terren është 5.30, si dhe shkarkimi me rënie të kundërt.					
Vlerësimi i progresit në projekt	Punimet janë duke u zhvilluar në bazë të planit dinamik.					

*Foto gjatë ekzekutimit të punimeve



 RAPORTI MBIKQYRËS		SHIFRA 21					
	<i>Ndërtimi i rrugëve në brendësi të fshatit Slivovë</i>	Vlera e projektit: 99,385.36 €					
Investuesi :	Komuna e Prishtinës	Plani dinamik :60 ditë					
Operatori :	<i>NTP "BASHKIMI" Koliq - Prishtinë</i>	616 17 146 521 dt.12.02.2018					
Menaxheri i projektit :	Qazim Bajrami nga DIKMK	Projekti i vitit : 2018					
Organi mbikëqyrës :	Bujar Rama, Ramadan Nebihi nga DIKMK						
Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara							
Vëllimi fizik	Punët e realizuara						
	Punët në realizim						
Vëllimi financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacion I	Situacion II	Situacion III	Situacion IV	Situacion V	Situacioni VI
Vonesat Shkalla e cilësisë							
Rekomandime, masat për t'u ndërmarrë		<p><i>Pas analizimit të projektit, kam vërejtur se rruga e projektuar kalon nëpër pronë private. Kam njoftuar B. Lokale që të kontaktojnë pronarët e parcelave dhe të deklarojnë me shkrim nëse janë të gatshëm që pa kompenzim të lirojnë pronat, në mënyrë që të përfundohen punimet sipas projektit. Poashtu, edhe kushtet atmosferike në këtë moment ndikojnë në fillimin e punimeve.</i></p> <p><i>Për këtë arsye nuk mund të parashikojmë dt.e fillimit të punimeve pa u zgjedhur problemet pronësore.</i></p>					
Vlerësimi i progresit në projekt							

PRISHTINA		SHIFRA					
		RAPORTI MBIKËQYRËS					
		22					
Projekti :	Ndërtimi i rrugëve në lagjet “Myrtaj”, “Bekaj”, “Bahtirovit” dhe “Nezirovit” në fshatin Busi.	Vlera e projektit: 347,880.30 €					
Investuesi :	Komuna e Prishtinës	Plani dinamik : 90 ditë					
Operatori :	KNPSH “PAPENGURG” “ADRIANI COMPANY” SHPK	616 17 4861 511 dt.22.02.2018					
Menaxheri i projektit :	Qazim Bajrami nga DIKMK	Projekti i vitit : 2017					
Organi mbikëqyrës :	Dukagjin Buçaj, Hazir Krasniqi nga DIKMK						
Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara							
Vëllimi fizik	Punët e realizuara	Piketimi I trasës së rrugës sipas projektit					
	Punët në realizim	Gërmimi i dheut, mbushja e trupit të rrugës me material guror, punimi i lëshesave tërthore dhe gjatësore-shënimi i trasës sipas projektit, demolimi i materialeve të ngurta, prerja e shkurreve, gërmimi i gjerë, mbushja, hapja e kanaleve për largimin e ujrave atmosferike, punimi i lëshesave gjatësore dhe tërthore, shtrirja e gjeotekstit, mbushja me tampon fr.0-63mm, mbushja me tampon fr.0-31. Më 13.09.2018, ka filluar asfaltimi. Pas asfaltimit të një segmenti prej 100m, një banor i lagjes ka penguar vazhdimin e asfaltimit. Jemi detyruar që t'i ndërpresim punimet në atë rrugë dhe t'i vazhdojmë në aksin 3, deri në zgjidhjen e kontestit.					
Vëllimi financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni I	Situacioni II	Situacioni III	Situacioni IV	Situacioni V	Situacioni VI
		50,000.00 11/06/18	50,000.00 12/07/18				
Vonesat Shkalla e cilësisë							
Rekomandime, masat për t'u ndërmarrë		<p><i>Pas analizimit të projektit, kam vërejtur se rruga e projektuar kalon nëpër pronë private. Kam njoftuar B. Lokale që të kontaktojnë pronarët e parcelave dhe të deklarojnë me shkrim nëse janë të gatshëm që pa kompenzim të lirojnë pronat, në mënyrë që të përfundohen punimet sipas projektit.</i></p> <p><i>Duke marrë për bazë këto probleme, nuk mund të parashikojmë dt. e fillimit të punimeve pa u zgjidhur problemet pronësore.</i></p>					
Vlerësimi i progresit në projekt		<p>Pas zgjidhjes së problemeve pronësore, punimet kanë filluar më 28.05.2018. Ka nevojë për dislokimin e shtyllave të tensionit të ulët. Kërkesa i është dorëzuar kompanisë KEDS, më 30.05.18 dhe ende nuk kemi marrë kurrfarë përgjigje.</p>					

Komuna e Prishtinës, Drejtoria e Investimeve Kapitale dhe Menaxhimit të Kontratave







Pengesa e shtyllave elektrike, në mes të rrugës, KEDS nuk po i zhvendosë







Asfaltimi I rrugës në Busi aksi 3 dt.13/09/2018







PRISHTINA		RAPORTI MBIKËQYRËS						SHIFRA 23
Projekti :	Rivitalizim i shkallëve dhe ndërtimi i mbikalimit, në lagjen “Arbëria”						Vlera e projektit: 463 262.41 €	
Investuesi :	Komuna e Prishtinës						Plani dinamik : 120 ditë	
Operatori :	“NBT - ING” SHPK						Nr.616-17-4891- 511 dt. 05.02.2018	
Menaxheri i projektit :	Merita Mihovci						Projekti i vitit 2018	
Organi mbikëqyrës :	Fevzi Jetullahu, Hazir Krasniqi, Jeton Zherka, Azem Buzuku							
Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara								
Vëllimi fizik	Punët e realizuara	Zyrtarisht kanë filluar punimet më 21.03.2018.						
	Punët në realizim	Punimet janë duke u zhvilluar në platformën panoramike dhe gërmimi i gjerë i dheut në zona të caktuara për nivelizim, sipas projektit dhe paramasës.						
Vëllimi financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni (I)	Situacioni (II)	Situacioni (III)	Situacioni (IV)	Situacioni (V)	Situacioni (VI)	
		50 000.0€	0.0€	0.0€	0.0€	0.0€	0.0€	
	Situacioni (VII)	Situacioni (VIII)	Situacioni (IX)	Situacioni (X)	Situacioni (XI)	Situacioni (XII)		
Vonesat Shkalla e cilësisë	--			Mesatar				
Rekomandime masat për tu ndërmarrë	<ul style="list-style-type: none"> ☛ Është rekomanduar operatori ekonomik që cilësia e punimeve të jetë komfor kontratës dhe paramasës; ☛ Duhet të rritet fuqia punëtore dhe mekanizimi i nevojshëm për të përfunduar projektin sipas dinamikës së paraparë. 							
Vlerësimi i progresit në projekt	☛ Punimet janë duke u zhvilluar vetëm me kapacitet të vogël.							

*Foto gjatë ekzekutimit të punimeve:



Foto 1.



Foto 2 & 3



RAPORTI MBIKËQYRËS		SHIFRA 24				
Projekti :	<i>Ndërtimi i rrugëve “Evlija Qelebiu”, “Luan Qelaj” dhe “Halil Alidemaj”</i>	Vlera e projektit: 122 234.10 €				
Investuesi :	Komuna e Prishtinës	Plani dinamik : 90 ditë				
Operatori :	<i>OE NNTPP “Gashi Ing” nga Suhareka.</i>	Nr.616 18 56 521				
Menaxheri i projektit : Organi mbikqyrës:	Halil Fejziu- idn. Fevzi Jtullahu, idh., Jeton Zherka, ida.	Projekti i vitit : 2018				
Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara						
Vëllimi izik	Punët e realizuara	- Shënimi i trasesë,mobilizimi i ndërmarjes; - Gërmimi i trupit të rrugëve në tërë gjatësinë e trasesë; - Mbushja e trupit të rrugës me material mbushës.				
	Punët në realizim	Punimi i kanalizimit në rrugën “Evlija Qelebiu”.				
Vëllimi financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni (I)	Situacioni (II)	Situacioni (III)	Situacioni (IV)	Situacioni (V)
		0.0€	0.0€	0.0€	0.0€	0.0€
Vonesat Shkalla e cilësisë		10 ditë			Mesatar	
Rekomandime, masat për t’u ndërmarrë		- Punimet duhet të kryhen sipas kontratës dhe projektit.				
Vlerësimi i progresit në projekt		- Projekti është duke u realizuar sipas planit dinamik.				



RAPORTI MBIKËQYRËS		SHIFRA 25					
Projekti :	Ndërtimi i infrastrukturës në disa rrugë të fshatrave Sinidoll, Bardhosh, Bërnice dhe lagjja “Kodra e Trimave” në Prishtinë.	Vlera e projektit: 283 470.50 €					
Investuesi :	Komuna e Prishtinës	Plani Dinamik : 90 ditë					
Operatori :	OE NNTPP “Gashi Ing” nga Suhareka.	Nr. 616 17 106 521.					
Menaxheri i projektit : Organi mbikqyrës:	Halil Fejziu, idn. Afërdita Sopi, Azem Buzuku.	Projekti i vitit : 2017					
Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara							
Vëllimi Fizik	Punët e realizuara	<ul style="list-style-type: none"> - Shënimi i trasesë, mobilizimi i ndërmarjes; - Gërmimi i trupit të disa rrugëve në tërë gjatësinë e trasesë; - Vazhdimi i tamponizimit të trupit të rrugëve me material sipas Kontratës; - Fillimi i kubzimit të rrugëve të mbetura. 					
	Punët në realizim	-Vazhdimi i kubzimit të rrugëve të mbetura.					
Vëllimi Financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacion i (I)	Situacion i (II)	Situacion i (III)	Situacion i (IV)	Situacion i (V)	Situacion i (VI)
		50 000.0€	50.000€	50 000.0€	50 000.0€	0.0€	0.0€
Vonesat Shkalla e cilësisë		10 Ditë			Mesatar		
Rekomandime ,masat për t’u ndërmarrë		<ul style="list-style-type: none"> - Mbushja e trupit të rrugëve me material mbushës; - Vendosja e kubzeve në rrugët anësore. 					
Vlerësimi i progresit në projekt		- Projekti është duke u realizuar sipas planit dinamik.					





RAPORTI MBIKËQYRËS		SHIFRA 26					
Projekti :	<i>Ndërtimi i disa rrugëve me kubze betoni në Veternik, Kalabri dhe Hajvali</i>	Vlera e projektit: 325 648.00 €					
Investuesi :	Komuna e Prishtinës	Plani dinamik 90 ditë					
Operatori :	<i>OE NNTPP "Gashi Ing" nga Suhareka.</i>	Nr.616 17 075 521.					
Menaxheri i projektit : Organi mbikëqyrës:	Halil Fejziu, idn. Afërdita Sopi, Azem Buzuku.	Projekti i vitit : 2017					
Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara							
Vëllimi fizik	Punët e realizuara	<ul style="list-style-type: none"> - Shënimi i trasesë, mobilizimi i ndërmarjes; - Gërmimi i trupit të disa rrugëve në tërë gjatësinë e trasesë; - Mbushja e trupit të rrugës me material mbushës; - Rrugët në Veternik dhe "Syri i Kaltër" janë përfunduar dhe "Pajtim Roci" e "Logreta". 					
	Punët në realizim	-Përfundimi I punimeve sipas kontratës.					
Vëllimi financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacion i (I)	Situacion i (II)	Situacion i (III)	Situacion i (IV)	Situacion i (V)	Situacion i (VI)
		50 000.0€	50 000.0€	50 000.0€	50 000.0€	50 000.0€	0.0€
Vonesat Shkalla e cilësisë		10 ditë			Mesatar		
Rekomandime, masat për t'u ndërmarrë		- Përfundimi i punimeve sipas kontratës.					
Vlerësimi i progresit në projekt		- Projekti është realizuar sipas planit dinamik.					





RAPORTI MBIKËQYRËS		SHIFRA 27					
Projekti :	Ndërtimi i urave në pjesën perëndimore të Unazës qendrore.	Vlera e projektit: 1 969 163.08 €					
Investuesi :	Komuna e Prishtinës	Plani Dinamik : 180 ditë					
Operatori :	OE "REXHA" SHPK, Prishtinë	Nr.616 15 236 511.					
Menaxheri i projektit : Organi mbikqyrës:	Halil Fejziu, idn. Afërdita Sopi; Imer Mavriqi, Behxhet Gashi.	Projekti i vitit : 2016					
Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara							
Vëllimi fizik	Punët e realizuara	-Ura e parë 74 m' është betonuar deri te shtylla e fundit.					
	Punët në realizim	-Është duke u armiruar pjesa e parë e urës 194m'; - Punimet nuk mundë të vazhdoen sipas dinamikës së kontratës, për shkak të mos dislokimit të hekurudhave dhe largimit të kabllave dhe trafos nga KEDS nga objekti i Doganës, për të cilën çështje është lajmëruar edhe drejtori dhe Kryetari i Komunës; -Dogana nuk është rrënuar krejtësisht ,sepse pengon trafo e KEDS dhe disa kablo nëntokësore dhe jemi duke pritur zgjidhje nga KEDS.					
Vëllimi financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacion i (I-VIII)	Situacion i (IX)	Situacion i (X)	Situacion i (XI)	Situacion i (XII)	Situacion i ()
		406 976.61€	50 000.0€	50 000.0€	0.0€	0.0€	0.0€
Vonesat Shkalla e cilësisë		10 Ditë			Mesatar		
Rekomandime masat për tu ndërmarë		- Armimi i urës 194m', të bëhet sipas projektit dhe po presim përgjigje nga projektuesi për muret. Prokurimi për rrënimet e paprapara, të cilat nuk kanë çmime; - Punimet kanë filluar me dinamikë të reduktuar në vendosjen e skeleve në urën 194m'; Dhe ura e shkurt 74m' disa pos. sipas mundësive të terrenit deri në largimin e trafos nga KEDS.					
Vlerësimi i progresit në projekt		-Dogana nuk është rrënuar krejtësisht, sepse pengon trafo e KEDS dhe disa kablo nëntokësore. Jemi duke pritur zgjidhje nga KEDS.					





1.4. Projektet infrastrukturore të vitit 2015-2017 të bartura në vitin 2018

Nr	Emri i projektit	Punëkryesi	Vlera e kontraktuar
1.	Ndërtimi i Bulevardit mbi "Kurriz"	"REXHA"	977,725.51€
2.	Ndërtimi i rrugës paralele me rrugën "B"	"Beni-Construction"	279,939.59€
3	Renovimi i stadiumit të qytetit të Prishtinës	Konzorciumi "Al-Trade" SHPK NP "Izolimi"	3,843,715.42€
4.	Ndërtimi i urave në pjesën perendimore të Unazes qendrore - Prishtine	"Rexha", "Arhiko", "Benita" Prishtinë	1,969,163.08€
5.	Ndërtimi i stadiumit të futbollit në Hajvali, faza II	"Vision Capital", "Conex Group" - Fushë Kosovë	414,828.79€
6.	Sanimi i gropave dhe deformimeve të shtresave të asfaltit në rrugët dhe trotualet në komunën e Prishtinës për vitin 2017	"TOIFOR", Prishtinë	327.550.00€
7	Ndërtimi i disa rrugicave me kubze betoni në Shkabaj, Kalabri dhe Prishtinë	SHPK "PRO & CO GROUP"	199,837.39€
8	Ndërtimi i rrugës "Riqard Holbruk" (krahu 1 e 2)	SHPK "TOIFOR"	470,047.05€
9	Implementimi i projektit "Blok pas bloku" në lagjen "Bregu i Diellit"	OE NPN "Vision Projekt", Gjilan	166,274,11€
10	Ndërtimi i kolektorit betonarme dhe kanalizimi fekal në rrugën mbi lumin Prishtina'	Grupi i OE "Noti Beton" SHPK "Ileaa-Gr", "H&B Consulting" me lider "Noti Beton"	2,192,854,6€
11	Ndërtimi i rrugëve dhe kanalizimeve fekale dhe atmosferike në krahun e djathtë dhe të majtë të rrugës "Bajram Bahtiri"	SHPK "Gerlica Company"	286.655.32 €
12	Ndërtimi i disa rrugëve me kubze betoni në Hajvali	"Rexha-Com"	359.351.97 €
13	Ndërtimi i disa rrugëve në fshatin Barilevë	NNP "SOPI"	324.457,38 €
14	Ndërtimi i kanalizimit Besi – Barilevë - Lebanë – lagjja "Kodra e Trimave"	"Kema Company" SHPK NNSH "Dimi Bau"	196.675,20€
15	Ndërtimi i disa rrugëve me kubze betoni në Prugovc	SHPK "Gerlica Company"	329,112.15€
16	Ndërtimi i disa rrugëve me kubze betoni në Veternik, Kalabri dhe Hajvali	NNTPP "Gashi Ing"	325, 648.00 €
17	Rregullimi i oborrit të objekteve me banim social në Hajvali	"Delta-Ing "	196, 579.09 €
18	Ndërtimi i rrugës Prishtinë-Sinidoll-Bërnice e Epërme-Bardhosh	NNP "Bashkimi"	260,584.00€
19	Ndërtimi i kolektorit betonarme për largimin e ujit atmosferik dhe kanalizimi fekal në rrugën mbi lumin Mat në lagjen "Kalabria"	G.O. "Jehona" SHPK, NN "Beni Construction" NNP "Arhiko.ing"	1, 696,063.32€
20	Ndërtimi i rrugës paralele me kanalin "Ibër Lepenc" në fshatin Bërnice e Poshtme	KNPSH "Papenpurg" "Adriani Company" SHPK	347,927.05 €
22	Ndërtimi i rrugës "Barilevë-Besi"	SHPK, "Benita company" SHPK "Arh Arhiko Ing", "Rexha"	965,582.96 €
23	Ndërtimi i rrugëve në Sofali	"Kema Kompany"	279,471.68€
24	Ndërtimi i rrugëve në Prapashticë, lagjja "Fanaj" dhe lagjja "Balaj"	NNTPP "Gashi Ing"	332,797,88€
25	Ndërtimi i rrugëve në Makoc, lagjja "Balaj" dhe Grashticë e Epërme, lagjet "Musa", "Rexhaj" dhe "Obzovik"	SHPK "Gerlica Company"	207,000.00€
26	Ndërtimi i infrastrukturës në disa rrugë të fshatrave Sinidoll, Bardhosh, Bernic dhe lagjja "Kodra e Trimave"	NNTPP "Gashi Ing"	283,470.50€
27	Ndërtimi i rrugëve në fshatin Hajkobillë, lagjja "Taliri"	NTP "Bashkimi"	70,153,05€
28	Ndërtimi i kanalizimeve fekale te "Rezonanca", ndërtimi i kanalizimit fekal, kanalizimit atmosferik, si dhe ujësjellësi në rrugët "Bedri Pejani" e "Andrea Gropa", ndërtimi i kanalizimit fekal dhe kanalizimit atmosferik në rrugën	NNTPP "Gashi Ing"	191,687,46€
29	Rregullimi rrugëve "Reshat Maliqi", "27 Nentori" dhe te Trafoja, si dhe rregullimi i infrastruktures në rrugët "Aziz Kelmendi", "Malush Kosova" dhe	SHPK "Kema Company"	341,901,86€
30	Ndërtimi i kanalizimeve fekale dhe atmosferike në territorin e komunës së Prishtinës.	"Noti-Beton"	355,555,55€
31	Ndërtimi i kanalizimit fekal dhe atmosferik në rrugën "Fehmi Agani" e "Hajdar Dushi", si dhe ndërtimi i ujësjellësit në rrugën "Fehmi Agani"	"Noti-Beton"	348,679,2€

1.5. Projektet infrastrukturore të vitit 2018

Nr	Emri i projektit	Punëkryesi	Vlera e kontraktuar
1.	"Rindërtimi , sanimi dhe zgjerimi i disa rrugëve sekondare në territorin e Komunës së Prishtinës"	NTP "BASHKIMI" NPSH "BAGERI"	247,853.52 €
2.	"Sanimi dhe asfaltimi i rrugës Fehmi Lladrovci"	"Beni-Construction"	59,480.30 €
3	Hartimi i projekteve të Infrastrukturës rrugore,	"3 D Projekt"	0.192 €, sipas specifikacionit.
4.	Sanimi i kanalizimeve fekale primare dhe sekondare, ne territorin e Komunes se Prishtines	"Famis"	38,015 €
5.	Ndertimi i kolektorit ne Hajvali, lagja Vitali"	KNTSH "Teuta-M" SHPK	463.262.41€
6.	"Ndërtimi i rrugëve dhe kanalizimit fekal te rruga e Ulqinit",	"Gashi Ing"	82,625.13 €
7.	Ndërtimi i rrugëve ne brendësi te Fshatit Slivovë,	"Bashkimi"	99,385.36 €
8	Rivetalizimi I shkalleve ne lagjen Arbëria"	"NBT-ING" SHPK	463.262.41€
9	Ndërtimi i rrugëve në lagjen Myrtaj, Bekaj, Bahtirovit dhe Nezirovit në fshatin Busi	"Papenburgji"	347,880.30 €
10	Ndërtimi i rrugës dhe trotuareve në fshatin Drenovc LOT 2	"Erdi Group" SHPK	
11	Ndertimi i disa rrugeve ne fshatin Trude	"Pro & Co group"	375,501.30 €
12	Ndërtimi i rrugës Rimanishtë - Siqevë	"Nëntë Vëllezërit" SHPK	167,748.21 €



Komuna e Prishtinës
RAPORT MUJOR

Drejtoria	Drejtoria e Investimeve Kapitale dhe Menaxhimit të Kontratave
Sektori	Menaxhimi i kontratave për ndërtim të lartë
Periudha raportuese	Shtator 2018
Emri dhe mbiemri i raportuesit	Ferit Fazliu, shef i Sektorit

• **PËRMBLEDHJE**

Ky sektor në bazë të detyrave programore, kryesisht është marrë me përpunimin e lëndëve me problematikë të ndërtimit, hartimin e detyrave projektuese, mbikëqyrjen e projekteve, mbikëqyrjen e objekteve, hapjen dhe vlerësimin e tenderëve, pjesëmarrje në komisionet e caktuara nga Kryetari i Komunës dhe drejtori i drejtorisë për lëmin e ndërtimit dhe veprimtari të tjera që kanë të bëjnë me këtë sektor.

✓ **AKTIVITETET E PLANIFIKUARA PËR VITIN 2018**

Për vitin 2018, janë planifikuar këto aktivitete të sektorit për menaxhimin e ndërtimit të lartë, e që janë dhe pjesë e aktiviteteve të drejtorisë:

- Kryerja e lëndëve në bazë të kërkesave të palëve në afat;
- Pjesëmarrje në hapjen dhe vlerësimin e tenderëve;
- Mbikëqyrja e kontratave të ndërtimit të lartë të projekteve që investon Komuna ose investuesve tjerë për nevoja të Komunës;
- Përgatitja e raportit mujor;
- Këshillimi i Drejtorëve dhe sektorëve tjerë për çështjet e ndërtimit;
- Aktivitete të paplanifikuara, me kërkesë të organeve të Komunës.

- **AKTIVITETET E REALIZUARA**

Gjatë këtij muaji janë ekzekutuar këto aktivitete:

- Zgjedhja e lëndëve sipas kërkesave të palëve:
 - të pranuar gjatë këtij muaji - 3 lëndë,
 - të zgjidhura - 3 lëndë;
- Vlerësim të kontratave - 4;
- Mbikëqyrje e kontratave të investimeve të Komuna e Prishtinës - 18, nga këto 3 të pa filluara;
- Nga këto:
 - 3 projekte janë të ndërprera, që të tri projektet nuk kanë filluar fare, për shkak të çështjeve pronësore,
 - 15 kontrata - projekte në vazhdim.

Gjithsej vlera e kontratave është : **6,843,848.54 €**

MJETE FINANCIARE TË PAGUARA DHE MBETJA PËR PAGESË

Të paguara : 3,402,342.85 €

Mbetje për pagesë: 3,441,505.69 €

Tri kontrata të kontraktuara në vitin 2015 dhe të pafilluara, kapin vlerën prej :
2,852,405.28 €

Vlera reale per pagesë:

3,441,505.69 € - 2,852,405.28 € = **589,100.41 €**

Me poshtë japim detalet për secilën aktivitet dhe kontratë - projekt.

KONTRATAT KORNIZË

1. Rregullimi i oborreve dhe terreneve sportive - kontratë kornizë 3 vjeçare	
Janë realizuar punime në : Çerdhen "Zogjtë ", Sofali Çerdhen "Kodra e Trimave"	
Vlera e projektit:	511,933.50€ për tri vite
Nr. i kontratës dhe data	616 16 096 511, dt. 04.08.2016
Operatori ekonomik:	"NBT-ING" dhe NPN "Alfa-Ing" SHPK, Suharekë
Të paguara	532,428.23 €
Mbarëvajtja e punimeve:	
FOTOT E EKZEKUTIMIT TË PUNIMEVE	
	



2. Rikonstruimi dhe mirëmbajtja e kulmeve të shkollave- kontratë 3-vjeqare	
Janë realizuar punime në : SHMU "PAVARËSIA"	
Vlera e projektit:	233,454.00€ për tri vjet
Nr i kontratës dhe data.	616 16 052 521, dt. 06.07.2016
Operatori ekonomik:	"OLTI TRASING", Prishtinë
Të paguara	142,875.43 €
Mbarëvajtja e punimeve:	Aktivitete të shtuara në dy vendpulishte
FOTOT E EKZEKUTIMIT TË PUNIMEVE - SHMU "PAVARËSIA (shtimi i hapësirave të reja - 5 klasë)	














3. "Mirëmbajtja e elektrikës në shkollë", kontratë kornizë 3-vjeçare

Gjatë këtij muaji është intervenuar në këto institucione:

1. Shkolla fillore "Hasan Prishtina",
2. Shkolla fillore "Naim Frashëri",
3. IP "Gëzimi Ynë".







Nr. i kontratës dhe data:	nr. 616 16 099 211, dt. 02.09.2016.
Vlera e projektit:	63,228.30€ për tri vjet (21,076.10 € për një vit)
Operatori ekonomik:	"Light and More" "Monting"
Të paguara deri më tani:	41,848.05 €


Fotot e ekzekutimit të punimeve



4. Renovime, përmirësime të infrastrukturës së objekteve shëndetësore	
Gjatë këtij muaji është intervenuar në këto institucione:	
<ul style="list-style-type: none"> • QMF V. 	
Vlera e projektit:	264,043.60 €
Nr. i kontratës dhe data.	616 16 177 521, dt. 21.04.2017
Të paguara deri më tani:	290,032.25 € 10% mbi kontratë
Operatori ekonomik:	NTP "Ulpiana" dhe "Mati" SHPK
Fotot e ekzekutimit të punimeve	
Në QMF -VI dhe ambulancën Dabishec	
	
	
Kontrata është përfunduar, ka mbetur vetëm përmbyllja dhe përmirësimi i disa vërejtjeve në terren. Është përgatitur dokumentacioni për kontratë të re.	

5. Mirëmbajtja e ngrohjeve qendrore ne shkollat dhe institucionet tjera komunale	
Gjatë këtij muaji është intervenuar në këto institucione:	
<ul style="list-style-type: none"> • Është intervenuar në ndërrimin e radiatorëve te çerdhja "Xixëllonjat" 	
Vlera e projektit:	100.000,0€
Nr. i kontratës dhe data.	616 17 128 221, dt. 15.11.2017

Operatori ekonomik	“Raketa” SHPK
Të paguara deri më tani	96,849.25 €
Plani dinamik	1 vit
Foto nga terreni:	
Është intervenuar në ndërrimin e radiatorëve te çerdhja “Xixëllonjat”	
<p>Bibloteka “Hyvzi Sulejmani”</p> 	
<p>SHML “ Sami Frashëri” - Prishtinë</p> 	
<p>Komuna e Re</p> 	

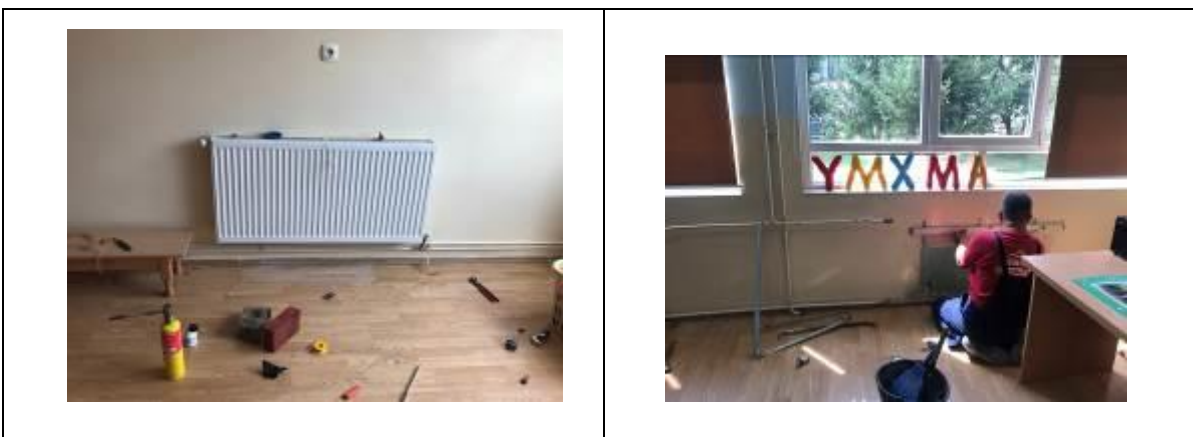

6. Rikonstruktimi, gëlqerosja, mirëmbajtja e nyjave sanitare dhe rikonstruktimi i dyshemeve ne institucinet arsimore - LOT 1 - kontratë kornizë njëvjeçare

Janë realizuar punime në :

Gëlqerosja dhe sanimi i dëmtimeve në:

- IP "FATOSAT",
- IP "GEZIMI YNE",
- IP "ARDHMERIA",
- IP "XIXELLONJA",
- IP "BUZEQESHJA",
- SHMU "ALI KELMENDI",
- SHMU "NAIM FRASHERI",
- SHMU "GJERGJ FISHTA",
- SHMU "TEUTA",
- SHMU "PJETER BOGDANI",
- SHML "DR. ALI SOKOLI",
- SHML "HOXHË KADRI PRISHTINA".

Vlera e projektit:	59,072.50€ për nje vite
Nr. i kontratës dhe data.	616 16 022 521, dt. 20.07.2018
Operatori ekonomik:	"ZHVILLIMI" - Podujeve
Të paguara	41,416.29 €
Mbarëvajtja e punimeve:	Aktivitete të shtuara ne shume vend punishte
FOTOT E EKZEKUTIMIT TË PUNIMEVE	





7. Rikonstruktimi, gëlqerosja, mirëmbajtja e nyjave sanitare dhe rikonstruktimi i dyshemeve në institucionet arsimore, LOT 2 - kontratë 1-vjeçare

Janë realizuar punime në :

- SHMU (Lagjja „ARBERIA“),
- SHMU “ISMAIL QEMAJLI”,
- IP “GEZIMI YNE”,
- IP “XIXELLONJA”,
- IP “BUZËQESHJA”.

Vlera e projektit:	48,000.00€ për nje vite
Nr i kontratës dhe data.	616 16 022 521 dt. 20.07.2018
Operatori ekonomik:	“LINDI” - Istog
Te paguara	18,111.89 €
Mbarëvajtja e punimeve:	Aktivitete të shtuara në shumë vendpunishte

FOTOT E EKZEKUTIMIT TË PUNIMEVE





8. Rikonstruktimi, gëlqerosja, mirëmbajtja e nyjave sanitare dhe rikonstruktimi i dyshemeve në institucinet arsimore-LOT 3, kontratë kornizë 1-vjeçare.

Janë realizuar punime në :

- IP "FATOSAT",
- IP "XIXËLLONJAT",
- IP "GËZIMI YNË",
- IP "LULEVERA"
- SHML "DR. ALI SOKOLI",
- SHMU "NAIM FRASHERI",
- SHMU "ALI KELMENDI",
- SHMU "NEXHMI MUSTAFA"
- SHMU "BARDHOSH"
- SHMU "XHEMAJL MUSTAFA".

Vlera e projektit:

69,659.90€ për një vit

Nr. i kontratës dhe data.

616 16 022 521, dt. 20.07.2018

Operatori ekonomik:

"EURO CONSTRUKSION"
Rahovec

Të paguara

0.00 €

Mbarëvajtja e punimeve:


Aktivitete të shtuara në shumë
vendpunishte

FOTOT E EKZEKUTIMIT TË PUNIMEVE









KONTRATAT QE VAZHDOJNE NGA VITET PARAPRAKE DHE TË KËTIJ VITI

9. Ndërtimi i objektit të IP "Kodra e Trimave"	
Vlera e projektit:	737,832.96 €
Nr. i kontratës dhe data.	616 15 123 521 dt 16 09 2015
Të pagura deri më tani	587,832.00 €
<i>Punimet kanë përfunduar, është në përmbyllje të kontratës - pjesa financiare.</i>	
	

10. Ndërtimi i shkollës fillore në lagjen „Arbëria”, faza II'	
Vlera e projektit:	737832.96 €
Të paguara deri më tani:	650.000,00 €
Operatori ekonomik:	“Rexha” SHPK
Barten për vitin 2018	87,832.96 €
<p>Punimet kanë përfunduar në bazë të kontratës, kontrata është duke u përmbyllur.</p> <p>Me kontratat tjera është duke u punuar rrethoja e shkollës dhe dyshemeja e sallës.</p>	



11. Vendosja e rrjetave në dritare të çerdheve për mbrojtjen nga insektet dhe disa renovime të objekteve të institucioneve parashkollore.	
Vlera e projektit:	34.999.00€
Nr. i kontratës dhe data.	616-17 -056-5-2-1, dt. 27.09.2017
Vlera e paguar deri më tani	20,000.00 €
Plani dinamik	90 ditë
Operatori ekonomik	" BEREQETI - ING "
<i>Pastrimi i mbeturinave në kulmin e gjimnazit "Sami Frasheri"</i>	
Lidhja e IP Kodra e Trimave me rrjetin e ujit	
Foto gjatë ekzekutimit të punimeve	
	
	

12. Riparimi i bashkësive lokale, zona urbane (Bardhosh, Mramor, Koliq)	
Vlera e projektit:	92.846,76 €
Nr i kontratës dhe data.	616 – 17-4525-5-2-1, dt.12.12.2017
Investuesi	Komuna e Prishtinës
Plani dinamik	90 dite
Operatori ekonomik	Grupi i operatorëve "ACON" SHPK dhe NPN "Alfa-Ing", SHPK
Të paguara deri më tani:	
Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara	
Vlerësimi i progresit në projekt	Punimet kanë përfunduar, është duke u punuar në përmbylljen financiare të kontratës
Foto gjatë ekzekutimit të punimeve	
	

13. <i>Renovimi i zyrave në objektin e vjetër të Komunës</i>	
Punimet e realizuara deri më tani me këtë kontratë: Nuk ka pas aktivitet gjate këtij muaji	
Vlera e projektit:	16,156.88 €
Nr i kontratës dhe data.	616-18-1922-5-2-1, dt. 20.07.2018
Operatori ekonomik	N.N."ZHVILLIMI"
Të paguara deri më tani:	
Janë në pritje të lirimit të hapësirës	

14. <i>Renovimi i objekteve të trashëgimisë kulturore</i>		
Vlera e projektit:	51,708.22€	
Nr. i kontratës dhe data.	616 18 066 521	
Investuesi	Komuna e Prishtinës	
Plani dinamik	120 ditë	
Operatori ekonomik	" Albi Company" SHPK	
Menaxheri i projektit	Nazmije Tora	
Organi mbikëqyrës :	Hyrishahe Morina, Lindita Hajdari, Avni Manaj dhe Valbona Saliuka	
Vëllimi fizik	Punët e realizuara	
Vëllimi fizik	Punët në realizim	Pastrimi në mbrendësi të objektit "Shkolla e parë shqipe"
Vëllimi financiar	Situacionet (Pagesa e procedurara)	Nuk kemi bërë asnjë page
		Pagesa e parë dhe e fundit
Fotot e ekzekutimit të punimeve të "Shkolla e parë shqipe"		





15. Ndërtimi i laboratorit "28 Nëntori" Prishtinë, faza e dytë		
Vlera e Projektit:	37,908.70€	
Nr. i kontratës dhe data.	616 18 074 521	
Investuesi	Komuna e Prishtinës	
Plani dinamik	60 ditë	
Operatori ekonomik	" Tribune" SHPK	
Të paguara:		
Vëllimi fizik	Punët e realizuara	
Vëllimi fizik	Punët në realizim	Mveshja e objektit me stiropor
Vëllimi financiar	Situacionet (Pagesa e proceduara)	Nuk kemi bërë asnjë pagesë
		Pagesa e parë dhe e fundit

Fotot nga terreni



PROJEKTET E NDËRPRERA DHE TË PAFILLUARA

16. *Nderti i shkollës fillore në lagjen „Mati 1”, vlera e projektit është 1,458,452.95€, nr. id. 61615061511, dt. 23.07.2015, punimet nuk kanë filluar, është në procedurë gjyqësore për çështje pronësore;*
17. *Ndërtimi i Sallës së edukatës fiziketë shkollës “Shtjefën Gjeqovi”, vlera e projektit është : 238,564.24€, nr. id. 616 15 156 521, dt. 22.10.2015, punimet janë ndërprerë për shkak të çështjeve pronësore;*
18. *Ndërtimi i shkollës në lagjen “Kalabria”, vlera e projektit është 1,458,452.95 €, nr. id. 61615135511, dt. 30.10.2015, punimet nuk kanë fillua për shkak të çështjeve pronësore.*

✓ KËRKESAT E SEKTORIT

Kërkesa shumë të nevojshme:

- Sigurimi i pajisjeve për sigurinë e stafit në punishte (helmata, këpucë, syze etj.);
- Plotësim të stafit me i inxhinierë të elektrosë dhe të makinerisë – termodinamikë;
- Trajnime të stafit për menaxhim të projekteve-kontratave;
- Pjesëmarrje në panairët e ndërtimit, me qëllim të njoftimit me materialet e reja të ndërtimit;
- Server për komplet Drejtorinë, min. 10 Tera bajt;
- Sigurimi i pajisjeve mobile:
 - a. për matjen e lagështisë së betonit,
 - b. lagështisë së drurit,
 - c. fortësisë së betonit ,
 - d. kalueshmërinë e nxehtësisë-temperaturës,
 - e. kamerë termike,
 - f. matjen e glykolit,
 - g. matjen e temperaturës së ujit dhe
 - h. 5 metra laserike, me gjatësi matëse deri 50 m.

Drejtori :
Gëzim Mehmeti
